

Installation av grundvattenrör

Projekt

Kv Språkmästaren

Installationsdatum

2024-08-21

Undersökningspunkt

GG2401

Fältingenjör

Jonathan

Borrvagn

GM85H


Förlängningsrör

Längd	Diameter	Material
2,0 m	1,0 tum	Stål


Filter

Längd	Diameter	Material
0,5 m	1,0 tum	Stål

Markyta, nivå	+36,01
Höjd över markyta (h)	0,40 m
Total rörlängd (m)	4,5 m
Filterlängd (f)	0,5 m
Nivå ök rör	+36,41
Spetsnivå	+31,514

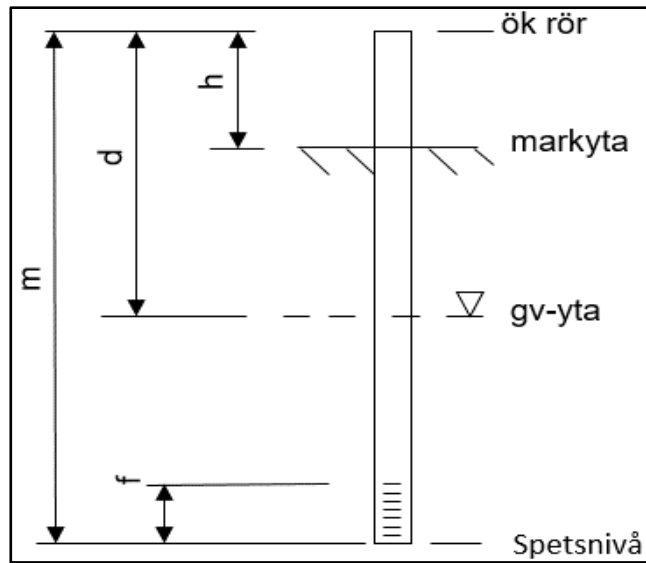

Datum	Djup u ök rör	Nivå
2024-08-21	3,15 m	+33,264
2024-09-20	2,45 m	+33,964
2024-10-22	2,20 m	+34,214

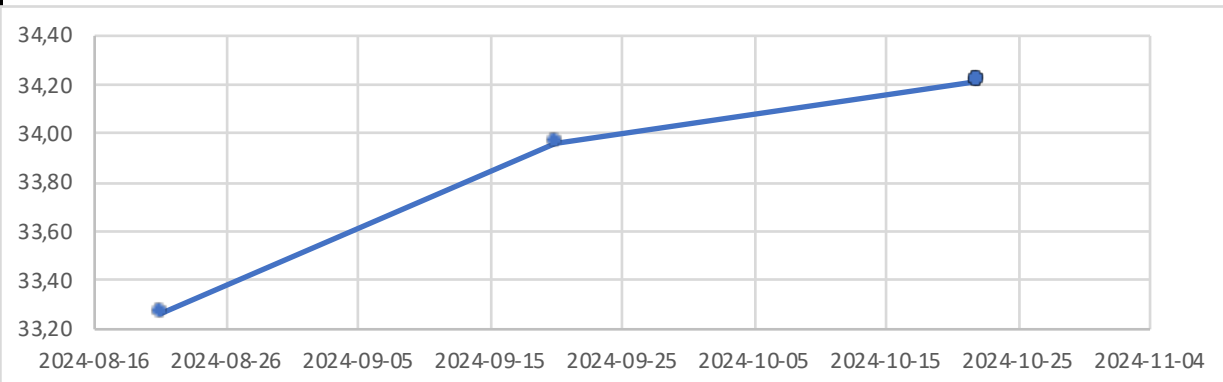

Installation av grundvattenrör

Projekt
Kv Språkmästaren

Installationsdatum
2024-08-21

Undersökningspunkt
GG2402

Fältingenjör
Jonathan

Borrvagn
GM85H


Förlängningsrör

Längd	2,0 m	Diameter	1,0 tum	Material	Stål
-------	-------	----------	---------	----------	------


Filter

Längd	0,5 m	Diameter	1,0 tum	Material	Stål
-------	-------	----------	---------	----------	------

Markyta, nivå	+36,07
Höjd över markyta (h)	0,60 m
Total rörlängd (m)	2,5 m
Filterlängd (f)	0,5 m
Nivå ök rör	+36,67
Spetsnivå	+33,572

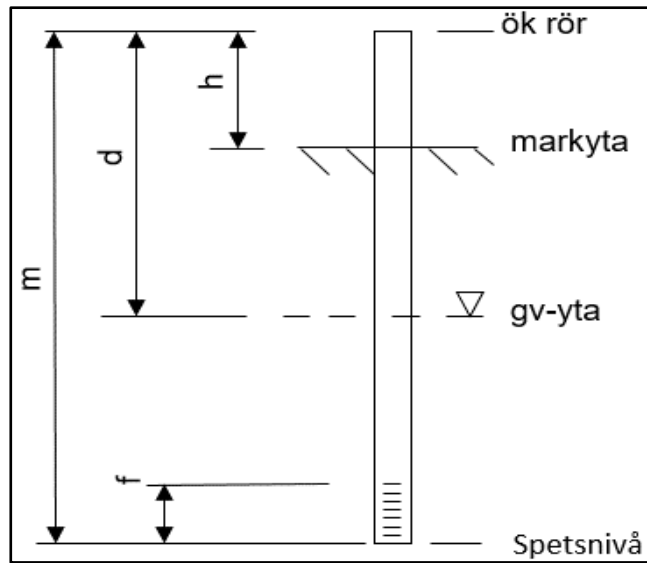

Datum	Djup u ök rör	Nivå
2024-08-21	inget vatten	
2024-09-20	inget vatten	#####
2024-10-22	inget vatten	#####

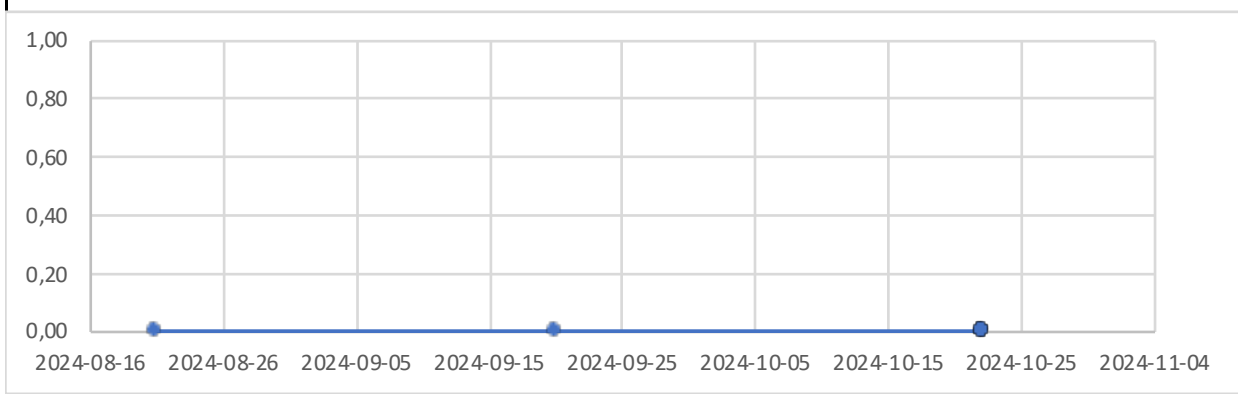

Installation av grundvattenrör

Projekt

Kv Språkmästaren

Installationsdatum

2024-08-21

Undersökningspunkt

GG2403

Fältingenjör

Jonathan

Borrvagn

GM85H


Förlängningsrör

Längd	Diameter	Material
2,0 m	1,0 tum	Stål


Filter

Längd	Diameter	Material
0,5 m	1,0 tum	Stål

Markyta, nivå	+34,89
Höjd över markyta (h)	0,80 m
Total rörlängd (m)	6,5 m
Filterlängd (f)	0,5 m
Nivå ök rör	+35,69
Spetsnivå	+28,389

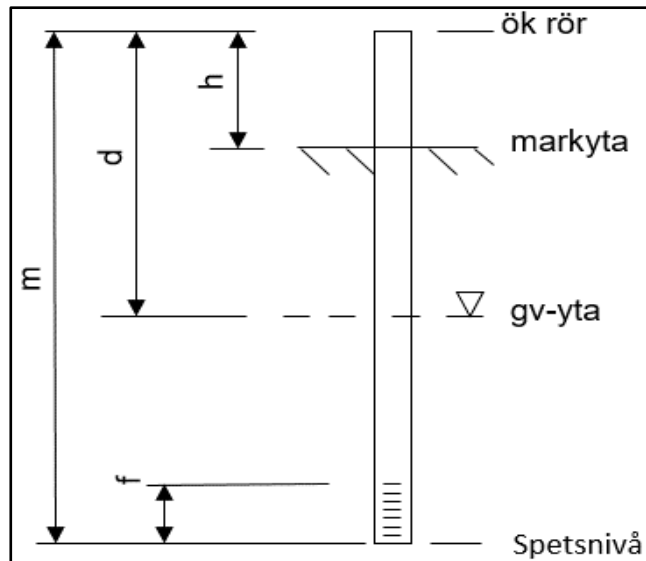

Datum	Djup u ök rör	Nivå
2024-08-21	inget vatten	
2024-09-20	2,60 m	+33,089
2024-10-22	2,15 m	+33,539

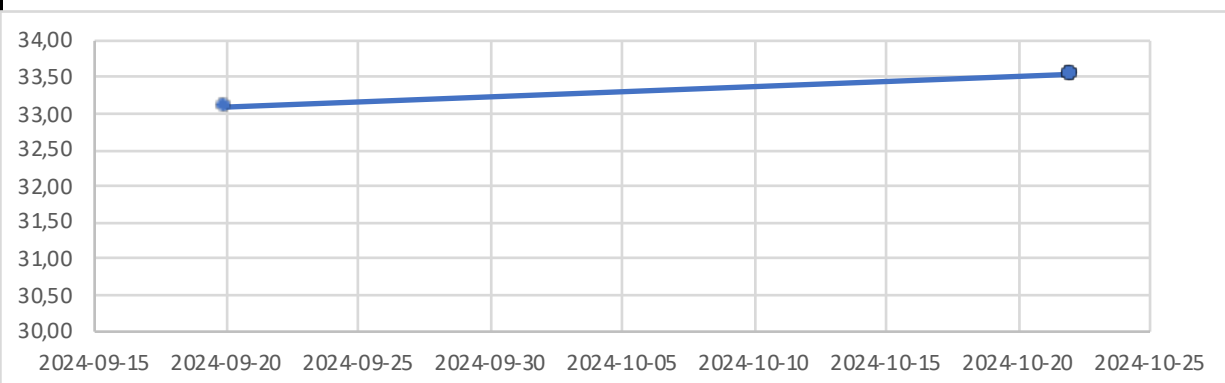

Installation av grundvattenrör

Projekt

Kv Språkmästaren

Installationsdatum

2023-06-28

Undersökningspunkt

GG2407

Fältingenjör

Jonathan

Borrvagn

GM85H


Förlängningsrör

Längd	Diameter	Material
2,0 m	1,0 tum	Stål

Filter

Längd	Diameter	Material
0,5 m	1,0 tum	

Markyta, nivå	+34,97
Höjd över markyta (h)	1,40 m
Total rörlängd (m)	8,5 m
Filterlängd (f)	0,5 m
Nivå ök rör	+36,37
Spetsnivå	+26,467

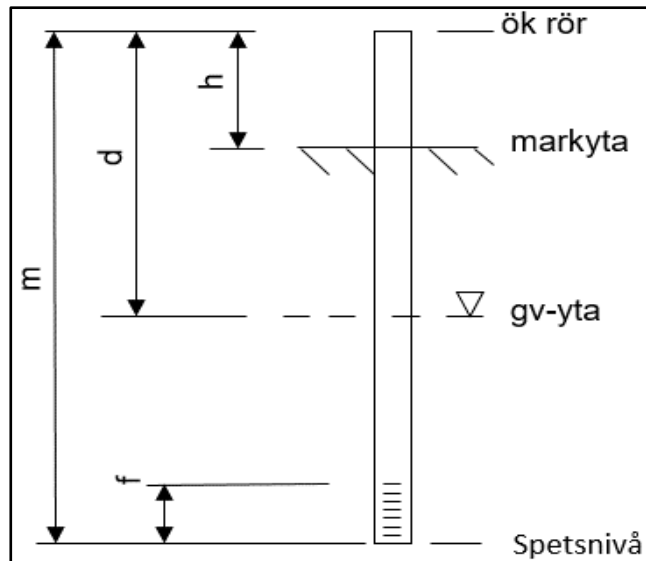

Datum	Djup u ök rör	Nivå
2023-06-20	3,30 m	+33,067
2024-08-21	3,20 m	+33,167
2024-10-22	2,80 m	+33,567

