

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden

Datum:
2021-10-25

Diarienummer:
UBN-2021-06034

Handläggare:
Anja Korpi Kardell
Lars Sundén

LFP UBN 2022: Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2022-2026 med utblick till 2031

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2022-2026 med utblick till 2031 utgör nämndens behov av lokaler,
2. **att** överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning av angivna lokalåtgärder,
3. **att** uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen,
4. **att** uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra lokalåtgärder enligt planen, *samt*
5. **att** ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.

Ärendet

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Lokalförsörjningsplanen utgår från verksamhetens behov av pedagogiska lokaler. Behovet beräknas utifrån nuvarande behov och kommunens befolkningsprognos - därefter sker analys och justering utifrån kända förändringar.

Planen föreslår åtgärder av två slag:

- Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt verksamhetsförändringar kopplade till detta.

- Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av direkta åtgärder

Planen redovisar ett ökat behov av lokaler för samtliga skolformer, dock i en långsammare ökningstakt jämfört med förra årets plan. Sammanlagt föreslås 19 åtgärder för att möta det förändrade behovet men också anpassa det till var i kommunen behovet beräknas finnas samt till befintliga lokalers status.

Beredning

Planen innebär en uppdatering av Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2021-2025 med utblick mot 2031. Framtagande sker förvaltningsövergripande i samarbete mellan berörda förvaltningar. Arbetet leds av en gemensam styrgrupp med direktörer från berörda förvaltningar, kontor och kommunala bolag. Motsvarande arbete sker för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. Arbetet är kopplad till kommunens mål och budgetprocess och planen revideras därför årligen.

Föredragning

I planen fastställs verksamhetens behov av pedagogiska lokaler. Beräkning av behovet bygger på kommunens befolkningsprognos samt antaganden utifrån planerad bostadsbyggnation. Vissa osäkerhetsfaktorer finns, både i befolkningsprognosen och gällande utbyggnadstakten i nya bostadsområden.

I planen redovisas behovet uppdelat utifrån följande verksamhetsformer:

- Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Särskola (grundsärskola och gymnasiesärskola)

Det prognosticerade behovet av platser fram till 2031 fortsätter öka i såväl förskola, grundskola som gymnasium, men långsammare än i förra årets prognos. Tydligast syns inbromsningen inom förskola där behovsökningen är svag de närmaste fem åren. I grundsärskolan ser behovet däremot ut att öka snabbare än i tidigare prognos.

Behovet redovisas på sidan 8 i planen.

Åtgärder och utredningar

I lokalförsörjningsplanerna föreslås åtgärder för att möta behov. I den här planen föreslås 19 nya åtgärder, inklusive åtgärder i befintliga lokaler som antingen leder till en kapacitetsändring eller kräver evakueringslösning. Åtgärderna i planen innefattar bland annat beslut om en ny förskola och nedläggning av två förskolor. Vidare föreslås att Lundellska skolan flyttas till Polacksbacken och att Lundellska skolans nuvarande lokaler ställs om till grundskola. Dessutom föreslås en ny enhet för särskolan.

Åtgärderna redovisas på sidan 19.

Vidare föreslås fortsatt arbete i form av utredningar som redovisas på sidan 24. Resultatet av dessa redovisas vid revidering av lokalförsörjningsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna ryms inom Mål och budget, förutom utökad ventilation av Ärentunaskolan och evakuering av Kvarngårdesskolan under vårterminen 2022.

För utbildningsnämnden bedöms åtgärderna i planen leda till en hyresökning på 473 miljoner kronor under perioden 2022-2031. Investeringar i fastigheter bedöms till 6 210 miljoner kronor i kommunkoncernen. Den verksamhetsbundna investeringen för utbildningsnämnden bedöms till 621 miljoner kronor. Till detta kommer drift för verksamheten.

Pågående utredningar kan leda till vidare investeringar och ökad hyra, vilket lyfts vid revidering av lokalförsörjningsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021
- Bilaga, Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2022-2026 med utblick mot 2031

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

LFP UBN 2022

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2022–2026 med utblick till 2031

Beslutad i utbildningsnämnden 2021-XX-XX

Godkänd i kommunstyrelsen 2021-XX-XX



Innehåll

Sammanfattning	3
Sammanfattat behov	3
Sammanfattade åtgärder	3
Sammanfattning ekonomi	4
Inledning	5
Planens innehåll.....	5
Styrning och uppdrag.....	6
Arbetets organisation.....	6
Lagbestämmelser och krav	6
Behov- och kapacitetsanalys.....	8
Befolkningsprognos	8
Behov och kapacitet.....	9
Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)	9
Grundskola.....	12
Gymnasieskola	13
Särskola	15
Lokalresurser.....	17
Utblick	18
Stads- och landsbygdsutveckling	18
Åtgärder.....	19
Nya åtgärder	19
Tidigare beslutade åtgärder	20
Utredningar	24
Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd.....	26
Total kapacitetsutveckling	27
Ekonomi- och kostnadsutveckling.....	28
Investeringsbedömning	28
Hyreskostnad och verksamhetsekonomi	29
Bilaga 1 – Förskola och grundskola, områdesbeskrivning.....	33
Bälinge – Björklinge	34
Centrala staden – Fålhagen	38
Gunsta – Länna – Almunge – Knutby	42
Gävsta- Stavby – Tuna.....	46
Luthagen – Stenhagen	49
Norby – Eriksberg – Flogsta	53
Ramstalund – Vänge – Järlåsa.....	57
Salabacke – Årsta – Vaksalabygden.....	60
Storvreta – Vattholma – Skyttorp	64
Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala.....	68
Sävja – Bergsbrunna – Danmark	72
Valsätra – Gottsunda – Sunnersta.....	75
Bilaga 2 – Gymnasieskola och särskola, hela staden	79
Gymnasieskola.....	79
Särskola	81
Bilaga 3 – Färdigställda åtgärder 2021.....	83

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Planen tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun planerar och hanterar både dagens och framtidens utmaningar med lokaler för pedagogisk verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Planerna ska säkerställa att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Planperioden omfattas av åren 2022 – 2026. Åtgärderna är kopplade till mål- och budgetprocessen. Åtgärder anges även för åren 2027–2031 men är inte lika specificerade i tid.

Med syfte att få mer kostnadseffektivt lokalnyttjande kommer samlokalisering mellan olika verksamheter att prövas. Alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv ska prövas för att sänka investeringsvolymen i koncernen.

Den övergripande styrningen genom kommunens Mål och budget redovisas på sidan 6.

Sammanfattat behov

Behovsbedömningen baseras på kommunens befolkningsprognos samt planer för bostadsutbyggnad och kommunens utveckling enligt översiktsplanen. I analysen har ytterligare underlag vägts in, till exempel andelen barn som behöver en förskoleplats och kända barn- och elevströmmar.

I kommunprognosen från 2021 är det förväntade antalet barn och ungdomar under lokalförsörjningsperioden fram till och med år 2025 något lägre jämfört med förra årets prognos. Det gäller framför allt antalet barn i förskoleåldern.

Antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år antas öka från och med 2020 till och med 2031 med cirka 5 600 personer. Ökningen i procent antas bli störst i förskoleåldrarna, grundskolans högstadieåldrar och gymnasieåldrarna. Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar.

I samtliga skolformer antas tillkommande platser komma att bedrivas både i kommunal regi och i fristående regi.

Behovsanalysen redovisas i sin helhet på sidan 8.

Sammanfattade åtgärder

Åtgärderna i planen syftar till att möta det analyserade behovet i kommunal regi, säkerställa och förbättra lokalerna samt ge förutsättningar för andra nödvändiga fastighetsåtgärder, till exempel renoveringar.

Fristående aktörer är viktiga för att tillgodose samtliga skolformers behov inom kommunen men planen visar endast åtgärder som kan komma att förverkligas inom kommunal regi.

I planen revideras även tidigare beslutade åtgärder utifrån nya förutsättningar.

Inom den kommunala förskolan tillkommer drygt 3200 platser under perioden 2022–2031. Utöver tidigare beslut innehåller planen beslut om 9 nya förskolor varav 8 ersätter befintliga. Beslut om nedläggning av två förskolor ingår också i denna plan. Fler nya förskolor samt renovering och utökning av befintliga ska utredas. Dessutom ersätts 11 moduluppställningar med permanenta förskolor enligt tidigare beslut.

Inom den kommunala grundskolan etableras 5900 nya platser under perioden 2022–2031. Utöver de platser som tidigare har beslutats innehåller planen beslut om tre ombyggnationer av befintliga skollokaler som kan utöka antalet platser ytterligare. Flera nya grundskolor, samt renovering och utökning av befintliga grundskolor är under utredning.

Årets plan innehåller en flytt av Lundellska gymnasieskolan inklusive resursenheten till nya lokaler på Polacksbacken.

Grundsärskolan kommer att utökas med en ny enhet.

Alla åtgärder redovisas i sin helhet på sidan 19.

Sammanfattning ekonomi

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för lokal och drift för verksamheterna.

I arbetet med lokalförsörjningsplanen sker beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, till exempel hyra per elev.

Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär:

6 210 miljoner kronor i investeringar i fastigheter inom kommunkoncernen.

621 miljoner kronor i investeringar för utbildningsnämnden.

473 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för utbildningsnämnden.

Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten.

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidan 28.

Inledning

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Lokalförsörjningsplaneringen har till syfte att genom samordnad och gemensam beredning säkerställa att behov möts kopplat till den budget som finns.

Bostads- och lokalförsörjningsplaner för kommunala verksamheter revideras årligen samt koordineras med varandra för att skapa en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering.

Planens innehåll

Planen omfattar planerade åtgärder under de närmaste åren med en utblick för åtgärder mot år 2031. Lokalförsörjningsplanen redovisar:

- Förutsättningar
- Behov och kapacitet
- Åtgärder – *nya och tidigare beslutade*
- Utredningsuppdrag
- Ekonomiska konsekvenser
- Områdesindelade analyser och åtgärder

Styrning och uppdrag

Planen utgår från utbildningsnämndens ansvarsområden och de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023 (KSN-2019-03310). Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är koordinerat med beredningen av Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024.

Grunden utgörs av nämndens ansvar för lokaler för pedagogisk verksamhet samt nämndens verksamhetsplan för detta.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska försörjning av lokaler och bostäder. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva.

Arbetets organisation

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag, till exempel Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Arbetet med framtagandet leds och samordnas av kommunledningskontoret.

Styrning av arbetet på tjänstepersonsnivå sker i gemensamma beslutsorgan där samtliga samverkande parter deltar. Planen går till beslut i utbildningsnämnden och för godkännande i kommunstyrelsen.

Lagbestämmelser och krav

Arbetet med lokalförsörjning ska utgå från lagar, krav och kommunala styrdokument. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till skollagen, miljöbalken och till barnets behov enligt barnkonventionen.

Funktionsprogram

Skollokaler för alla skolformer behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolformernas olika behov, men de ska samtidigt vara yteffektiva, kostnadseffektiva och hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och förändringar i elevunderlaget.

Utbildningsnämnden har fattat beslut om funktionsprogram som syftar till att säkerställa dessa kvalitéer vid ny- och ombyggnation.

För förskolan finns det ett nationellt funktionsprogram som togs fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samband med SKR:s ramavtal för förskolebyggnader (UBN-2020–05666).

Funktionsprogrammet för grundskolan (UBN-2019-1868) finns framtaget för Uppsala kommun och uppdateras och revideras årligen.

Riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola, beslutad av kommunstyrelsen (KSN-2020-02088), ska gälla vid byggande av lokaler för både kommunalt och enskilt drivna pedagogiska verksamheter.

Funktionsprogram för städ-, transport- och måltidsservice är under framtagande för att bättre bevaka de funktioner som dessa verksamheter behöver i framtida skollokaler.

För grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola tas projektspecifika funktionsprogram fram. Generella funktionsprogram för dessa skolformer finns inte för närvarande.


Behov- och kapacitetsanalys

Befolkningsprognos

År 2020 bodde drygt 233 800 personer i kommunen. Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. I årets prognos antas befolkningen år 2031 uppgå till knappt 263 800 personer, en ökning med cirka 30 000 personer jämfört med år 2020. Ökningen väntas i samtliga åldersklasser, men antas ske långsammare än befolkningsprognosen 2020.


Efter år 2031 väntas befolkningen fortsätta öka i ungefär samma takt fram till år 2050.

Variationer i prognoser från olika år innebär stora utmaningar i planeringen av platser samt visar på att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.

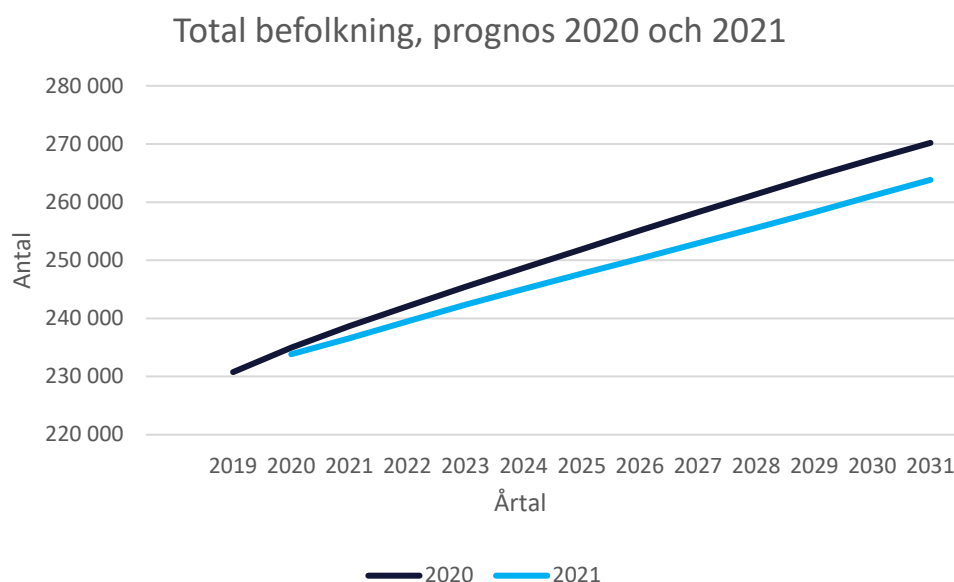


Figur 1 Befolkningsprognos, total befolkning Uppsala kommun 2020 och 2021

Antalsmässigt bedöms befolkningsökningen bli störst i de yngsta och i de äldsta åldersklasserna till och med år 2031. 1–5 åringar bedöms öka med cirka 1 700 barn, 6–9 åringar med cirka 800, 10–12 åringar med cirka 300, 13–15 åringar med cirka 1 200 ungdomar och 16–18 åringar bedöms öka med cirka 1 600 ungdomar.

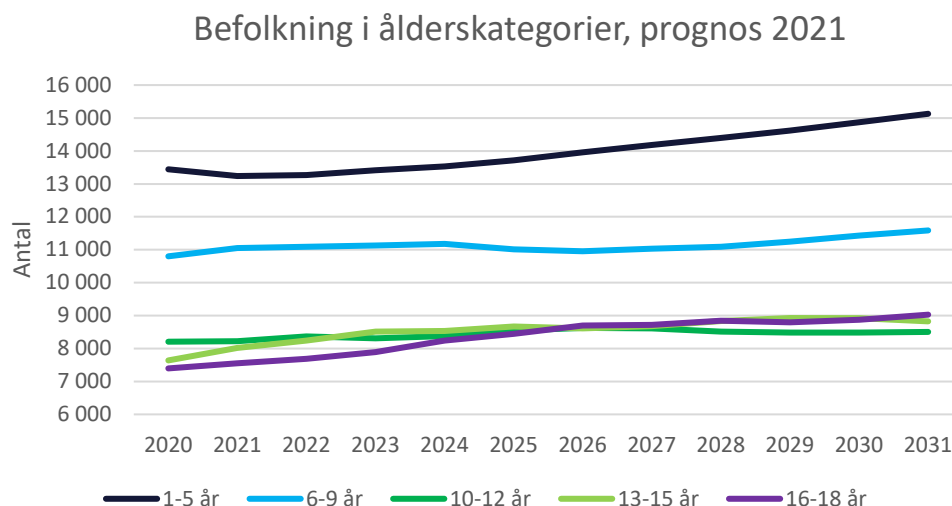

Figur 2. Befolkningsprognos per ålderskategorier Uppsala kommun 2021.

Andelsmässigt bedöms ungdomsgrupperna öka mest. Till och med år 2031 väntas åldrarna 13–15 år öka med 16 procent medan 16–18 åringar väntas öka med 22 procent.

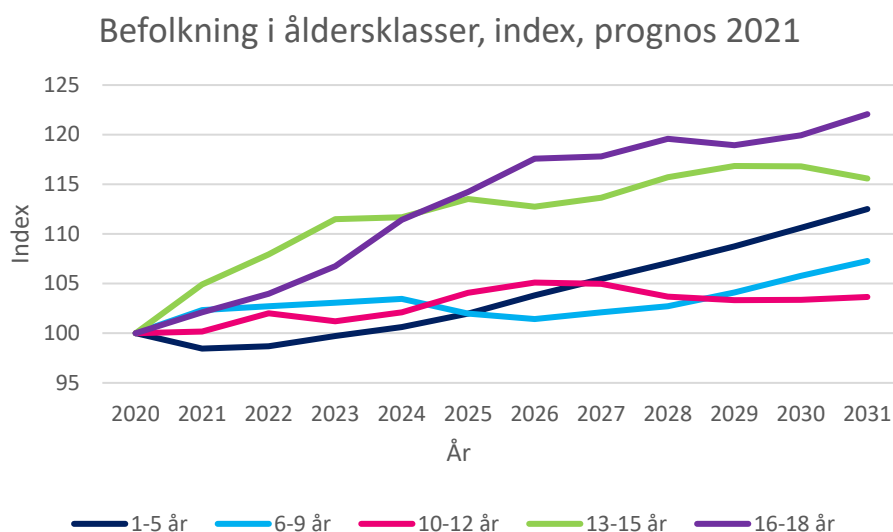


Figur 3. Befolkningsprognos i åldersklasser Uppsala kommun, förändring utifrån index 2020.

Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)


2021 års befolkningsprognos visar på ett betydligt lägre antal barn i förskoleåldern till och med år 2031 jämfört med prognos 2020.

Trots det förväntas cirka 1 500 fler barn med hänsyn tagen till servicegraden behöva en förskoleplats hösten år 2031 jämfört med hösten år 2020.

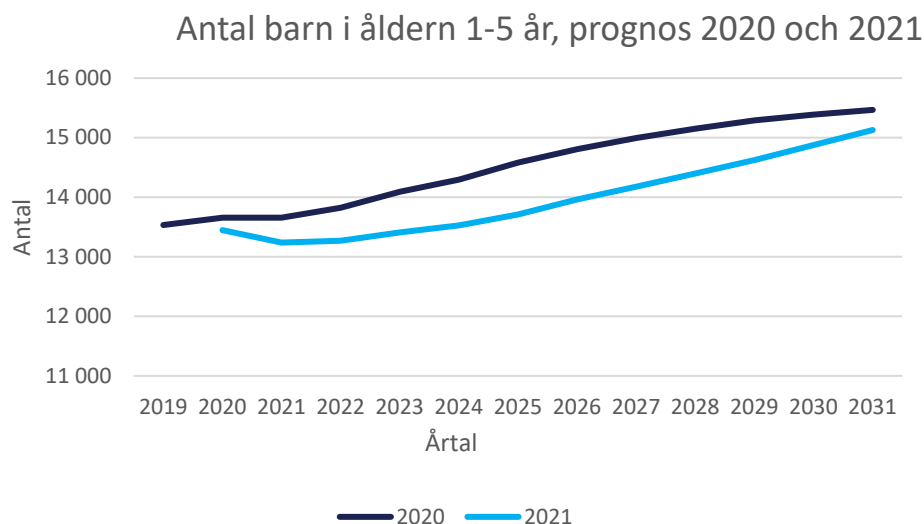

Figur 4. Befolkningsprognos 1-5 år, Uppsala kommun 2020 och 2021

Behovet av förskoleplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen fördelad på lokalförsörjningsområden. En separat beräkning görs för höstbehovet respektive vårbehovet. Förskola eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) är ett erbjudande som många, men inte alla, nyttjar. Den så kallade servicegraden anger hur stor andel av barnen i åldrarna 1-5 år inom ett område som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Planering sker efter en total servicegrad på 89 procent men den faktiska siffran varierar mellan områden och under läsåret.

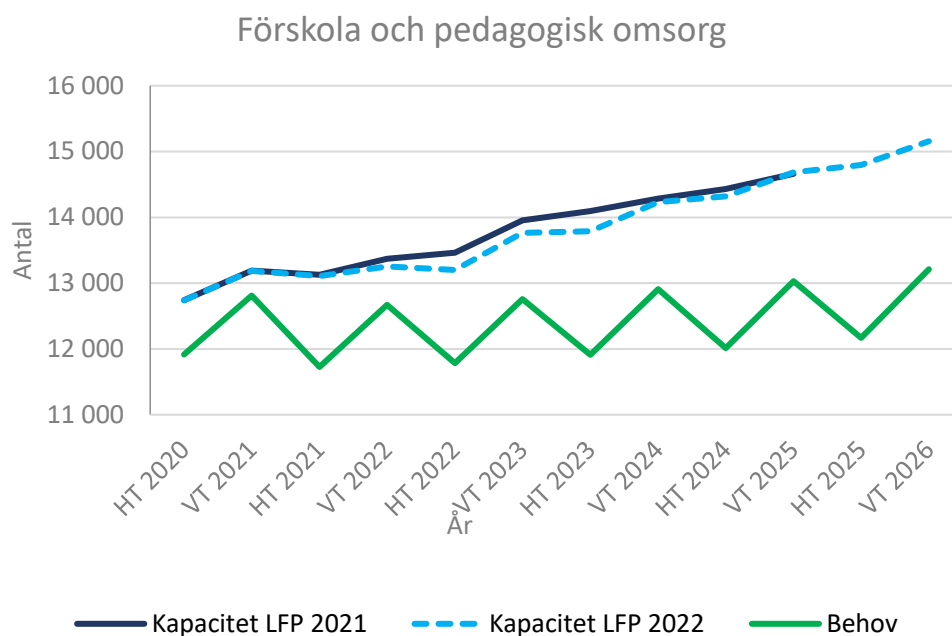


Figur 5. Total kapacitet samt behov förskola och pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Drygt 60 procent av dagens drygt 13 100 förskoleplatser inom förskolor och pedagogisk omsorg bedrivs i kommunal regi och knappt 40 procent bedrivs i fristående regi. De senaste åren har det skett en förskjutning mot en högre andel platser i fristående regi. I

behovsprognosen beräknas det ökade behovet av förskoleplatser tillgodoses i kommunal regi om inte annat är känt. I områdesinformationens diagram redovisas den totala kapacitetsökningen för området medan tabellerna endast redovisar åtgärder i kommunal regi.

Trots att diagrammet visar en överkapacitet på totalen ger den planerade utbyggnationen ett stort behov av nya förskolor inom flera områden av Uppsala kommun eftersom förskolor bör kunna erbjudas nära hemmen.

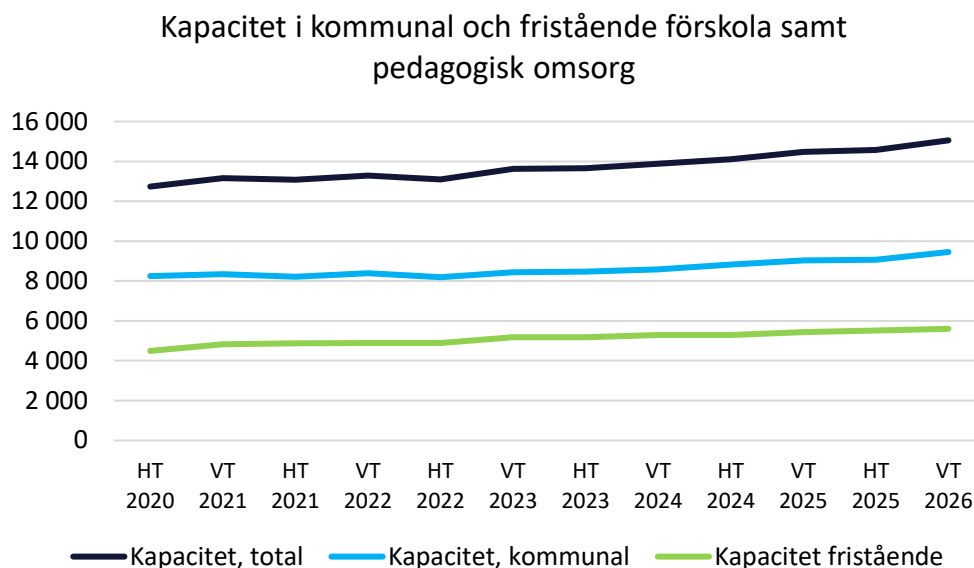

Figur 6. Total kapacitet, kommunal samt fristående förskola och pedagogisk omsorg, Uppsala kommun.

Behovet av förskoleplatser varierar mellan höst och vår. Under sommaren skrivs alla barn som ska börja i grundskolan ut. Förskolan och den pedagogiska omsorgen fylls succesivt på under läsåret och når sitt maximala antal platser under vårterminens andra hälft. Kapaciteten måste därför anpassas efter vårbehovet, trots att det innebär en viss överkapacitet under hösten.

Efterfrågan på förskoleplatser är inte bara ojämn över året. Den är även geografiskt ojämnt fördelad. Under planperioden kommer åtgärder att vidtas i syfte att minska antalet förskoleplatser där ett överskott av platser råder. På motsvarande sätt kommer åtgärder vidtas för att försöka öka antalet förskoleplatser där det råder platsbrist.

I områden med brist på förskoleplatser kan kapaciteten kompletteras med mobila enheter. Sju mobila enheter, även kallade förskolebussar, finns inom Uppsala kommun. Varje läsår är dessa enheter knutna till sju förskolor där kapaciteten behöver utökas. Utöver att de hjälper till att lösa en kapacitetsbrist erbjuder de även barnen en omväxlande utomhuspedagogik.

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats för vårdnadshavare som är hemma med barn i åldrarna 0–5 år. Uppdraget från utbildningsnämnden innebär även att ge ett tidigt stöd i samverkan med kommunens Råd och Stöd-verksamhet samt med regionens Mödra- och barnhälsovård enligt avtal med Region Uppsala. Öppen förskola är ofta lokaliserad nära en familjecentral och arbetar familjecentrerat.


Öppna förskolor i Uppsala kommun drivs av kommunen, samfund eller föreningar.

I lokalförsörjningsplanen redovisas förändringar i fastighetsbeståndet för Öppen förskola under berörda områden. De ingår däremot inte i kapacitetsredovisningen.

Grundskola

2021 års befolkningsprognos visar på ett lägre behov av grundskoleplatser de närmaste åren jämfört med prognosen 2020.

Omkring 2 300 fler barn och ungdomar förväntas ändå behöva en grundskoleplats hösten 2031 jämfört med hösten 2020.

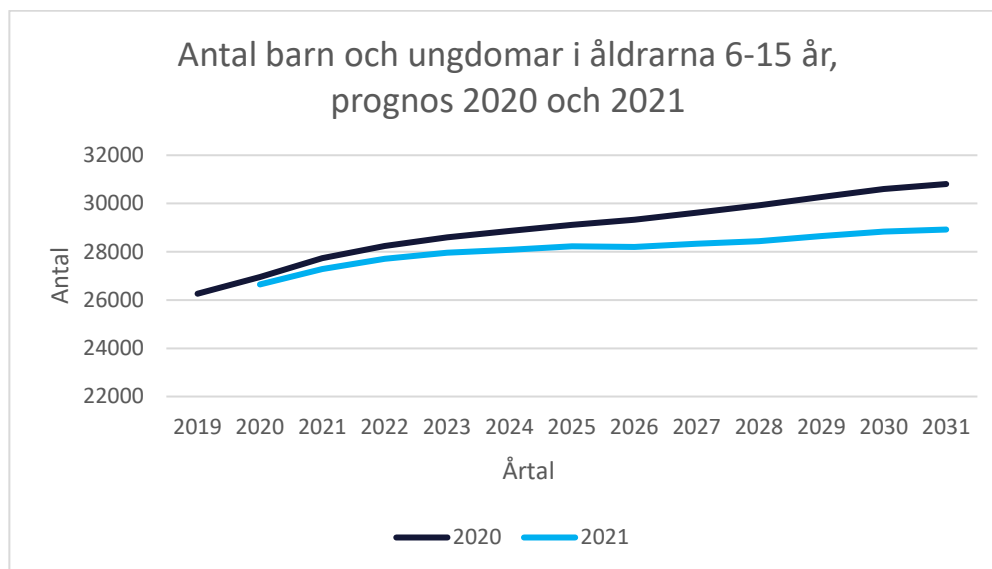

Figur 7. Befolkningsprognos antal barn och ungdomar i åldrarna 6–15 år, Uppsala kommun 2020 och 2021.


Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen och kända elevströmmar fördelade på lokalförsörjningsområden, med avräkning av elever i grundsärskola. Ett ut- respektive inflöde till och från andra kommuner ingår också i beräkningen.

Utbildningsförvaltningen har under året i samråd med kommunledningskontoret fastställt kapaciteten för varje skola.

En grundskola är av olika anledningar sällan fullbelagd utifrån kapacitetsbegreppet. Det beror till exempel på elevvalet, att elever börjar och slutar och att olika undervisningsgrupper tillkommer. För att kommunen ska kunna lokalförsörja i rätt omfattning krävs en viss marginal annars finns det risk att kommunen har för få elevplatser.


I lokalförsörjningsplanens diagram redovisas därför 90 procent av kapaciteten vilket är det elevantal kommunen planerar efter vid den årliga revideringen av lokalförsörjningsplanen. I tabeller över nyproduktion anges däremot hela kapaciteten.

Behovskurvan i områdesredovisningens diagram redovisar inte endast antalet barn och ungdomar i området. En justering har gjorts med hänsyn till hur många elever som går i områdets skolor. Om eleverna är fler än områdets barn och ungdomar skriver behovsberäkningen upp områdesprognosen för området. Om eleverna är färre skrivs istället behovsprognosen ner. Barn och ungdomar går, bland annat genom det fria skolvalet, i skolor i andra områden än där de bor.

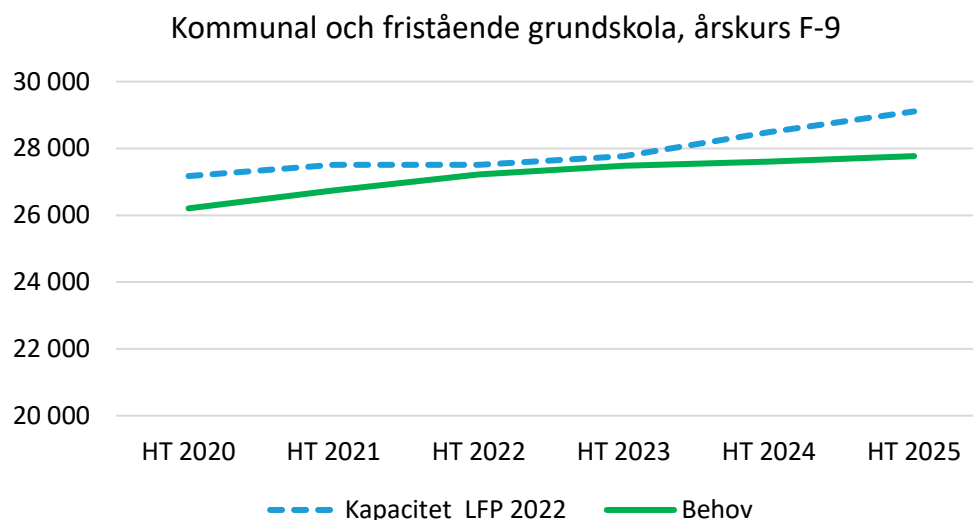

Figur 8. Total kapacitet och behov grundskola: Kommunal och fristående regi, Uppsala kommun. LFP 2021 redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Knappt 85 procent av dagens cirka 31 800 grundskoleelever går i skola i kommunal regi och drygt 15 procent går i skola i fristående regi. De fristående grundskolorna antas i stort sett ha fyllt sin kapacitet. För elevtalsprognosen innebär det att det ökade behovet av grundskoleplatser till största delen antas tillgodoses i kommunal regi.

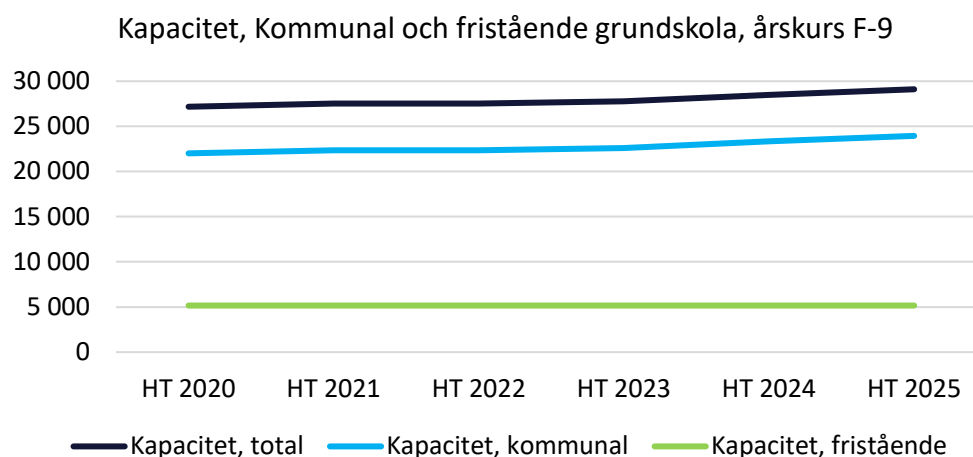


Figur 9. Total kapacitet, kommunal samt fristående grundskola, Uppsala kommun.

Ett stort behov av platser kommer att uppstå i utbyggnadsområden, men det finns även ett ökande behov av grundskoleplatser i stadens centralare delar. I utbyggnadsområden är målsättningen att helt nya skolor ska byggas. I stadens centralare delar är det svårare att tillgodose fler platser.

Gymnasieskola


2021 års befolkningsprognos visar ett lägre behov av gymnasieplatser de kommande åren för den folkbokförda befolkningen jämfört med prognos 2020. Ändå bedöms det bo drygt 1 600 fler ungdomar i gymnasieåldrarna i Uppsala kommun hösten 2031 jämfört med hösten 2020.

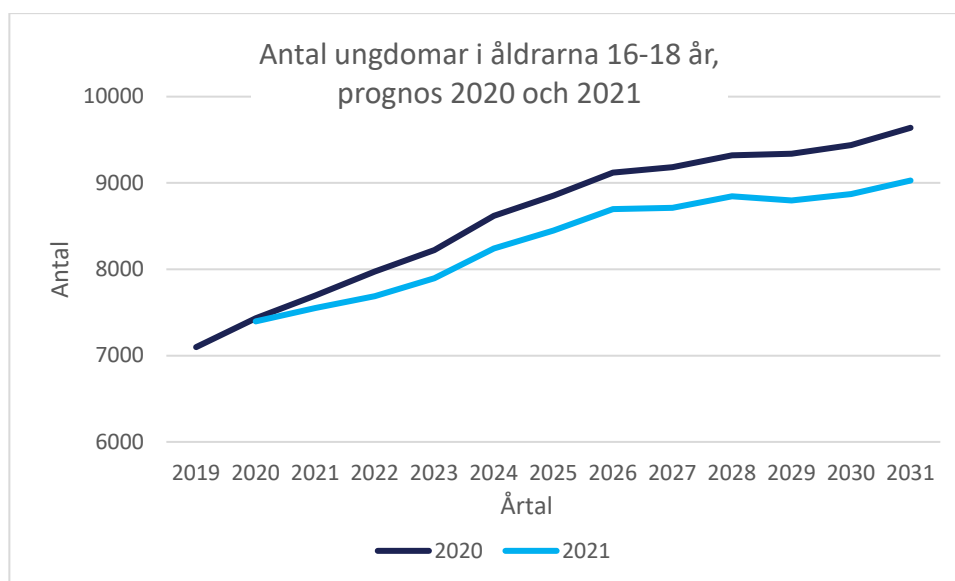

Figur 10. Befolkningsprognos antal ungdomar i åldrarna 16–18 år, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen med avräkning av elever i särskilda skolformer, till exempel gymnasiesärskola, samt elever som går i gymnasieskola i annan kommun. Inflödet från andra kommuner tas också med i beräkningen.


Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Eleverna har möjlighet att välja om, börja om och hoppa av. Detta leder till att det finns mer än tre årskullar inne i systemet samtidigt. Antalet elever som går i gymnasieskola i Uppsala kommun ligger därför ofta över 100 procent av befolkningen i åldrarna 16–18 år, trots att inte alla ungdomar går en gymnasieutbildning.

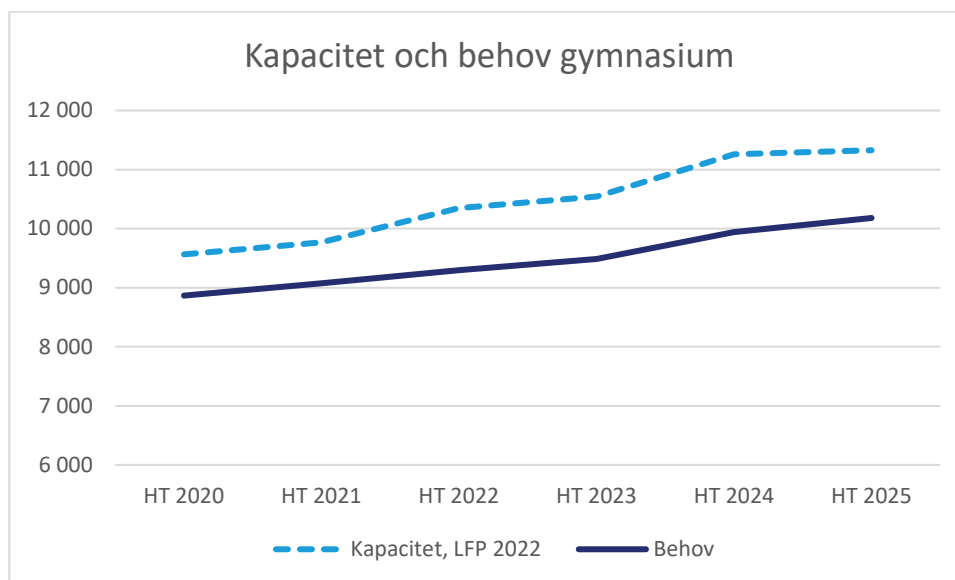

Figur 11. Total kapacitet och behov gymnasium: Kommunal och fristående. LFP 2021 redovisade endast kapacitet i kommunala gymnasier och har därför inte tagits med som jämförelse.

Ungefär 80 procent av dagens totalt cirka 9 000 gymnasieelever i gymnasieskola i Uppsala kommun går i skola i kommunal regi och ungefär 20 procent går i skola i fristående regi. Framför allt på de teoretiska programmen bedöms merparten av de fristående gymnasieskolorna ha fyllt sin kapacitet. Det ökade behovet av platser på teoretiska program i gymnasieskolan antas därför i första hand tillgodoses i kommunal

regi, vilket innebär att andelen elever i kommunal regi kommer att öka något de närmaste åren.

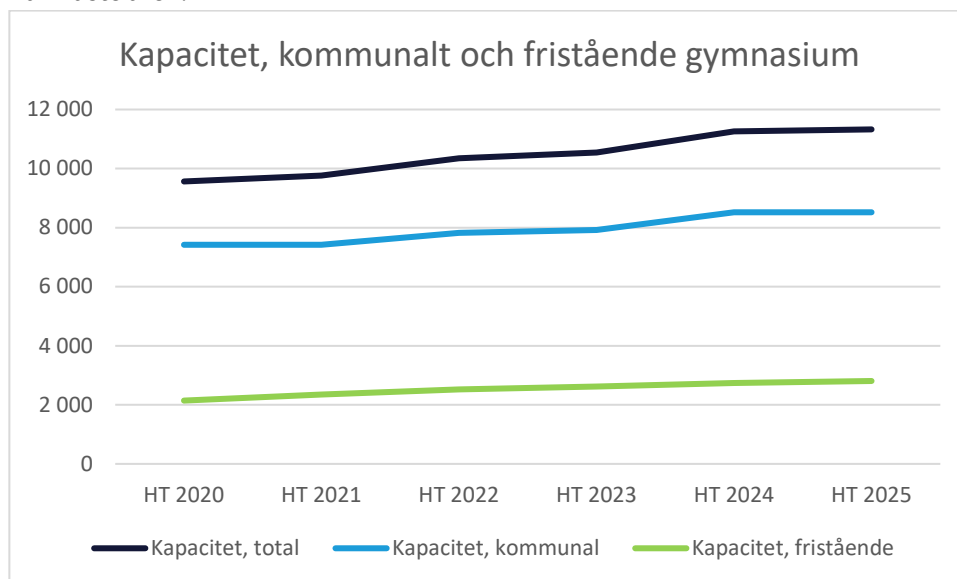

Figur 12. Kapacitet kommunalt samt fristående gymnasium, Uppsala kommun.

Hösten 2021 och något år framåt kommer det att finnas ett visst överskott av platser inom gymnasieskolan. Nya Ellen Fries kommer att fyllas på i etapper, med en slutlig kapacitet på 800 elever. Det kommer då fortfarande att finnas ett visst överskott på en del av de praktiska programmen.


Särskola

Särskolan i kommunal regi är uppdelad i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskola

Sedan hösten 2019 pågår grundsärskolans arbete med att övergå från mindre grundsäreheter, ca 30 elever per enhet, till större skolenheter. De nya enheterna ska bereda plats för 50–75 elever vardera, vilket innebär en ökning med 15–45 platser/enhet jämfört med tidigare antal elever. Antalet elever i grundsärskolan förväntas fortsätta öka i ett långsiktigt perspektiv. I årets prognos något snabbare än vad tidigare prognoser visat.

En särskola kräver stor lokalyta. 50 särskoleplatser motsvarar ungefär 240 ordinarie grundskoleplatserns behov av yta, vilket påverkar placeringen av ny enhet. Med ett ökat antal elever i grundsärskolan behövs ytterligare enheter för 50–75 elever. Lämpliga alternativ för detta utreds. Angöring är en viktig parameter som behöver tas med i planeringen av särskolans verksamhet eftersom många elever åker taxi till och från skolan. En annan viktig parameter är integrering med elever i grundskolan vilket innebär att grundsärskolan behöver finnas i direkt närhet till grundskolan.

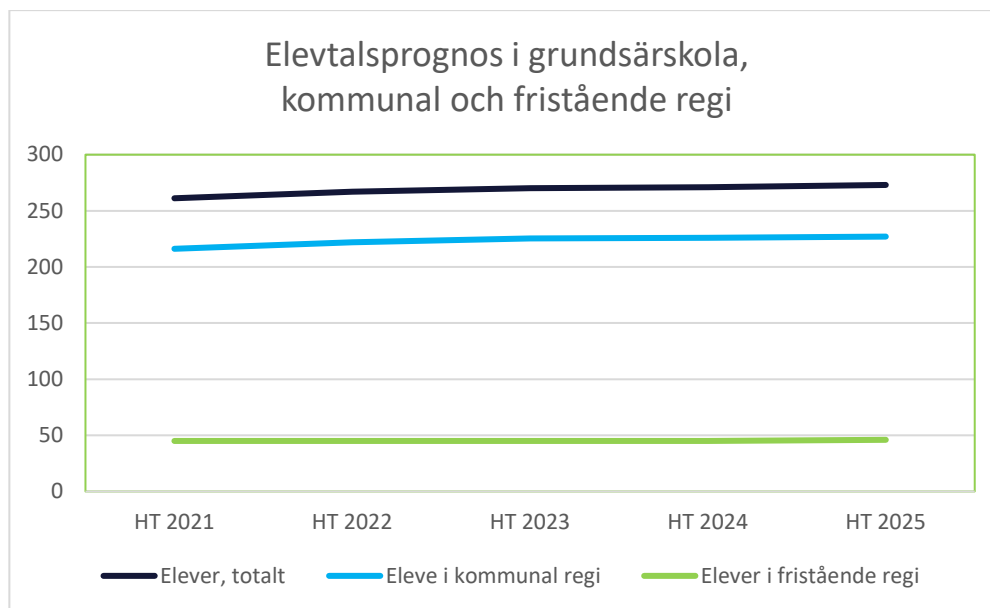


Figur 13. Elevtalsprognos, kommunal samt fristående grundskola, Uppsala kommun.

Gymnasiesärskola

På gymnasiesärskolan finns flera nationella program och ett individuellt program. De nationella programmen är nästan uteslutande yrkesprogram som ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. Det individuella programmet är till för de elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program.

Antalet elever i gymnasiesärskolan förväntas fortsätta öka i ett långsiktigt perspektiv. I årets prognos något snabbare än vad tidigare prognoser visat.

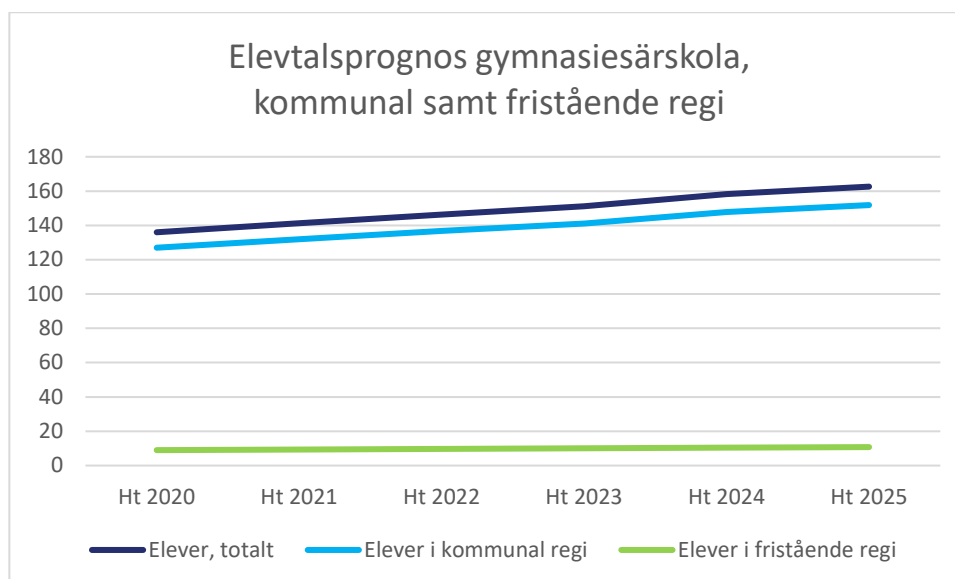

Figur 14. Elevtalsprognos, kommunal samt fristående gymnasiesärskola, Uppsala kommun.

Lokalresurser

Förändringar i antalet barn- och elever inom kommunen ställer stora krav på kommunen att utnyttja befintliga lokaler på ett effektivt sätt. I vissa lokaler kan mindre lokalanpassningar eller arbetsmiljöåtgärder göra att kapaciteten kan ökas.

I framför allt områden med en stor andel småhus och radhus kan behovet av platser vara svårt att tillgodose. Inledningsvis finns ett stort behov av förskoleplatser, som senare övergår i ett stort behov av grundskoleplatser. Ett sätt att effektivisera lokalutnyttjandet är att skapa flexibilitet mellan de olika skolformerna. Det kan innebära att en skola över tid används av olika skolformer eller samnyttjas av olika skolformer.

Vid nybyggnation och större ombyggnation av grundskolor ska en skolstruktur motsvarande förskoleklass till och med årskurs 6 respektive årskurs 7 till och med 9 eftersträvas, alternativt en skolstruktur motsvarande förskoleklass till och med årskurs 9.

Under vissa perioder kan även tillfälliga lösningar i form av moduler behövas även i framtiden. Det kan både handla om att lösa ett akut behov av evakueringar som att lösa ett tillfälligt behov av ökat antal platser inom ett lokalförsörjningsområde. Denna balans mellan permanenta och tillfälliga lösningar behövs för att skapa en flexibilitet i lokalanvändningen. Nyttjandet av moduler behöver dock minska av ekonomiska skäl framöver.

Ordet inhyrning används om fastighetsägaren inte ingår i kommunkoncernen. Eventuell inhyrning betyder att det ännu är oklart om kommunen eller en fristående aktör kommer att driva verksamheten.

Samnyttjande

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver flera kommunala verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal. Samnyttjande av anläggningar och lokaler ska bidra till att tillgängliga lokalytor kan användas mer effektivt, skapa synergieffekter mellan verksamheter och att skattemedel används mer kostnadseffektivt.

Utblick

Stads- och landsbygdsutveckling

2020 aktualitetsförklarades översiktsplanen från 2016 (KSN-2019-0421). I den redovisas fyra scenarion av ökning av invånare fram till 2050. Lågsceariot visar på en utveckling om 1 700 invånare per år och extra hög på 4 800 invånare per år, vilket resulterar i en total på mellan 280 000–380 000 invånare år 2050.

Aktualitetsförklaringen innehåller också en förnyad geografisk utbyggnationsriktning för bostäder där utvecklingen i Uppsala tätort fokuseras till genomförande av Uppsalapaketet och åtagandet om 33 000 bostäder. Utöver pågående bostadsprojekt kan nya initieras och prioriteras i övriga delar av staden om de stödjer stadsdelsnoder och stadsstråk samt inte kräver stora tröskelinvesteringar. Först efter 2030 kan det bli aktuellt att tillskapa beredskap för större utbyggnader i Stabby, Gränby, Flogsta och Slavsta.

För de prioriterade tätorterna är fokus att genomföra de stora utbyggnader som redan pågår eller börjat förberedas. I aktualitetsförklaringen lyfts Bälinge, Lövstalöt, Storvreta, Vattholma, Jälla och Gunsta samt att större utbyggnader även kan initieras i Björklinge och eventuellt i Skyttorp. Utöver aktualitetsförklaringen har även kommunstyrelsen gett i uppdrag att prioritera bostadsbyggandet på landsbygden, vilket medför översyn av fler prioriterade tätorter och vilken utveckling av social infrastruktur som behövs om ytterligare bostäder tillkommer.

Beredskap för kommande behov

Vid planering av utbyggnation av bostäder i kommunen görs en bedömning av vilket behov av social infrastruktur bostadsbyggnationen genererar. I vilken omfattning och takt bostäderna sedan byggs påverkar när, var och hur behovet uppstår. Planeringen av social infrastruktur behöver alltså, trots långa ledtider, vara anpassningsbar för justeringar i samhällsbyggnadsprocessen. Det kan exempelvis innebära att skjuta fram projekt eller behovet av tillfälliga lösningar.

Åtgärder

Nya åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Förskola	Beskrivning	Färdigställd
Björklinge	Ny förskola, 72 – 144 platser. Preliminär tidsplan.	2027
Fullerö förskola	Förskolan rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet oklar. Evakuering till Lyckebo förskola genomförd 2021. Preliminär tidsplan.	2027
Hällby förskola	Permanent ersättning av moduluppställning, 144 platser.	2027
Kullerstenens förskola	Förskolan läggs ned, lämnar lokaler för att möjliggöra utvidgning av grundskolan. -54 platser.	HT 2023
Källparkens förskola	Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakuering krävs. Ny kapacitet oklar. Preliminär tidsplan.	2027
Silikatets förskola	Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakueras till Rosendals förskola 2022. Ny kapacitet preliminärt 108 platser.	2027
Skyttorp	Ny förskola inklusive ersättning av befintlig, ny kapacitet 72 – 144 platser. Preliminär tidsplan.	2027
Sten Stures förskola	Permanent ersättning av moduluppställning inom Polacksområdet. 72 platser flyttas från området Centrala staden – Fålhagen. Ny kapacitet 144 platser i området Norby – Eriksberg – Flogsta.	2027
Södra Gunsta, etapp 2	Ny förskola, ersätter den tillfälliga förskolan i grundskolan, 72 platser. Preliminär tidsplan.	2028–2029
Ulleråkers förskola	Ersättning och utökning av Ulleråkers förskola i hus 65. Ny kapacitet 144 platser.	HT 2024
Öfre Slotts förskola	Förskolan läggs ner.	HT 2023

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Grundskola	Beskrivning	Färdigställd
Björkwallsskolan	Renovering, ev utökning genom ombyggnad. Etappvis evakuering till moduler krävs. Preliminär tidsplan för färdigställande.	2026
Ulleråker	Ombyggnation av Lundellska skolans lokaler. Oklar kapacitet.	Ej fastställd
Östra Stenhagenskolan	Utökning när Kullerstenens förskola lämnar, +90 platser. Ny kapacitet 600 platser.	2024

Tabell 2. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Gymnasium	Beskrivning	Färdigställd
Lundellska skolan	Flytt till nya lokaler på Polacksbacken (Tidigare beslut: 1 400 nya gymnasieplatser i södra staden).	2024
Lundellska skolan	Lokaler för resursenheten ersätts. (Tidigare beslut: Lokaler för resursenheten måste ersättas inom Ulleråkerområdet.)	2023

Tabell 3. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärder i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Särskola	Beskrivning	Färdigställd
Ny grundsärskola	Ny grundsärskola. 50 – 75 platser. Preliminär placering och tidsplan.	2026

Tabell 4. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärder i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Åtgärder som ej är inkluderade i Mål och budget 2022		
Grundskola	Beskrivning	Färdigställd
Kvarngårdesskolan	Evakueras temporärt VT 2022.	2022
Ärentunaskolan	Utökad ventilation. Kräver etappvis evakuering till moduler.	2023

Tabell 5. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärder i tabellen är inte inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Förskola	Beskrivning	Färdigställd
Almtuna förskola	Ersätter Tallens modulförskola inom Almtuna skolområde. Ny kapacitet 144 platser.	VT 2024
Arkitektens förskola	Permanent ersättning för moduluppställning. Kapacitet 72 platser.	HT 2024
Axelina förskola	Moduluppställning avvecklas och ersätts i Östra Salabacke (tidigare beslut: Vaksala kyrkskola).	HT 2022
Botulvs förskola	Renoveras. Evakuering krävs, preliminärt till Tallens modulförskola 2024.	VT 2025
Bälingeby förskola	Moduluppställning ersätts och utökas med permanent förskola. Ny kapacitet 144 platser. Evakuering till nya moduler HT22.	VT 2024
Börjetull/ Librobäck	Ny förskola 36 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.	2027
Börjetull/ Librobäck	Ny förskola 72 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.	2030-2031

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Börjetull/ Librobäck	Ny förskola 144 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.	VT 2026
Gamla Uppsala	Ny förskola i samband med nybyggnation av Gamla Uppsala skola. 54 – 72 platser.	2028-2029
Glimmerns förskola	Ersätts samt utökas. Evakuering krävs. Ny kapacitet 144 platser.	2030-2031
Gränbystaden	Ny förskola. Ev inhyrning. 72 platser.	HT 2025
Gunsta	Ny förskola. Inledningsvis i skolan. 72 platser.	HT 2025
Gåvsta förskola	Permanent ersättning av moduler. Evakuering till nya moduler 2022. Ny förskola klar HT26, kapacitet 144 platser.	VT 2022
Hammarparken	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.	VT 2026
Himmelsvägens förskola	Moduluppställningen lämnas 2026.	HT 2026
Hällby förskola	Tidigare beslutad kapacitetsminskning genomförs inte.	
Järlåsa förskola	Permanent ersättning för moduluppställning. Evakuering till nya moduler 2022. Ny förskola klar VT24. Kapacitet 72 platser.	VT 2024
Kapellgården	Ny förskola. 90 platser.	HT 2024
Karlavagnens förskola	Befintlig förskola rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet 72 platser. Evakuerade till Hemmings förskola.	VT 2026
Kullens förskola	Ny förskola. Ny kapacitet 108 platser.	VT 2026
Kv Hugin	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.	2027
Källparkens förskola	Befintlig förskola renoveras eller ersätts. Ev. utökning. Evakuering krävs HT22. Se tabell 3: "Nya åtgärder"	
Lagerlöfs förskola	Renoveras. Evakueras till Österledens moduluppställning HT23. Preliminär tidsplan.	HT 2024
Lindbackens förskola	Ny förskola. Permanent ersättning för Lindens förskola i grundskolan. 144 platser	VT 2022
Lindens förskola	Förskolan lämnar grundskolans lokaler och flyttar in i ny permanent förskola.	VT 2022
Luthagens förskola	Renovering. Evakuering till Tiunda förskola, HT22.	HT 2023
Länna	Ny förskola tillsammans med ny grundskola. Ev. inhyrning. 72 platser. Preliminär tidsplan.	2028-2029
Lövstalöts förskola	Moduluppställning ersätts med permanent förskola.	HT 2022
Malma	Ny förskola. Ev. inhyrning. 108 platser.	HT 2026
Malmvågens förskola	Tidigare beslutad kapacitetsökning genomförs inte.	
Norra Hovstallängen	Ny förskola i kvarteret Hovstallängen. Inhyrning. 144 platser.	HT 2026
Rackarbergets förskola	Ny förskola, inhyrning. Ny kapacitet 72 platser.	VT 2024
Rosendal Etapp 4	Ny förskola, ersätter Rosendals förskola (moduler). Kapacitet 144.	VT 2023

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Silikatets förskola	Renovering. Evakuering krävs. Tidsplan ej fastställd. Se tabell 3: "Nya åtgärder"	VT 2022
Skytteln förskola	Ny förskola i kvarteret Skytteln. 72 platser.	VT 2023
Skölsta	Ny förskola, inhyrning. 108 platser.	VT 2023
Stadsskogens förskola (Rosendal Etapp 5)	Ny förskola. 144 platser.	VT 2025
Stenhagens öppna förskola	Ersättning för Stenhagens öppna förskola. Tillbyggnad vid Västra Stenhagens förskola.	HT 2023
Sydöstra staden	Ny förskola. 108 - 144 platser.	2027
Sydöstra staden	Ny förskola. 108 - 144 platser.	2028-2029
Sydöstra staden	Tidigare schablonåtgärder stryks.	
Södra Storvreta	Ny förskola. Preliminär tidsplan. 144 platser.	2028-2029
Södra Storvreta	Ny förskola. Ev fristående. Preliminär tidsplan. 144 platser.	HT 2026
Trollskogens förskola (Rosendal Etapp 5)	Ny förskola. 72 platser.	VT 2023
Ulleråker	Ny förskola, kvarteret Vinghästen.	2027
Ulleråker	Ny förskola, kvarteret Strofen. Inhyrning. 72 platser.	HT 2025
Uppsävja förskola	Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 platser.	HT 2026
Vaksala kyrkskola	Ny förskola. Ersätter och utökar Axelina förskola. Ny kapacitet 144 platser. Åtgärd utgår eventuellt.	
Valsätra	Ny förskola. Ersätter och utökar Hugo Alfvéns nuvarande byggnad. Ny kapacitet 72 platser. Preliminär tidsplan.	VT 2026
Västra Stenhagens förskola	Utökning, koordineras med öppna förskolan. Ny kapacitet 54 platser.	HT 2023
Årsta Pilparken	Ny förskola. 72-144 platser.	2028-2029
Österledens förskola	Permanent ersättning för moduluppställning. Evakuering 2021. Ny kapacitet 144 platser.	HT 2023
Östra Salabacke	Ny förskola som ersätter Axelinas moduler. Inhyrning. Kapacitet +/- 0.	HT 2022
Östra Salabacke Etapp 3	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.	VT 2026
Östra Salabacke Etapp 4	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.	2028-2029

Tabell 6. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Grundskola	Beskrivning	Färdigställd
Almtunaskolan	Renoveras samt utökas till 720 platser. Evakueras in i Brantingskolan 2023. Ny skola färdig 2026	2023
Brantingskolan	Nybyggnation på befintlig skoltomt. Används som evakueringsskola för Almtunaskolan från 2023 till 2026. Total kapacitet 720.	2026
Bälinge skola	Ny skola på samma fastighet. Ny kapacitet 630. Evakuering krävs.	2026
Eriksbergsskolan/ Hågalsskolan	Renoveras och utökas. Evakuering krävs.	2028–2029
Flogtaskolan	Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakueras 2025	2026
Fredrika Bremer	Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakuering krävs	2027
Gamla Uppsala skola	Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakuering krävs.	2028–2029
Gottsundaskolan	Permanent ersättning för moduluppställning 720 platser	2024
Gunsta	Ny grundskola, kapacitet 630. Inledningsvis med förskola i del av skolan.	2025
Gåvsta skola	Permanent ersättning av moduluppställning. Ev. utökning av antalet elevplatser.	2027
Järlåsa	Nybyggnation av kök och matsal i samband med nybyggnation av förskola. Ev. utökning.	2024
Kvarngårdesskolan	Ersättning samt utökning till 990 platser. Evakueras till moduluppställning 2022.	2025
Lindbackens skola	Förskolan lämnar lokaler till skolan. Total kapacitet 600.	2022
Länna	Ny grundskola i Länna tillsammans med förskolan med upp till 420 platser. Preliminär tidsplan.	2028–2029
Norra Hovstallängen	Ny grundskola Kungsängen. 780 platser	2026
Nya Rosendalsskolan	Ny grundskola. 750 platser	2024
Nåntunaskolan	Byggs ut till tvåparallellig F-6, 420 platser. Efter 2031.	Efter 2031
Sydöstra staden	Tidigare schablonåtgärder stryks och flyttas till utredning.	
Sydöstra staden	Ny grundskola. 420 platser	2028–2029
Södra Storvreta	Ny grundskola.	2028–2029
Treklängen	Nuvarande skola rivs och ersätts. Evakuering krävs. Ny kapacitet 420 – 630 platser.	2027
Uppsala	Moduluppställning eller utökning i andra lokaler, 200 platser, placering oklar.	2023
Årstaskolan	Moduluppställning avvecklas.	2026
Årstaskolan	Utökning. Total kapacitet 990. Efter 2031	Efter 2031
Östra Storvreta	Ny grundskola i östra Storvreta. Efter 2031.	Efter 2031

Tabell 7. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Gymnasieskola	Beskrivning	Färdigställd
Ellen Fries gymnasium	Gamla Linnéskolan återtas som gymnasieskola då arbetsmarknadsförvaltningen lämnar den. Succesiv ökning till en kapacitet på 800 elever.	2022
Södra staden	1 400 nya gymnasieplatser. Ersätts av ny åtgärd: Flytt av Lundellska skolan till nya lokaler på Polacksbacken.	2023–2024
Uppsala yrkesgymnasium Jälla	Nybyggnation efter översyn av yrkesprogrammets behov.	2027

Tabell 8. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Särskola	Beskrivning	Färdigställd
Grundsärskola Brantingstorg	Ny permanent särskoleenhet i Uvens tidigare lokaler Brantingstorg	2023-2024
Uppsala GS	Nybyggnation vid Jälla för ersättning av moduluppställningen samt samlokalisering av gymnasiesärskolan.	2027

Tabell 9. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Utredningar

Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar om inte annat anges.

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
<i>Hela Uppsala:</i> Fortsatt översyn av gymnasieskolorna utifrån förväntat elevantal över tid, programutbud och effektivitet, särskilt gällande Uppsala kommuns yrkesgymnasier.	2022
<i>Hela Uppsala:</i> Nya gymnasielokaler till 2026.	2022
<i>Hela Uppsala:</i> Ytterligare utökning av grundsärskolan.	2022
<i>Hela Uppsala:</i> Utökning av platser inom grundskolan resursenhet.	2022

Utredning	
<i>Hela Uppsala:</i> Planera för en grundsärskoleenhet i ett längre perspektiv på någon av de kommande nybyggnationerna.	2022
<i>Hela Uppsala:</i> Elevtalsprognosen för gymnasiesärskolan utgår från att andelen elever på gymnasiet som går i särskolan är oförändrad. Detta ger en ökning av elevantalet som inte svarar mot antalet elever som idag är inskrivna i grundsärskolan. Därför behöver denna prognos utredas noggrannare.	2022
<i>Bälinge – Björklinge:</i> Utökning av förskoleplatser i Björklinge.	Pågår
<i>Bälinge – Björklinge:</i> Utbyggnation av Björklinge skola.	2022
<i>Bälinge – Björklinge:</i> Utbyggnation av Björkvallsskolan.	2022
<i>Bälinge – Björklinge:</i> Nya förskolor i Bälinge. Ev. inhyrningar.	2022
<i>Bälinge – Björklinge:</i> Ny grundskola i Bälinge.	2022
<i>Centrala staden – Fålhagen:</i> Permanent ersättning av Fålhagsledens moduler.	2022
<i>Gunsta – Länna – Almunge – Knutby:</i> Ytterligare förskole- och grundskoleplatser i Almunge.	Pågår
<i>Gunsta – Länna – Almunge – Knutby:</i> Ny förskola i Gunsta.	2023
<i>Gunsta – Länna – Almunge – Knutby:</i> Ny grundskola i Gunsta.	2023
<i>Gåvsta- Stavby – Tuna:</i> Renovering av Tuna skola. Evakuering krävs.	2022
<i>Norby – Eriksberg – Flogsta:</i> Renovering och/eller utbyggnad av befintliga förskolor inom planarbetet för Eriksberg.	Pågår
<i>Norby – Eriksberg – Flogsta:</i> Ytterligare förskola i Rosendal etapp 4.	2022
<i>Ramstalund – Vänge – Järlåsa:</i> Ny förskola i Vänge.	2023
<i>Salabacke – Årsta – Vaksalabygden:</i> Ytterligare förskoleplatser i Skölsta	Bevakas
<i>Storvreta – Vattholma – Skyttorp:</i> Behov av förskole- och grundskoleplatser i Storvreta, Vattholma och Skyttorp som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår

Utredning	
<i>Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala:</i> Permanent ersättning för Väpnarens modulförskola.	2022
<i>Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala:</i> Utredning av ytterligare förskoleplatser inom området.	Pågår
<i>Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala:</i> Gränby – Liljefors skolområde ska utredas för utveckling.	2022
<i>Sävja – Bergsbrunna – Danmark:</i> Nya för- och grundskoleplatser i Sydöstra staden som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår
<i>Valsätra – Gottsunda – Sunnersta:</i> Nya för- och grundskoleplatser i Gottsunda-Valsätraområdet som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår
<i>Valsätra – Gottsunda – Sunnersta:</i> Nya för- och grundskolor inom Ulleråker och Ultunaområdet som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår
<i>Valsätra – Gottsunda – Sunnersta:</i> Utökning av Växthuset III och Lilla Valsätra/Bäcklösaskolan.	2022

Tabell 10. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- En förskola i Börjetull/ Librobäck med 2 avdelningar kommer att drivas i fristående regi och tas därför bort ur lokalförsörjningsplanen.
- Den planerade minskningen av Hällby förskola genomförs inte eftersom platserna behövs såsom finska platser.
- Den planerade utökningen av antalet platser på Malmvågens förskola genomförs inte eftersom kulturförvaltningen nyttjar lokalerna istället.
- Grundskolans moduluppställningar till HT22 genomförs inte.

Total kapacitetsutveckling

Åtgärder	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Förskola													
Nya åtgärder													
Summa				-76		72					288		
Tidigare beslutade åtgärder justerade efter ny tidsplan													
Summa	90		252	54	198	90	144	216	448	432	324	558	144
Summa åtgärder													
Summa	90		252	-22	198	162	144	216	448	432	612	558	144
Ack summa	90	90	342	320	518	680	824	1 040	1 488	1 920	2 532	3 090	3 234

Tabell 11. Kapacitetsutveckling förskola.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Nya åtgärder								
Summa			90					
Tidigare beslutade åtgärder justerade efter ny tidsplan								
Summa	100	290	720	750	1 715	360	1 880	
Summa åtgärder								
Summa	100	290	810	750	1715	360	1880	
Ack summa	100	390	1200	1950	3665	4025	5905	5905

Tabell 12. Kapacitetsutveckling grundskola.

Ekonomi- och kostnadsutveckling

Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera olika sätt. Investeringsmedel måste säkerställas både för fastighetsåtgärder, då kommunkoncernen är fastighetsägare, och för verksamhetens behov av bland annat möbler. Det behöver även säkerställas att de nyttjande verksamheterna både kan bära lokalkostnaderna och har medel för att driva verksamheten.

Beräkningarna av dessa kostnader sker antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, till exempel hyra per elev.

Nya och tidigare åtgärder i denna plan 2022 till 2031 innebär:

6 210 miljoner kronor i investeringar i fastigheter för kommunkoncernen

621 miljoner kronor i investeringar inom utbildningsnämnden

473 miljoner kronor i tillkommande hyreskostnader för utbildningsnämnden

Beräkningarna inkluderar hyreskostnad för evakuering till moduluppställningar vid renoveringar samt en beräkning av hyreskostnad efter renovering.

Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten.

De ekonomiska förutsättningarna har löpande stäms av mot mål och budget. Finansiering av åtgärderna förutsätts ingå i mål och budget om det inte särskilt anges annat.

Investerings- och hyreskostnader för utredningsuppdrag är inte inkluderade i beräkningarna om det inte särskilt anges annat.

Investeringsbedömning

I lokalförsörjningsplanen redovisas investeringsbedömning för nya och tidigare beslutade åtgärder. Investeringsbedömningen inkluderar investeringar i kommunkoncernen, både för bolag och de fastigheter kommunstyrelsen äger. Beräknade fastighetsinvesteringar för den totala planperioden 2022–2031 beräknas uppgå till 6 210 miljoner kronor. Mindre lokalåtgärder i befintligt bestånd och underhållsåtgärder är inte inkluderat.

I tabellen nedan ingår även verksamhetsbundna investeringar i form av inventarier. Bedömningen är baserad på schabloner och syftar till att ge en indikation på den ekonomiska omfattningen för det som planeras i lokalförsörjningsplanen. En detaljerad investeringsplan, baserad på fastighetsägarens bedömningar för varje projekt, tas fram i samband med beslut om investeringsram i kommunens Mål och budget. Merparten av de lokalförändringar som ingår i planen ägs av Uppsala Skolfastigheter AB.

INVESTERINGSBEDÖMNING SKOLFASTIGHETER OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN								
Belopp i tusen kronor	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2031
Förskola	0	453 000	349 000	289 000	291 000	248 000	200 000	108 000
Grundskola	0	759 000	840 000	755 000	608 000	461 000	363 000	186 000
Gymnasieskola	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Summa fastighets-investeringar	0	1 227 000	1 189 000	1 044 000	899 000	709 000	563 000	294 000
Verksamhetsbunden investering	48 805	49 488	61 612	71 925	117 850	81 939	155 696	82 277
Totalsumma	48 805	1 291 488	1 250 612	1 115 925	1 016 850	790 939	718 696	376 277

Tabell 13. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och verksamhetsnära investering för nämnden i form av inventarier. Angivet i miljoner kronor. Investeringarna är inkluderade i processen för Mål- och budget 2022.

Investeringskostnaderna påverkas av att några nybyggnadsprojekt har senarelagts och flera grundskoleprojekt därmed skjutits framåt i tiden.

De verksamhetsbundna investeringarna avser inventarieanskaffningar i samband med lokalförändringar.

Hyreskostnad och verksamhetsekonomi

Hyra

Åtgärder i lokalförsörjningsplanen leder till förändrad hyra för utbildningsnämnden. I lokalförsörjningsplanen ingår ekonomiska konsekvenser på grund av ökad hyra för nybyggnation och nya moduluppställningar, ökad hyra för om- och tillbyggnation av befintlig fastighet samt ökad hyra på grund av renoveringar.

I planens beräkningar av befintliga samt tillkommande hyreskostnader har ingen uppskattning gjorts för kostnader för eventuellt tillkommande tilläggskontrakt för verksamhetsanpassningar. Ett antagande har gjorts om att tilläggskontrakten kommer ligga på en konstant nivå över åren och därmed inte påverka hyreskostnaderna mellan åren. Avveckling och återställningskostnad ingår inte i beräkningarna nedan.

Åtgärder i lokalförsörjningsplanen stäms kontinuerligt av i mål- och budgetprocessen.

HYRESKOSTNAD ¹								
Belopp i tusen kronor	Befintligt lokalbestånd 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2031
Förskola	179 703	200 686	213 885	223 065	241 494	270 439	308 748	321 327
Grundskola	360 825	374 594	402 799	411 279	460 404	547 927	600 787	651 186
Gymnasieskola	145 863	150 141	161 001	171 151	174 719	174 719	183 788	186 811
Total nämnd	686 391	725 421	777 685	805 495	876 618	993 085	1 093 322	1 159 324

¹ Hyreskostnaden är exklusive indexuppräknings

Tabell 14. Tabellen visar utbildningsnämndens totala hyreskostnad per år och fördelning per skolform. Hyreskostnader för tillkommande åtgärder är ungefärlig och beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner. Hyreskostnader för det som ligger som utredningsuppdrag i planen är inte inkluderade i beräkningarna. Hyrorna är inte inflationsuppräknade.

HYRESFÖRÄNDRING ¹								
Belopp i tusen kronor	Befintligt lokalbestånd 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2031
Förskola	179 703	20 982	13 199	9 180	18 430	28 945	49 448	1 440
Grundskola	360 825	13 769	28 205	8 480	49 125	87 523	72 241	31 018
Gymnasieskola	145 863	4 278	10 860	10 150	3 568	0	12 092	0
Total nämnd	686 391	39 029	52 265	27 810	71 122	116 468	133 780	32 458

1 Hyreskostnaden är exklusive indexuppräknings

Tabell 15. Tabellen visar hyresförändring per år för tidigare beslutade och tillkommande åtgärder per skolform och utbildningsnämndens totala kostnadsutveckling för planperioden 2022–2031. Siffrorna är ungefärliga och baserade på hyresindikationer och schabloner. Hyreskostnader för det som ligger som utredningsuppdrag i planen är inte inkluderade i beräkningarna.

De nybyggnationer, om- och tillbyggnationer, modullösningar och avvecklingar som planeras under perioden beräknas resultera i hyresökningar på 473 miljoner kronor för utbildningsnämnden fram till och med 2031, vilket motsvarar en ökning med cirka 69 procent i jämförelse med befintligt lokalbestånd 2021.

Hyreskostnadsökningen medför för alla skolformer en ökad hyreskostnad per barn och elev. För att minska denna effekt har åtgärder vidtagits av utbildningsnämnden under de senaste åren, bland annat genom att befintliga lokaler nyttjas effektivare. Trots ett effektivt lokalutnyttjande blir den hyreskostnaden ändå hög till följd av nuvarande kostnadsläge i nyproduktion.

Ekonomisk utblick

Kostnadsnivån i nyproduktion har stigit de senaste åren och riskerar att fortsatt ligga på en hög nivå i rådande byggkonjunktur. Om de åtgärder som planen omfattar ska klaras inom investeringsramen i Mål och budget ställs höga krav på en effektiv projekterings- och byggprocess.

Hyrorna inom utbildningsverksamheten har ökat under många år och tar idag en jämförelsevis stor del av den totala verksamhetsersättningen. I Mål och budget ges ett ägardirektiv till Uppsala kommun Skolfastigheter AB att tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva samt ändamålsenliga lokallösningar. Bolaget ska även ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror.

När helt nya förskolor och skolor planeras kan det finnas möjlighet att pröva nya koncept för en mer kostnadseffektiv byggprocess. Även om nya möjligheter realiserats kommer hyreskostnaden per barn fortsätta att öka i och med att andelen nya lokaler ökar i förhållande till befintliga lokaler med låg hyra.

Nyckeltal

HYRESKOSTNAD ¹ KRONOR/BARN eller ELEV ² , UTBILDNINGSNÄMNDEN								
Belopp i kronor	Befintligt lokalbestånd 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2031
Förskola	22 640	25 250	26 679	27 540	29 486	32 405	36 085	36 098
Grundskola	16 769	16 840	17 909	18 181	20 229	24 105	26 210	27 905
Gymnasieskola	21 677	22 174	23 253	23 353	23 108	22 380	23 368	23 498

¹ Nyckeltalen bygger på en hyreskostnad som är exklusive indexuppräknings

² Antal elever och barn utgår från befolkningsprognosen från 2021 års prognos. Antal barn i förskolan utgår ifrån ett antagande om en servicegrad på 89% samt att 65% går i kommunal verksamhet.

Tabell 16. Tabellen visar skolformernas hyreskostnad per barn eller elev. Hyreskostnaden är ungefärlig och beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner. Antal barn i förskolan utgår från ett antagande om en servicegrad på 89 procent samt att 65 procent går i kommunal verksamhet.

Fram till 2031 beräknas kostnad per barn inom förskola öka för varje år, totalt cirka 60 procent. Hyra per elev inom grundskola beräknas också öka för varje och cirka 66 procent för planperioden. För gymnasieskolan beräknas kostnad per elev öka fram till 2025 för att sedan minska under ett par år när elevtalen ökar.

KVADRATMETER/BARN eller ELEV ¹ , UTBILDNINGSNÄMNDEN								
Antal kvadratmeter	Befintligt lokalbestånd 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2031
Förskola	11,8	12,0	12,0	12,6	13,3	13,9	14,7	14,5
Grundskola	11,1	10,9	11,1	11,3	12,0	13,3	14,0	14,5
Gymnasieskola	12,5	12,7	13,0	12,8	12,5	12,1	12,5	12,5

¹ Antal elever och barn utgår från befolkningsprognosen från 2021 års prognos. Antal barn i förskolan utgår ifrån ett antagande om en servicegrad på 89% samt att 65% går i kommunal verksamhet.

Tabell 17. Tabellen visar antalet kvadratmeter per barn och elev. Lokalarean anger arean av de rum och utrymmen som används för att bedriva själva verksamheten. Förändrade kvadratmeter viktas utifrån vilken termin som åtgärden färdigställs.

Antalet kvadratmeter lokalarea per barn och elev beräknas öka i slutet av planperioden för förskola och grundskola. Det beror på att de projekt som förväntas bli klara inte helt fylls med barn /elever de första åren. Inom gymnasieskolan beräknas lokalarea per elev vara som störst år 2023, men nästan densamma för åren 2027 – 2031 som 2021.

I förskolan är lokalarean i befintliga lokaler 11,8 kvm per barn. Tillkommande projekt har i snitt en lokalarea per barn på 10,5 kvm.

HYRESKOSTNAD ¹ KRONOR/KVADRATMETER UTBILDNINGSNÄMNDEN								
Belopp i kronor	Hyreskostnad 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027-2028	Prognos 2029-2031
Förskola	1 913	2 112	2 218	2 186	2 219	2 324	2 456	2 485
Grundskola	1 511	1 550	1 613	1 615	1 686	1 808	1 876	1 929
Gymnasieskola	1 730	1 747	1 786	1 831	1 854	1 854	1 871	1 876

¹ Nyckeltalen bygger på en hyreskostnad som är exklusive indexuppräkning

Tabell 18. Tabellen visar skolformernas hyreskostnad per kvadratmeter. Hyreskostnaden är ungefärlig och beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner.

Hyreskostnaden per kvadratmeter lokalarea beräknas öka inom alla skolformer under de kommande åren, detta till följd av höga produktionskostnader för nya lokaler.

Bilaga 1 – Förskola och grundskola, områdesbeskrivning

Områdesbeskrivningarna innehåller information gällande förskola och grundskola nedbruten på lokalförsörjningsområden. Information som anges är vilka befintliga enheter som finns i området, nya åtgärder, pågående och redan beslutade åtgärder, utredningsuppdrag och en utblick med områdets planerade bostadsutveckling.


Utöver de åtgärder som redovisas områdesvis finns även en åtgärd som inte är beslutad till något lokalförsörjningsområde ännu: moduluppställning eller utökning i andra lokaler, 200 platser i grundskola.

Utredningsuppdragens tidssättning påverkas av bostadsbyggnation, pågående program- och planarbeten samt andra pågående projekt. Tidssättningen kan därför komma att ändras.

- Bälinge – Björklinge
- Centrala staden – Fålhagen
- Gunsta – Länna – Almunge – Knutby
- Gåvsta – Stavby – Tuna
- Luthagen – Stenhagen
- Norby – Eriksberg – Flogsta
- Ramstalund – Vänge – Järlåsa
- Sala backe – Årsta – Vaksalabygden
- Storstora – Vattholma - Skyttorp
- Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala
- Sävja – Bergsbrunna – Danmark
- Valsätra – Gottsunda - Sunnersta

Bälinge – Björklinge

Börje – Jumkil – Åkerlänna

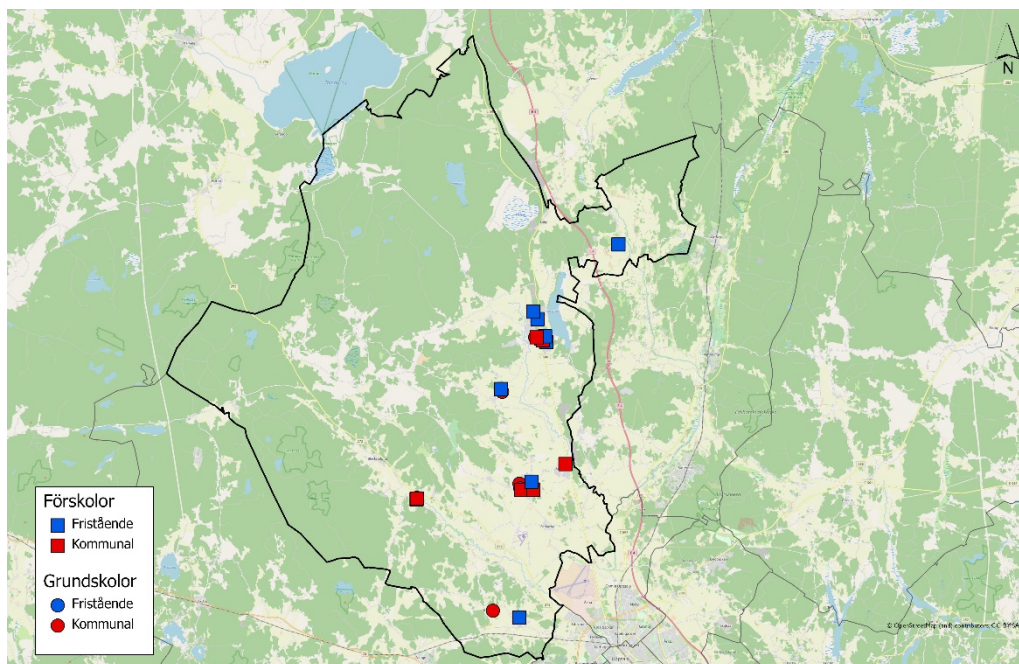

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg - kommunal

Björklinge familjedaghem
Bälingeby förskola
Jumkils familjedaghem
Jumkils förskola
Klockarbols förskola
Lövstalöts förskola
Ramsjö förskola
Åkerlänna familjedaghem

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående

Barnasinnets förskola
Björkängens förskola (LiCA)
Björklinge förskola
Börjans förskola
Hagmarkens förskola
Förskolan VillaLära
Lill-Skutts Förskola
Lundevall, Himmel & Pannkaka
Skrindans förskola
Skuttungarna
Solstugans förskola

Grundskola - kommunal


Björklinge skola
Björkvallsskolan
Bälinge skola
Börje skola
Jumkils skola
Skuttunge skola

Grundskola - fristående

Hagmarkens Skola


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

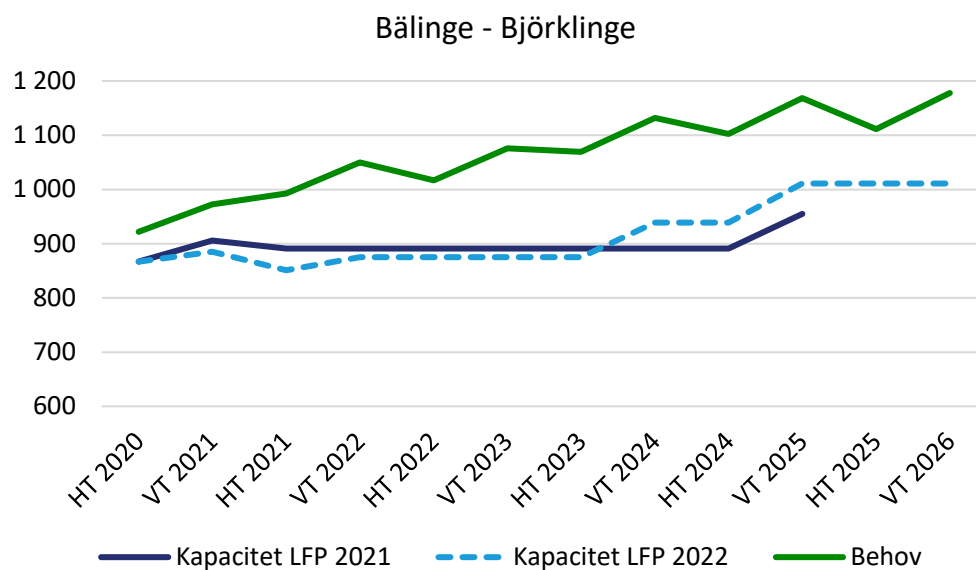

Figur 15. Kapacitet och behov i Bälinge-Björklinge för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021

Grundskola

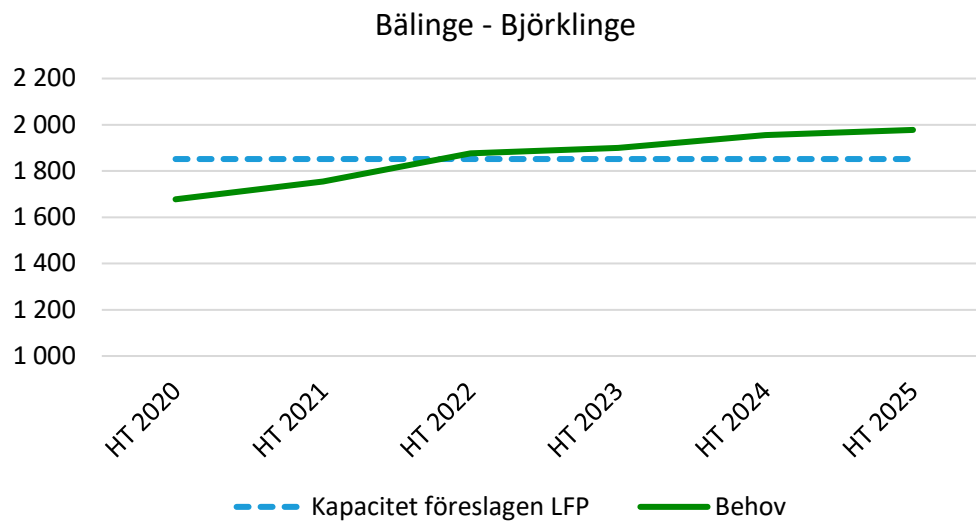

Figur 16. Kapacitet och behov i Bälinge-Björklinge för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Björklinge	Ny förskola, 72 – 144 platser. Preliminär tidsplan.												
											+108		
Totalt											+108		

Tabell 19. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Björkwallsskolan	Renovering, ev utökning genom ombyggnad. Etappvis evakuering till moduler krävs. Preliminär tidsplan för färdigställande.							
					X			
Totalt								

Tabell 20. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. X = osäker kapacitetsförändring.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Bälingeby förskola	Moduluppställning ersätts och utökas med permanent förskola. Ny kapacitet 144 platser. Evakuering till nya moduler HT22.												
					+72		+72						
Lövstalöts förskola	Moduluppställning ersätts med permanent förskola.												
		+/-0											
Totalt		+/-0			+72								

Tabell 21. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Bälinge skola	Ny skola på samma fastighet. Ny kapacitet 630. Evakuering krävs.							
					+140			
Totalt					+140			

Tabell 22. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Utökning av förskoleplatser i Björklinge.	Pågår
Utbyggnation av Björklinge skola.	2022
Utbyggnation av Björkvalsskolan.	2022
Nya förskolor i Bälinge. Ev. inhyrningar.	2022
Ny grundskola i Bälinge.	2022

Tabell 23. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.


Utbyggnadsplaner

Björklinge respektive Bälinge/Lövstalöt är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 300 respektive 700 till och med år 2050.

Planarbete pågår för fler bostäder Bälinge och i Lövstalöt samt i Björklinge. Utbyggnaden i området kommer att leda till ett behov av fler förskole- och grundskoleplatser.

Centrala staden – Fålhagen

Kungsängen – Boländerna

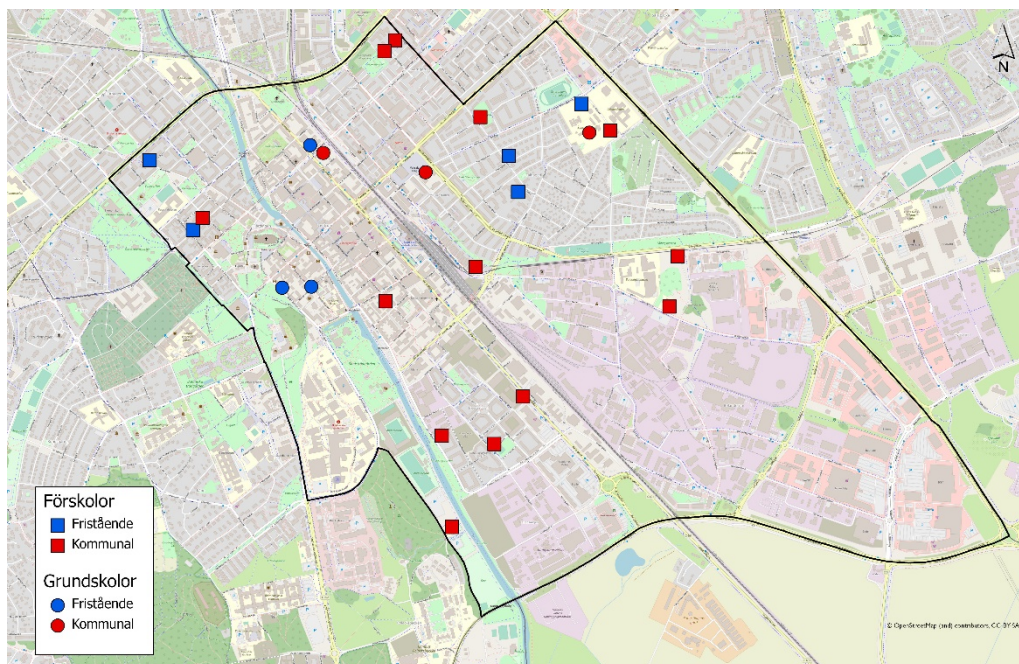

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Boländernas förskola
Botulvs förskola
Frodeparkens förskola
Fålhagsledens förskola
Gudruns förskola
Höganäs förskola
Kungsängens förskola
Petterslunds förskola
Sten Stures förskola
Tallens förskola
Årikets förskola
Åsiktens förskola
Öfre Slotts förskola

Grundskola – kommunal

Almtunaskolan
Nannaskolan
Vaksalaskolan

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående


Barnhagens förskola
Björkhagens förskola
Iors förskola
Lilla Academia 3
Plantans förskola
Vildrosens förskola

Grundskola – fristående

Katarinaskolan
Magelungen Uppsala
Raoul Wallenbergskolan


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

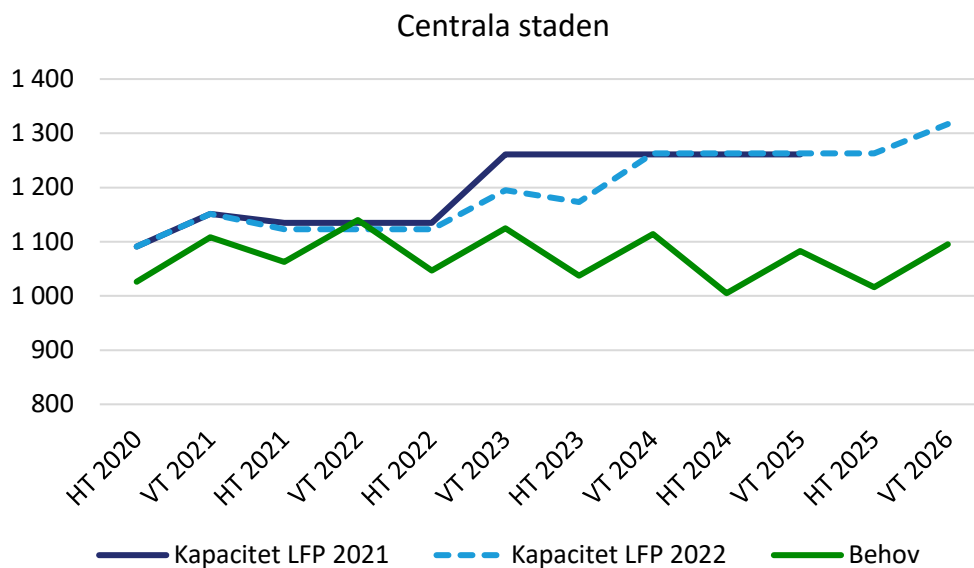

Figur 17. Kapacitet och behov i Centrala staden för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

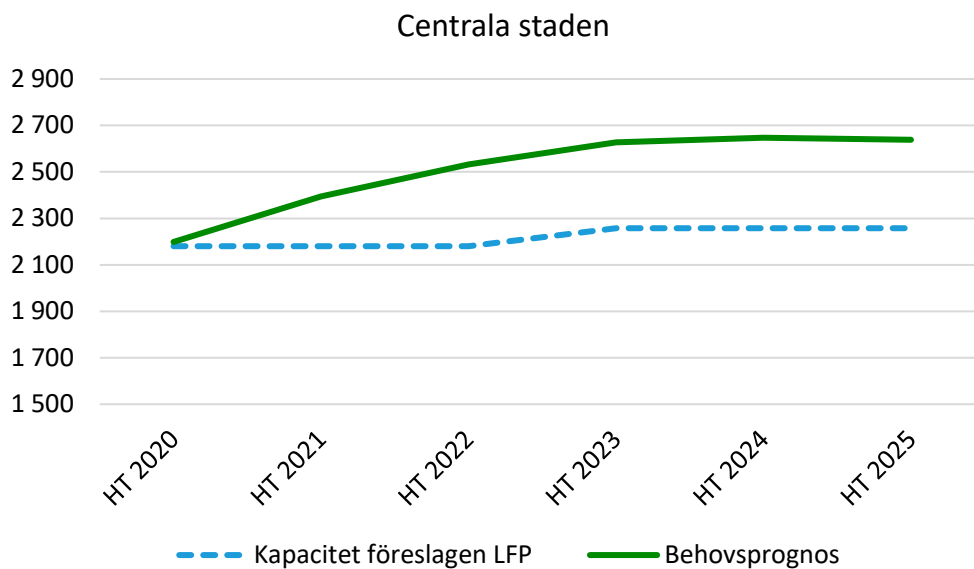

Figur 18. Kapacitet och behov i Centrala staden för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Sten Stures förskola	Permanent ersättning av moduluppställning inom Polacksområdet. 72 platser flyttas från området Centrala staden – Fålhagen. Ny kapacitet 144 platser i området Norby – Eriksberg – Flogsta.												
											+72 - 72		
Öfre Slotts förskola	Förskolan läggs ner.												
				-22									
Totalt				-22							+72 -72		

Tabell 24. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Almtuna förskola	Ersätter Tallens modulförskola inom Almtuna skolområde. Ny kapacitet 144 platser.												
			+54		+54								
Botulvs förskola	Renoveras. Evakuering krävs, preliminärt till Tallens modulförskola 2024.												
							+/-0						
Kv Hugin	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.												
											+72		
Norra Hovstallängen	Ny förskola i kvarteret Hovstallängen. Inhyrning. 144 platser.												
										+144			
Skytteln förskola	Ny förskola i kvarteret Skytteln. 72 platser.												
			+72										
Totalt			+72		+54					+144	+72		

Tabell 25. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. Förskolorna i kvarteret Ångkvarnen har lyfts ur planen eftersom de kommer att drivas i fristående regi.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2029	2030- 2031
Almtunaskolan	Renoveras samt utökas till 720 platser. Evakueras in i Brantingskolan 2023. Ny skola färdig 2026							
		+90						
Norra Hovstallängen	Ny grundskola Kungsängen. 780 platser							
					+780			
Totalt		+90			+780			

Tabell 26. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar


Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Permanent ersättning av Fålhagsledens moduler.	2022

Tabell 27. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Utbyggnadsplaner

Nybyggnation av bostäder i Centrala staden – Fålhagen sker främst genom utveckling av Kungsängen, kvarteret Hugin och viss förtätning i andra delar. Ytor i området är begränsat och behov som uppkommer av de nya bostäderna kan behöva tillgodoses på annan plats.

Gunsta – Länna – Almunge – Knutby

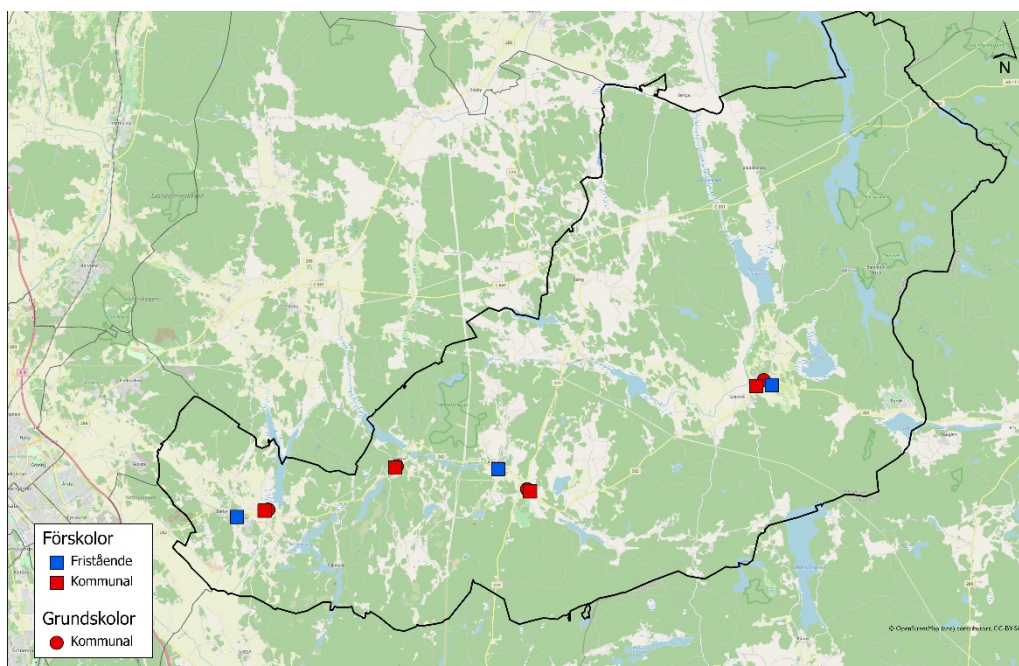

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Almunge förskola
Funbo förskola
Lustigkullens förskola
Länna förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående


Bullerbyns förskola
Ekoxens dagbarnvårdare Funbo
Kråkskogens förskola
Sjumilaskogens förskola
SMART pedagogisk omsorg

Grundskola – kommunal

Almunge skola
Funbo skola
Knutby skola
Länna skola


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

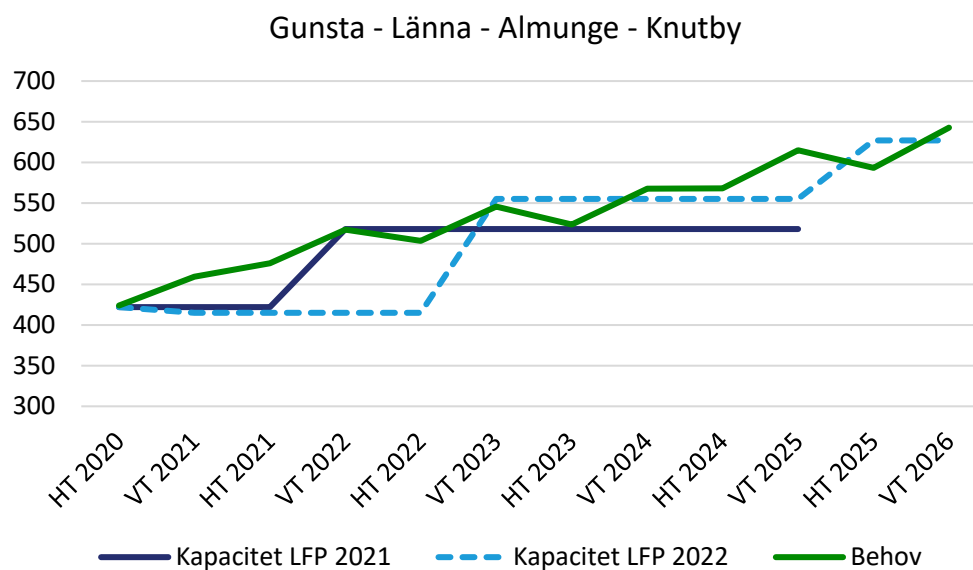

Figur 19. Kapacitet och behov i Gunsta - Länna - Almunge - Knutby för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

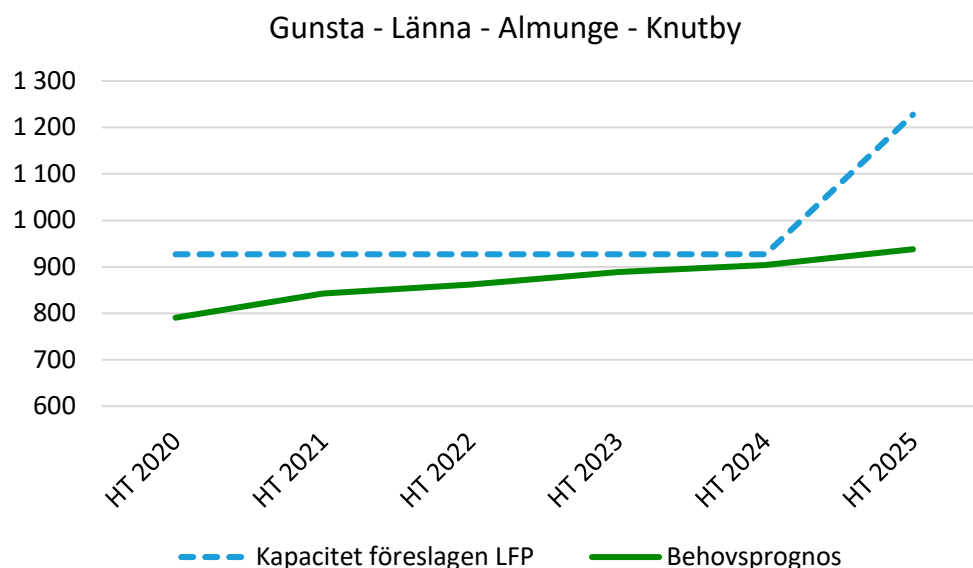

Figur 20. Kapacitet och behov i Gunsta - Länna - Almunge - Knutby för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Södra Gunsta, etapp 2	Ny förskola, ersätter den tillfälliga förskolan i grundskolan, 72 platser. Preliminär tidsplan.												
												+72	
Totalt												+72	

Tabell 28. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Gunsta	Ny förskola. Inledningsvis i skolan. 72 platser.												
								+72				-72	
Länna	Ny förskola tillsammans med ny grundskola. Ev. inhyrning. 72 platser. Preliminär tidsplan.												
										+72		+72	
Totalt								+72				+/-0	

Tabell 29. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Gunsta	Ny grundskola, kapacitet 630. Inledningsvis med förskola i del av skolan.							
				+390			+240	
Länna	Ny grundskola i Länna tillsammans med förskolan med upp till 420 platser. Preliminär tidsplan.							
					+340		+340	
Totalt				+390			+580	

Tabell 30. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar


Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Ytterligare förskole- och grundskoleplatser i Almunge.	Pågår
Ny förskola i Gunsta.	2023
Ny grundskola i Gunsta.	2023

Tabell 31. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Utbyggnadsplaner

Gunsta, Länna, Almunge och Knutby är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara cirka 2 500 för hela stråket. Utbyggnad har påbörjats i Södra Gunsta där det totalt planeras för ett tillskott om cirka 1 000 – 1 500 bostäder och ytterligare social infrastruktur. Detaljplanearbete pågår i Länna inklusive förskola, grundskola och idrottshall. Utveckling planeras även i Almunge och Marielund.

Gåvsta- Stavby – Tuna

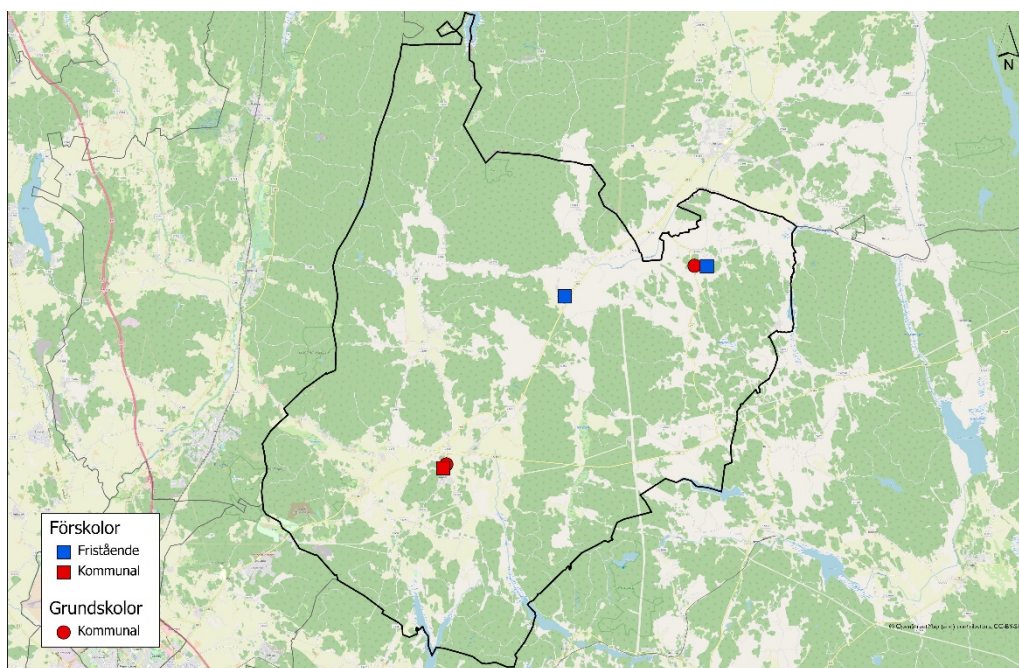

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Gåvsta förskola
 Rasbo familjedaghem
 Rasbokil familjedaghem
 Tuna familjedaghem

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående


Smulans förskola
 Tunabarnens förskola

Grundskola – kommunal

Gåvsta skola
 Stavby skola
 Tuna skola


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

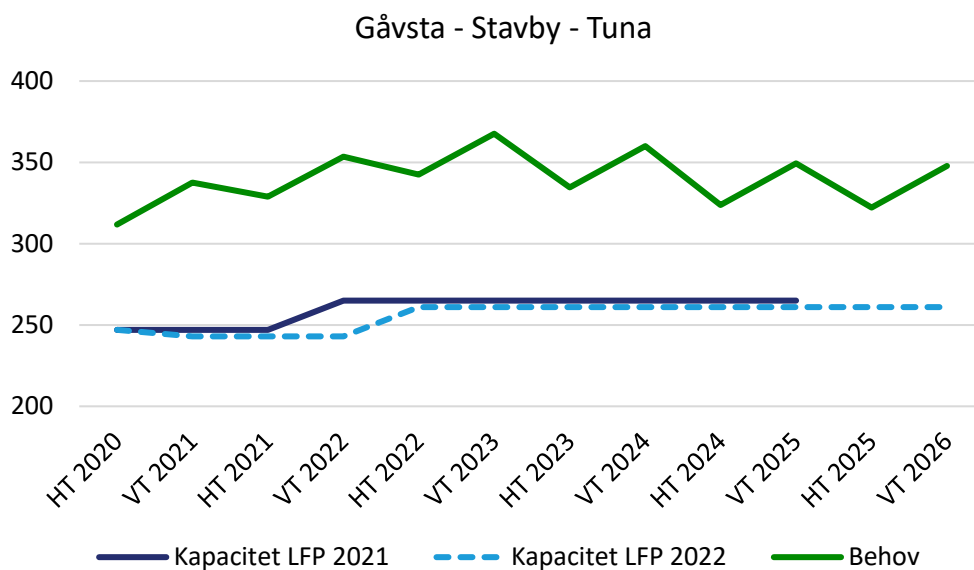

Figur 21. Kapacitet och behov i Gåvsta-Stavby – Tuna för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

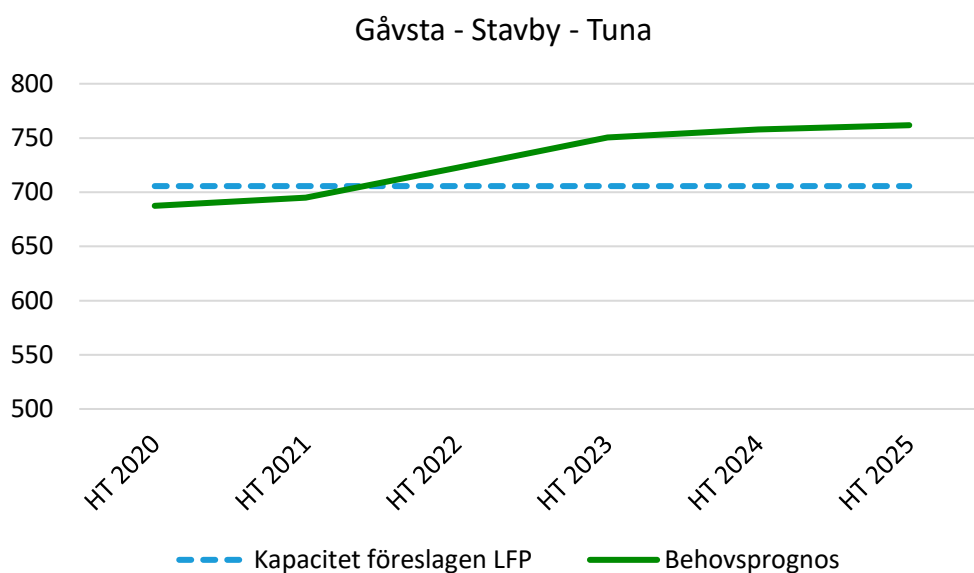

Figur 22. Kapacitet och behov i Gåvsta-Stavby – Tuna för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

-

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Gåvsta förskola	Permanent ersättning av moduler. Evakuering till nya moduler 2022. Ny förskola klar HT26, kapacitet 144 platser.												
	+18									+/-0			
Totalt	+18									+/-0			

Tabell 32. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Gåvsta skola	Permanent ersättning av moduluppställning. Ev. utökning av antalet elevplatser.							
						+/-0		
Totalt						+/-0		

Tabell 33. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Renovering av Tuna skola. Evakuering krävs.	2022


Tabell 34. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Utbyggnadsplaner

Gåvsta är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 150 stycken.

Luthagen – Stenhagen

Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo

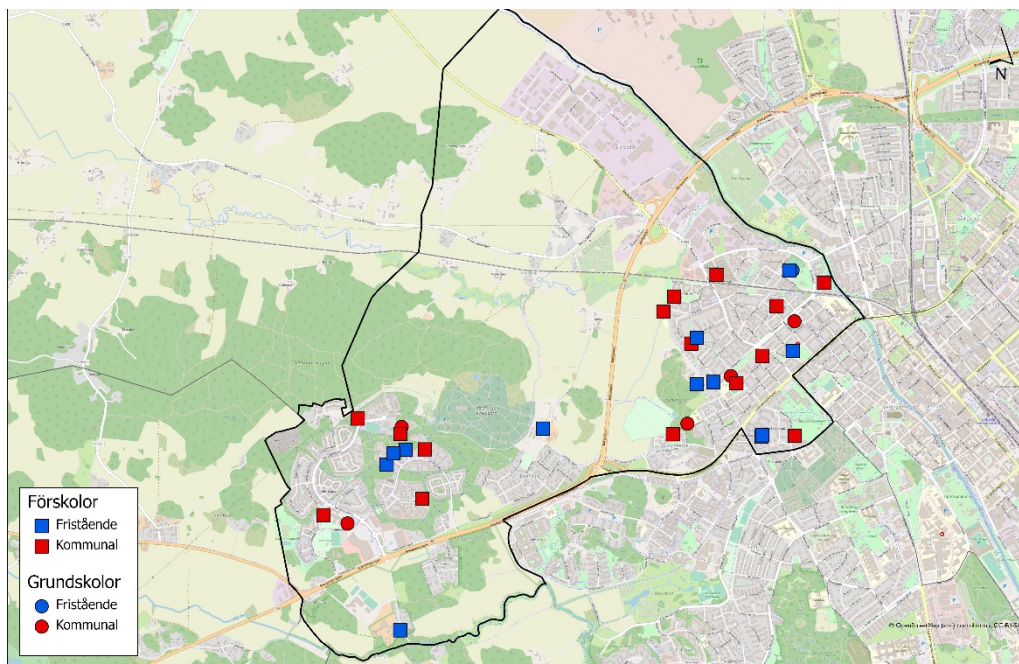

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Bergabiten förskola
Brune förskola
Fyrisvallens förskola
Gjutformens förskola
Hällby förskola
Karlavagnens förskola
Kims förskola
Kullerstenens förskola
Luthagens familjedaghem
Luthagens förskola
Opalens förskola
Stenhällens förskola
Stenrösets förskola
Tiunda förskola
Tullmästarens förskola
Västra Stenhagens förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Barnbitens förskola
Glinets förskola
Lyktans förskola
Norlandia förskolor - Seminariet
Nyponets förskola
Rackarungen kooperativ
Röda Stugans förskola
Sagaskogens förskola
Solrosens förskola
Stabby Montessoriförskola
Stentrollens familjedaghem 1
Stentrollens familjedaghem 2
Stentrollens familjedaghem 3
Stjärnans förskola
Svanens förskola

Grundskola – kommunal


Eriksskolan
Sverkerskolan
Tiundaskolan
Västra Stenhagenskolan
Östra Stenhagenskolan

Grundskola – fristående

Uppsala Musikklasser


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

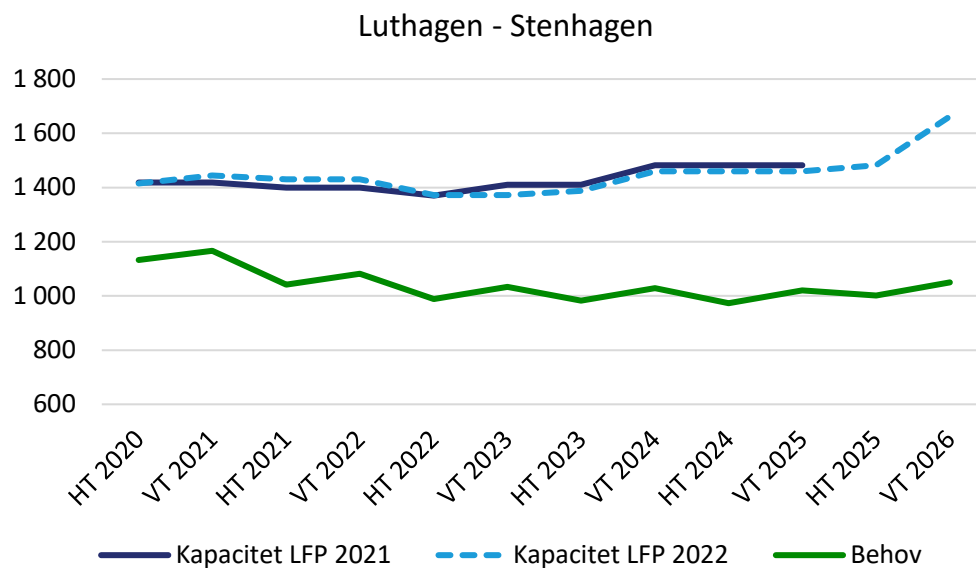

Figur 23. Kapacitet och behov i Luthagen – Stenhagen för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

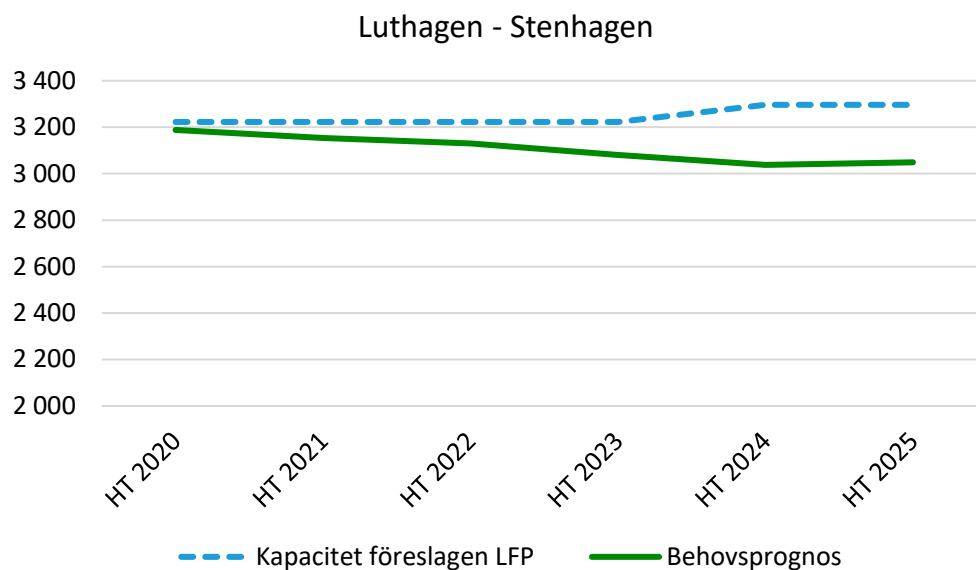

Figur 24. Kapacitet och behov i Luthagen – Stenhagen för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Hällby förskola	Permanent ersättning av moduluppställning, 144 platser.												
											+/-0		
Kuller- stenens förskola	Förskolan läggs ned, lämnar lokaler vilket möjliggör utvidgning av grundskolan.												
				-54									
Totalt				-54							+/-0		

Tabell 35. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Östra Stenhagenskolan	Utökning när Kullerstenens förskola lämnar, +90 platser. Ny kapacitet 600 platser.							
			+90					
Totalt			+90					

Tabell 36. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Börjetull/ Librobäck	Ny förskola 144 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.												
									+144				
Börjetull/ Librobäck	Ny förskola 72 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.												
													+72
Börjetull/ Librobäck	Ny förskola 36 platser, ev inhyrning. Preliminär tidsplan.												
											+36		
Hällby förskola	Tidigare beslutad kapacitetsminskning genomförs inte.												
Karlavagnens förskola	Befintlig förskola rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet 72 platser. Evakuerade till Hemmings förskola.												
			+22						+22				
Luthagens förskola	Renovering. Evakuering till Tiunda förskola, HT22.												
				+/-0	+/-0								
Rackarbergets förskola	Ny förskola, inhyrning. Ny kapacitet 72 platser.												
					+72								
Stenhagens öppna förskola	Ersättning för Stenhagens öppna förskola. Tillbyggnad vid Västra Stenhagens förskola.												
			×	X									
Västra Stenhagens förskola	Utökning, koordineras med öppna förskolan. Ny kapacitet 54 platser.												
				+18									
Totalt				+18	+72				+166		+36		+72

Tabell 37. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

X = öppna förskolor har inte några inskrivna barn.

En utav tidigare beslutade förskolor i Börjetull/Librobäck har lyfts ur planen eftersom den kommer att drivas i fristående regi.

Utredningar


-

Utbyggnadsplaner

I området planeras framför allt utveckling ske kopplat till Librobäck – Börjetull, både med bostäder och verksamheter. I detaljplan för Börjetull finns fyra förskolor. Viss förtätning av bostäder sker i andra delar av området. Mark har reserverats på Stabbyfältet för utbyggnad av förskola, skola och idrottsanläggningar.

Norby – Eriksberg – Flogsta

Kåbo – Ekeby - Rosendal – Polack – Håga

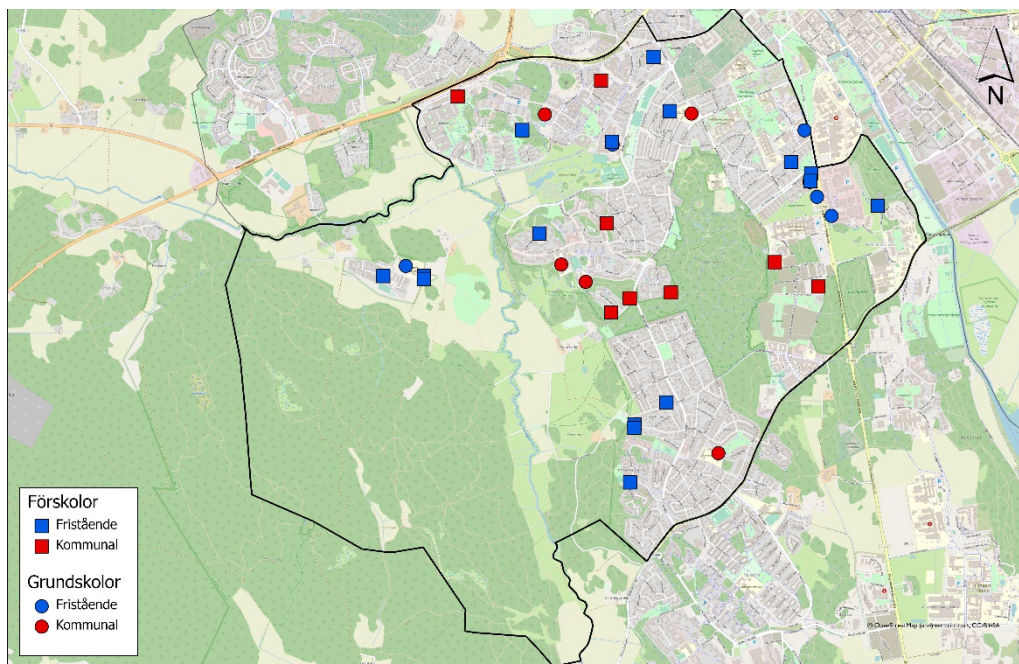

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg - kommunal

Diabasens förskola
Flogsta förskola
Glimmerns förskola
Grindstugans förskola
Kåbo familjedaghem
Rosendals förskola
Silikatets förskola
Täljstenens förskola
Voksenåsens förskola

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående

Berga Montessoriförskola
Förskolan Da Vinci
Diamantens Förskola
Ekeby förskola
Förskolan Näktergalen -
Uppsala Waldorfförskola
Förskolan Tittut
Förskolan Småfolket
– I ur och skur
Grannbarnens förskola
Gluntens Montessoriskola

Humlans förskola

Jensen förskola

Lingonbackens förskola

Liten Lär, småbarnsskola

Myggans förskola

Norlandia förskolor

- Karlsro

Kåbo föräldrakooperativ

Kåbo ängars förskola

Rosengårdens

Waldorfförskola

Uppsala Montessoriförskola

Grundskola – kommunal


Bergaskolan
Eriksbergsskolan
Flogtaskolan
Hågaladsskolan
Malmaskolan
Rosendals skola

Grundskola – fristående

Gluntens Montessoriskola
JENSEN grundskola Uppsala
Kunskapsskolan Uppsala
Kunskapsskolan Uppsala -Norra
Uppsala Enskilda skola
Uppsala Waldorfskola


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

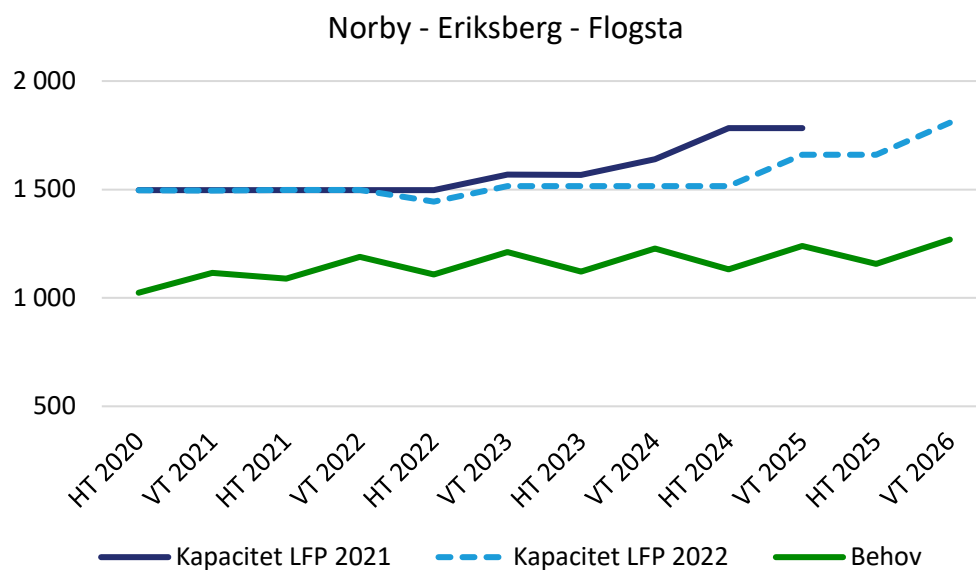

Figur 25. Kapacitet och behov i Norby – Eriksberg – Flogsta för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

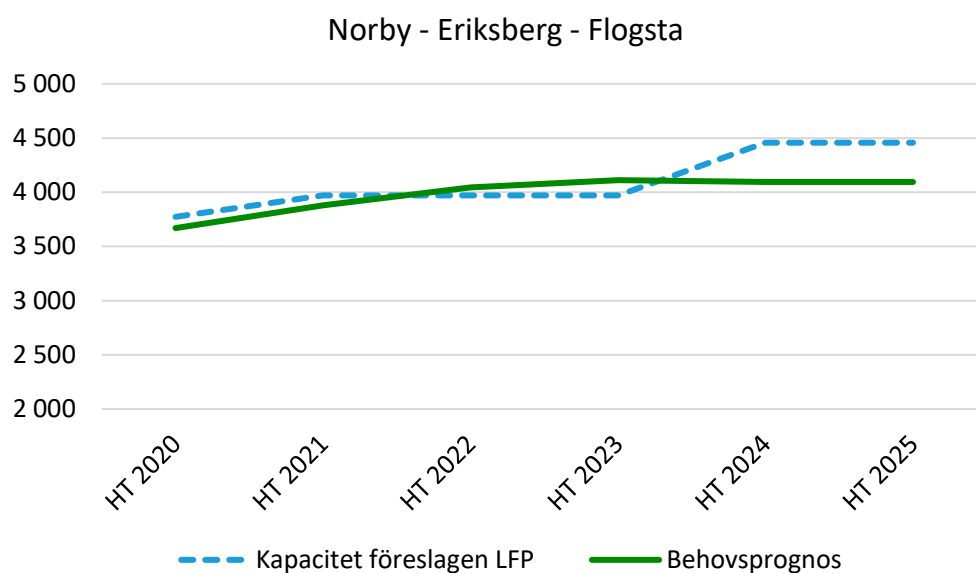

Figur 26. Kapacitet och behov i Norby – Eriksberg – Flogsta för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Silikatets förskola	Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakueras till Rosendals förskola 2022. Ny kapacitet preliminärt 108 platser.												
											+54		
Sten Sture	Ny förskola inom Polacksområdet. Platserna flyttas från lokalförsörjningsområdet Centrala staden – Fålhagen. Ny kapacitet 144 platser.												
											+144		
Totalt											+198		

Tabell 38. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Glimmerns förskola	Ersätts samt utökas. Evakuering krävs. Ny kapacitet 144 platser.												
							+72						+72
Hammar-parken	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.												
									+72				
Kullens förskola	Ny förskola. Ny kapacitet 108 platser.												
									+108				
Rosendal Etapp 4	Ny förskola, ersätter Rosendals förskola (moduler). Kapacitet 144.												
			+/-0										
Silikatets förskola	Renovering. Evakuering krävs. Tidsplan ej fastställd. Ny åtgärd enligt ovan.												
Stadsskogens förskola (Rosendal Etapp 5)	Ny förskola. 144 platser.												
							+144						
Trollskogens förskola (Rosendal Etapp 5)	Ny förskola. 72 platser.												
			+72										
Totalt			+72				+216		+180				

Tabell 39. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2029	2030- 2031
Eriksbergsskolan/ Hågalsskolan	Renoveras och utökas. Evakuering krävs.							
							+400	
Flogtaskolan	Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakueras 2025							
					+200			
Nya Rosendalsskolan	Ny grundskola. 750 platser							
			+540					
Totalt			+540		+200		+400	

Tabell 40. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar


Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Renovering och/eller utbyggnad av befintliga förskolor inom planarbetet för Eriksberg.	Pågår
Ytterligare förskola i Rosendal etapp 4.	2022

Tabell 41. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Utbyggnadsplaner

Stadsdelen Eriksberg och Ekebydalen planeras att utvecklas och även den sociala infrastrukturen i området. Utbyggnaden i området kommer att leda till ett behov av fler förskole- och grundskoleplatser.

Ramstalund – Vänge – Järlåsa

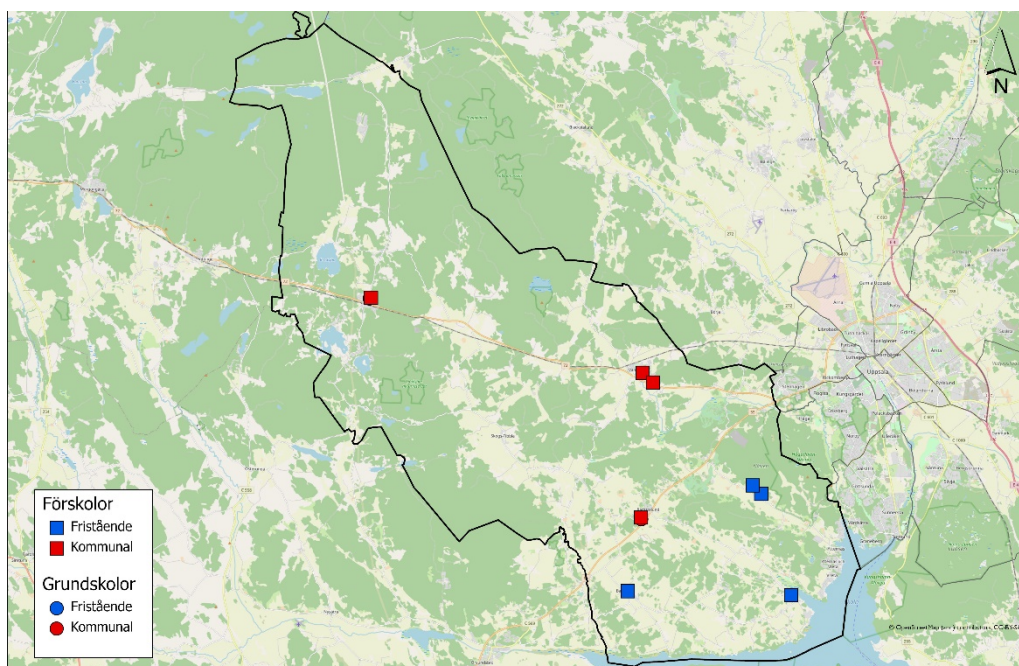

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Arkitektens förskola
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda
Järlåsa förskola
Ramsta förskola
Vänge förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående


Bytorgets förskola
Dalby hage förskola
Föräldrakooperativet Balingsta förskola
Näsdalens förskola
Vreta näs förskola

Grundskola – kommunal

Järlåsa skola
Ramsta skola
Vänge skola


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

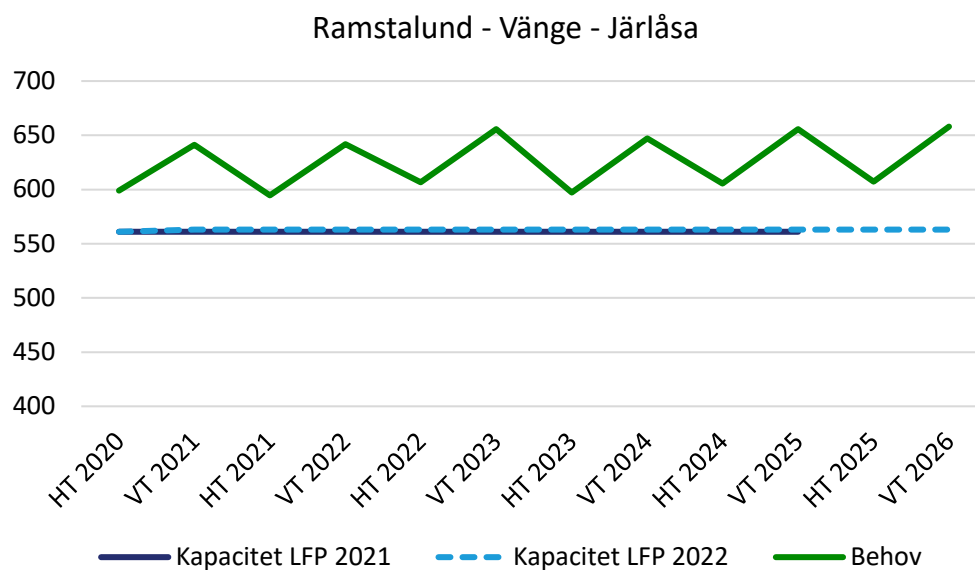

Figur 27. Kapacitet och behov i Ramstalund – Vänge – Järlåsa för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

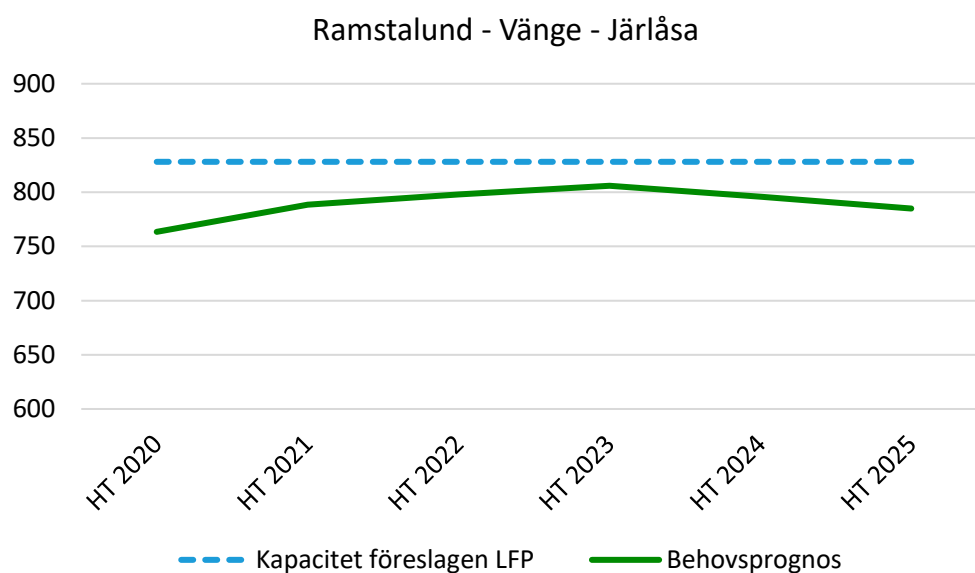

Figur 28. Kapacitet och behov i Ramstalund – Vänge – Järlåsa för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

-

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Arkitektens förskola	Permanent ersättning för moduluppställning. Kapacitet 72 platser.												
						+/-0							
Järlåsa förskola	Permanent ersättning för moduluppställning. Evakuering till nya moduler 2022. Ny förskola klar VT24. Kapacitet 72 platser.												
					+/-0								
Totalt					+/-0	+/-0							

Tabell 42. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Järlåsa	Nybyggnation av kök och matsal i samband med nybyggnation av förskola. Ev. utökning.							
			+/-0					
Totalt			+/-0					

Tabell 43. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Ny förskola i Vänge.	2023


Tabell 44. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Utbyggnadsplaner

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 50–900 i Vänge och 20 stycken i Järlåsa till och med år 2050. Samlad bebyggelse kan också till komma i Ramstalund.

Salabacke – Årsta – Vaksalabygden

Fyrislund - Slavsta – Lindbacken

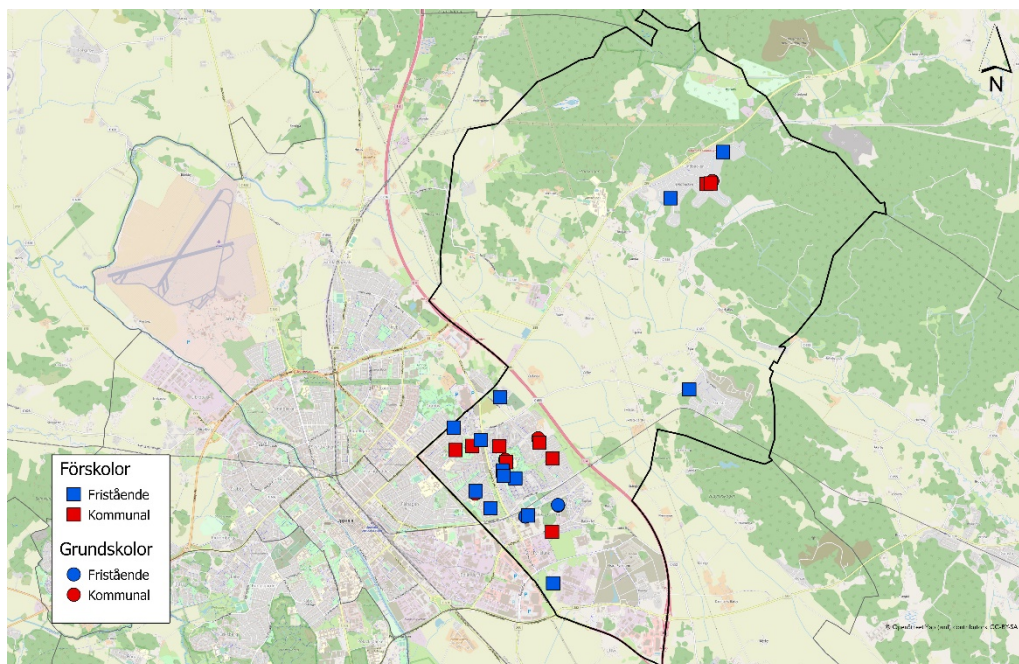

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Axelina förskola
Kamomillens förskola
Källparkens förskola
Lindens förskola
Salabacke förskola
Slavsta förskola
Skogstorpets förskola
Årstaparkens förskola
Äppellundens förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Boklundens förskola
Ekoxen dagbarnvårdare
Vaksala
Estia förskola
Fasanens förskola
Färgkritans familjedaghem
Kastanjens Montessoriförskola
Kunskapsförskolan, Skölsta
Lilla Academia 1
Lilla Academia 4

Norlandia förskolor

Uppfinnaren
Norlandia förskolor
Upplevelsen
Norlandia förskolor
Upptäckten
Prästgårdens förskola
Rödmyrans förskola
Tellusbarn Sparrisen

Grundskola – kommunal


Johannesbäcksskolan
Lindbackens skola
Palmbladsskolan
Ångelstaskolan
Årsta skolan

Grundskola – fristående

Imanskolan
Ansgarskolorna; Kyrkskolan, Källskolan och
Trädgårdsskolan


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

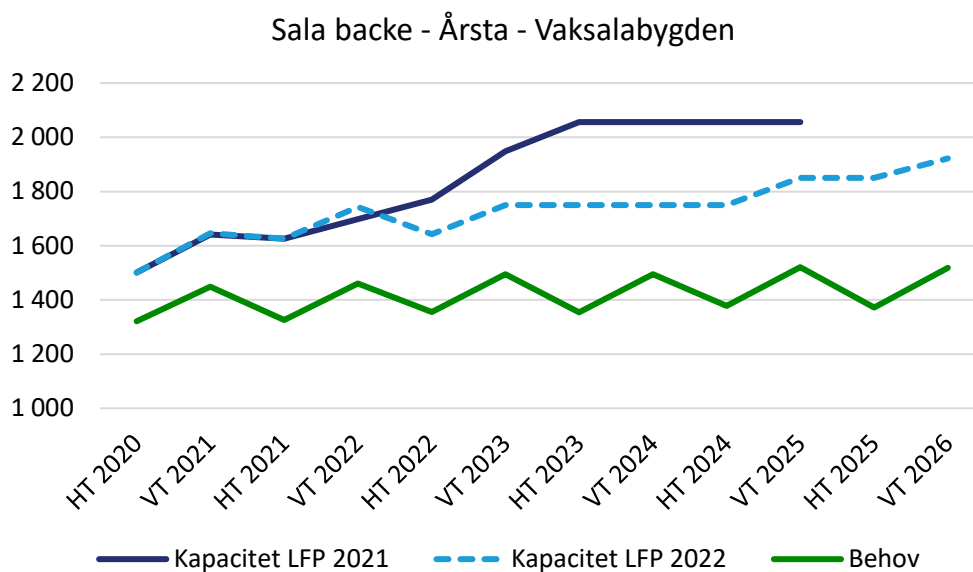

Figur 29. Kapacitet och behov i Salabacke – Årsta – Vaksalabygden för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

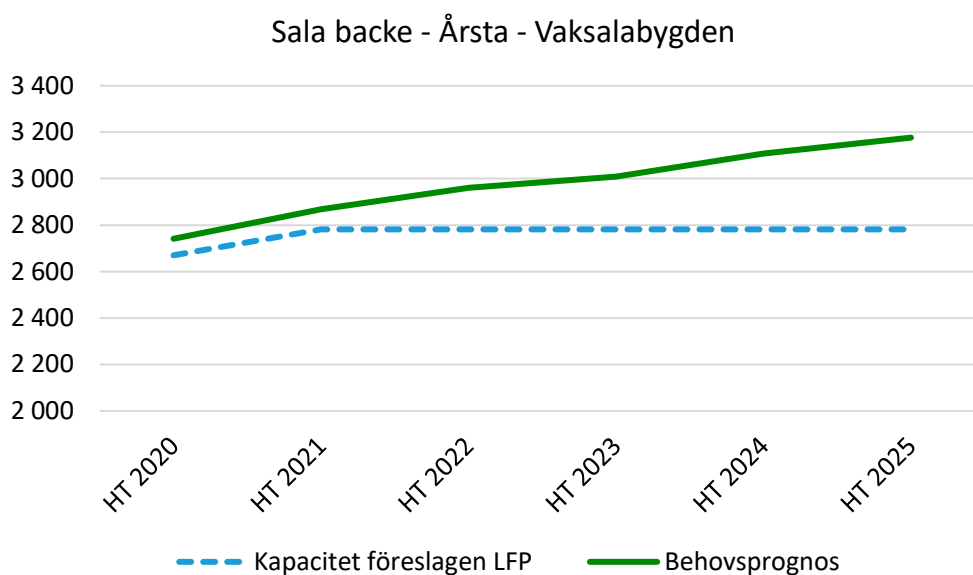

Figur 30. Kapacitet och behov i Salabacke – Årsta – Vaksalabygden för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Källparkens förskola	Förskolan rivs, ersätts och utökas. Evakuering krävs. Ny kapacitet oklar. Preliminär tidsplan.												
											X		
Totalt													

Tabell 45. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Axelina förskola	Moduluppställning avvecklas och ersätts i Östra Salabacke (tidigare beslut: Vaksala kyrkskola).												
		-72	-72										
Källparkens förskola	Befintlig förskola renoveras eller ersätts. Ev. utökning. Evakuering krävs HT22. Ny åtgärd enligt ovan.												
Lindbackens förskola	Ny förskola. Permanent ersättning för Lindens förskola i grundskolan. 144 platser												
	+144	+144											
Lindens förskola	Förskolan lämnar grundskolans lokaler och flyttar in i ny permanent förskola.												
	-72	-72											
Östra Salabacke	Ny förskola som ersätter Axelinas moduler. Inhyrning. Kapacitet +/- 0.												
	+72	+72											
Skölsta	Ny förskola, inhyrning. 108 platser.												
			+108										
Vaksala kyrkskola	Ny förskola. Ersätter och utökar Axelina förskola. Ny kapacitet 144 platser. Åtgärd utgår eventuellt.												
			+144										
Årsta Pilparken	Ny förskola. 72-144 platser.												
										+108		+108	
Östra Salabacke	Ny förskola som ersätter Axelinas moduler. Inhyrning. Kapacitet +/- 0.												
	+72	+72											
Östra Salabacke Etapp 3	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.												
									+72				
Östra Salabacke Etapp 4	Ny förskola. 72 platser. Ev inhyrning.												
												+72	
Totalt	+72	+/-0	+108						+72			+180	

Tabell 46. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2029	2030- 2031
Brantingskolan	Nybyggnation på befintlig skoltomt. Används som evakueringsskola för Almtunaskolan från 2023 till 2026. Total kapacitet 720.							
					+720			
Lindbackens skola	Förskolan lämnar lokaler till skolan. Total kapacitet 600.							
	+100							
Årstaskolan	Moduluppställning avvecklas.							
					-125			
Årstaskolan	Utökning. Total kapacitet 990. Efter 2031							
							+600	
Totalt	+100				+595			

Tabell 47. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Ytterligare förskoleplatser i Skölsta	Bevakas

Tabell 48. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.


Utbyggnadsplaner

Byggnationen och utvecklingen av Östra Sala backe fortgår. Planer finns även för viss förtätning i andra delar av området, exempelvis kring Brantingstorg.

Jälla är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 450–1 300 till och med år 2050.

Även Lindbacken och Skölsta planeras för fortsatt utbyggnad.

Storvreta – Vattholma – Skyttorp

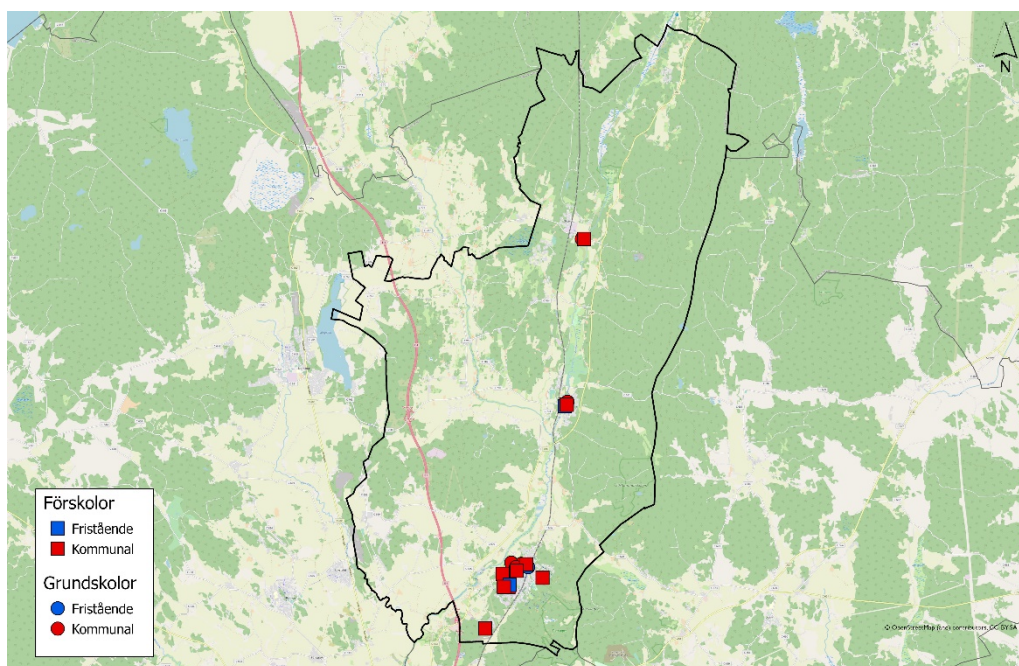

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Astrakanens förskola
Fullerö förskola
Himmelsvägens förskola
Lyckebo förskola
Malmvågens förskola
Molnets förskola
Skogsbackens förskola
Skyttorps förskola
Vretens förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Ekoxen dagbarnvårdare Storvreta
Förskolan Majgården
Hyttans förskola
I Ur och Skur Pinneman
Nya Skyttorpskottarna

Grundskola – kommunal


Pluggparadiset
Skyttorps skola
Storvretaskolan
Vattholmaskolan
Ärentunaskolan

Grundskola – fristående

Livets Ords Kristna Skola Fridhemsskolan


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

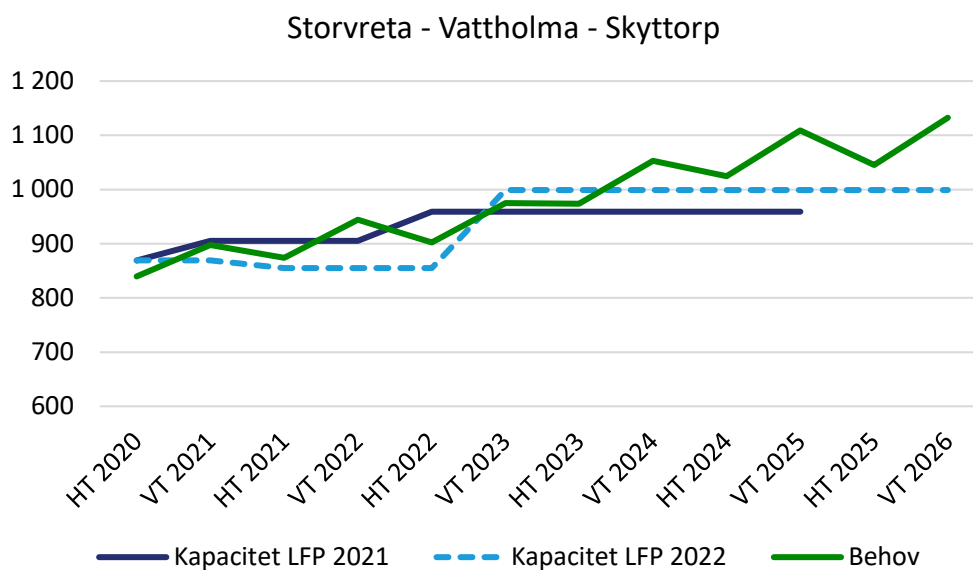

Figur 31. Kapacitet och behov i Storvreta – Vattholma – Skyttorp för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

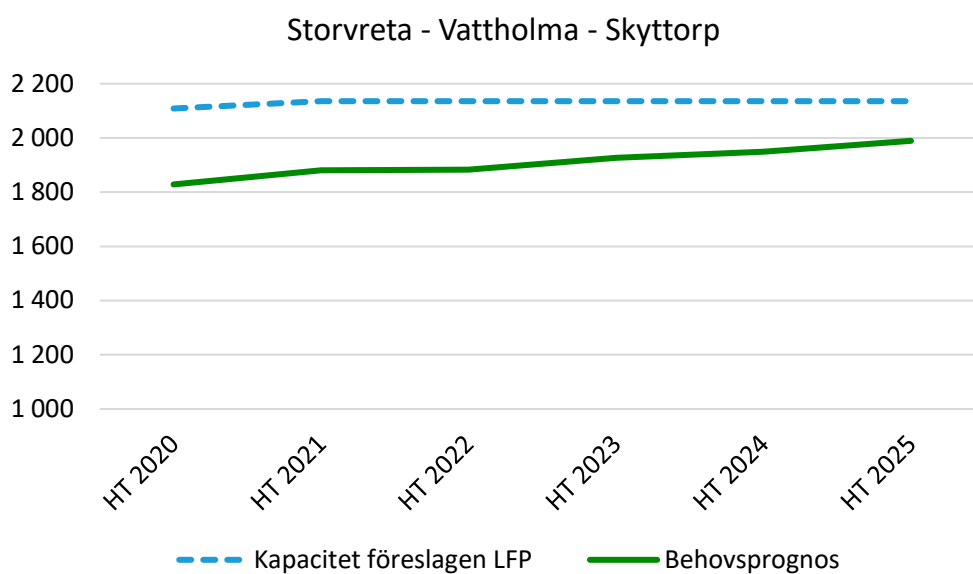

Figur 32. Kapacitet och behov i Storvreta – Vattholma – Skyttorp för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Fullerö förskola	Förskolan rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet oklar. Evakuering till Lyckebo förskola genomförd 2021. Preliminär tidsplan.												
											+18		
Skyttorp	Ny förskola inklusive ersättning av befintlig, ny kapacitet 72 – 144 platser. Preliminär tidsplan.												
											+36		
Totalt											+54		

Tabell 49. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Åtgärder som ej är inkluderade i Mål och budget 2022		
Grundskola	Beskrivning	Färdigställd
Ärentunaskolan	Utökad ventilation. Kräver etappvis evakuering till moduler.	2023

Tabell 50. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inte inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Himmelsvägens förskola	Moduluppställningen lämnas 2026.												
										-36			
Malmvågens förskola	Tidigare beslutad kapacitetsökning genomförs inte.												
Södra Storvreta	Ny förskola. Ev fristående. Preliminär tidsplan. 144 platser.												
										+144			
Södra Storvreta	Ny förskola. Preliminär tidsplan. 144 platser.												
												+144	
Totalt										+108		+144	

Tabell 51. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Södra Storvreta	Ny grundskola.							
					+630		+630	
Östra Storvreta	Ny grundskola i östra Storvreta. Efter 2031.							
Totalt							+630	

Tabell 52. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Behov av förskole- och grundskoleplatser i Storvreta, Vattholma och Skyttorp som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår

Tabell 53. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.


Utbyggnadsplaner

Storvreta, Vattholma respektive Skyttorp är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 1 600, 300–800 respektive 150 bostäder till och med år 2050.

En genomförandestrategi för Storvreta, som bygger på cirka 1 900 bostäder inklusive Fullerö Hage har arbetats fram. Delar av planläggningen för Södra Storvreta är pausad på grund av osäkerhet kring sträckning av ny kraftnätsledning. Både förskole- och skolplatser är planerade inom området.

Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala

Tuna Backar – Kapellgården – Kvarngården – Nyby – Löten

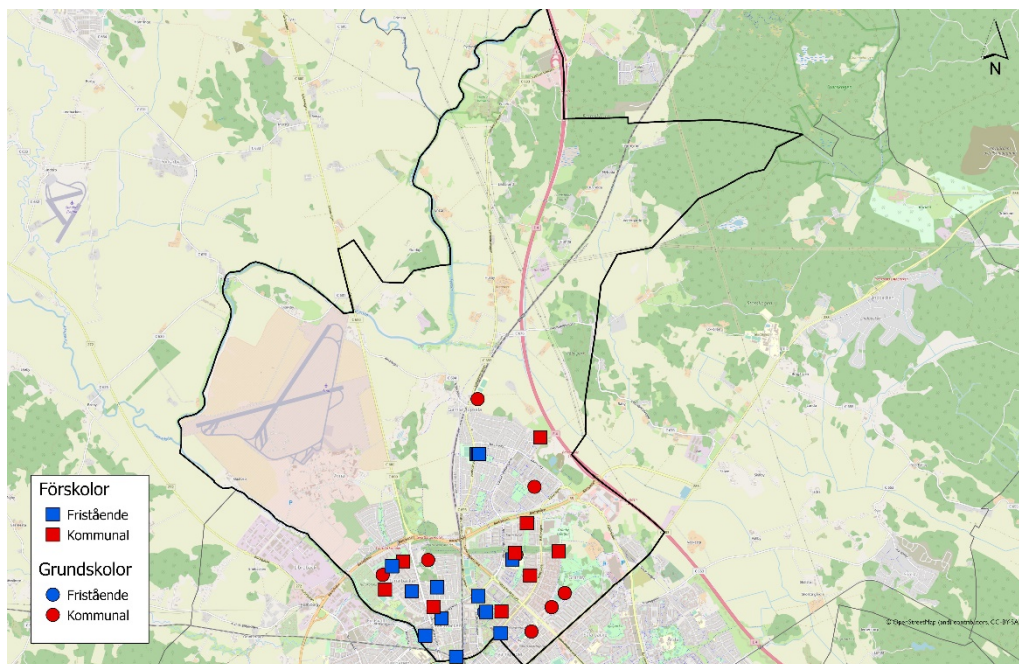

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Bellmans förskola
Gränby familjedaghem
Jarlaparkens förskola
Lagerlöfs förskola
Parkens förskola
Ringarens förskola
Tunaparkens förskola
von Bahrs förskola
Väpnarens förskola
Österledens förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Ekplantans förskola
Fyrisåns förskola
Gamla Uppsala
Montessoriförskola
Gamla Uppsala förskola
Glädjens pedagogiska omsorg
Förskolan Laxen
Förskolan
Lingonblomman
Lilla elefantens familjedaghem
Lilltunas förskola

Lyckans pedagogiska omsorg

Norlandia förskolor - Kvarnen
Norlandia förskolor - Utmanaren
Närdaghemmet
Småkottarna i Uppsala Kommun
Solskenets förskola
Svartbäckens Montessoriförskola
Uppsala Montessori
Förskolan Swedenborg
Yrsa förskola

Grundskola – kommunal


Domarringens skola
Fredrika Bremerskolan
Gamla Uppsala skola
Gränbyskolan
Kvarngårdsskolan
Liljeforskskolan
Tunabergsskolan
von Bahrs skola

Grundskola - fristående

Uppsala Montessoriskola


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

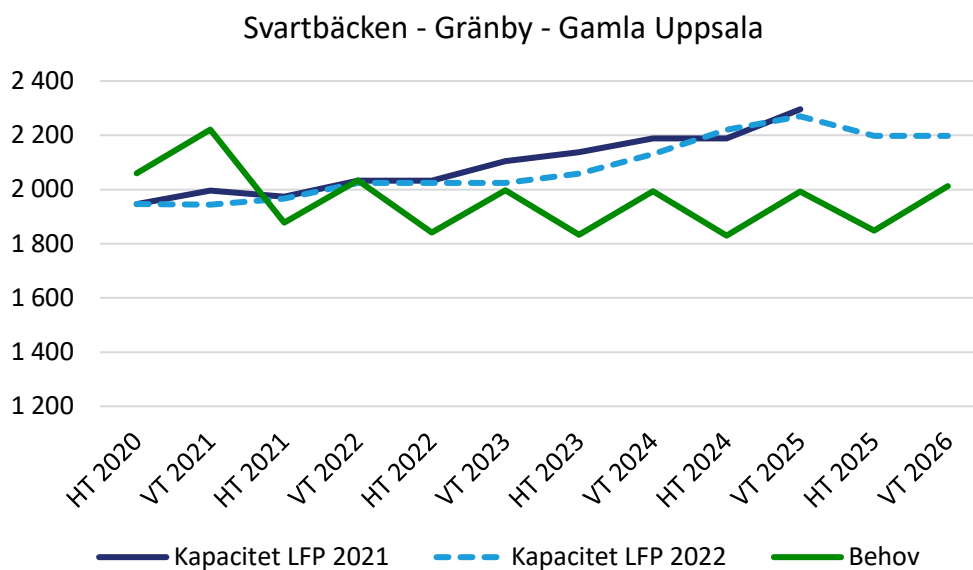

Figur 33. Kapacitet och behov i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

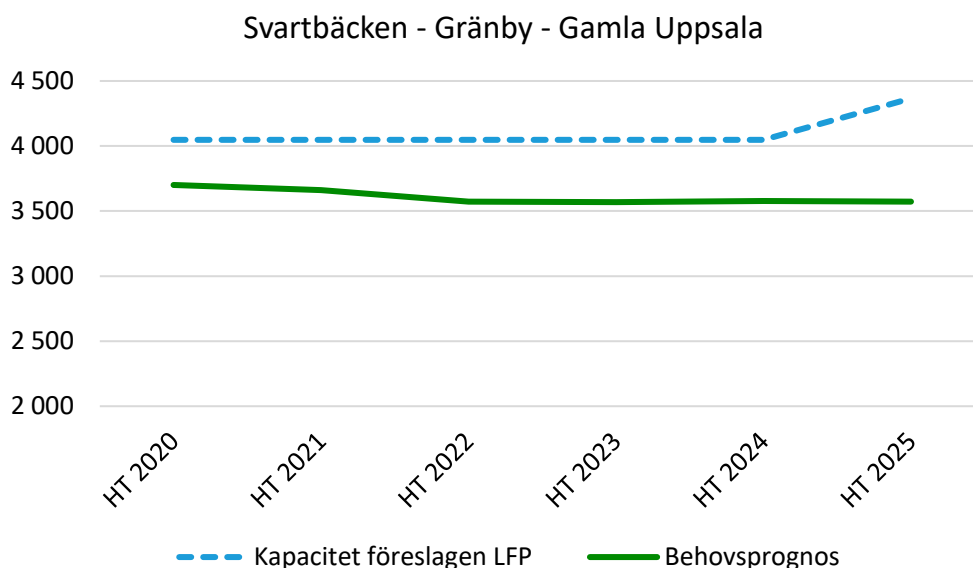

Figur 34. Kapacitet och behov i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Åtgärder som ej är inkluderade i Mål och budget 2022		
Grundskola	Beskrivning	Färdigställd
Kvarngårdesskolan	Evakueras temporärt VT 2022.	2022

Tabell 54. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. Åtgärderna i tabellen är inte inkluderade i processen för Mål och budget 2022.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Gamla Uppsala	Ny förskola i samband med nybyggnation av Gamla Uppsala skola. 54 – 72 platser.												
												+54	
Gränby-staden	Ny förskola. Ev inhyrning. 72 platser.												
								+72					
Kapell-gärdet	Ny förskola. 90 platser.												
					+108	+90							
Lagerlöfs förskola	Renoveras. Evakueras till Österledens moduluppställning HT23. Preliminär tidsplan.												
						+/-0							
Österledens förskola	Permanent ersättning för moduluppställning. Evakuering 2021. Ny kapacitet 144 platser.												
				+36									
Totalt				+36		+90		+72				+54	

Tabell 55. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Fredrika Bremer	Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakuering krävs							
						+90		
Gamla Uppsala skola	Ersättning samt utökning till 420 platser. Evakuering krävs.							
							+90	
Kvarngårdesskolan	Ersättning samt utökning till 990 platser. Evakueras temporärt VT 2022 och till moduluppställning HT 2022.							
				+360				
Totalt				+360		+90	+90	

Tabell 56. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar


Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Permanent ersättning för Väpnarens modulförskola.	2022
Utredning av ytterligare förskoleplatser inom området.	Pågår
Gränby – Liljefors skolområde ska utredas för utveckling.	2022

Tabell 57. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Utbyggnadsplaner

Detaljplanearbete pågår på flera delar i området, bland annat kvarteret Idun, Vapenhuset mfl och vid Heidenstamstorg. Ytterligare bostäder beräknas byggas i Liljefors-Gränby och Kapellgärdet men även i Gamla Uppsala och Svartbäcken. Arbete med planering för området kring Fyrishov pågår.

Sävja – Bergsbrunna – Danmark

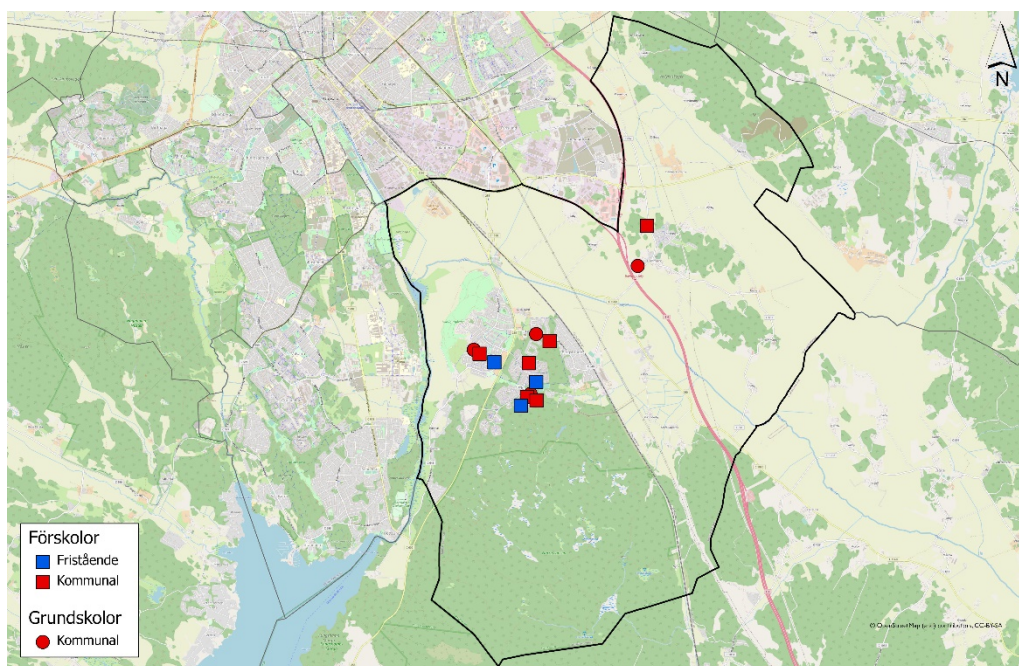

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Danmarks förskola
Lammets förskola
Myrgångens förskola
Ringmurens förskola
Sävja förskola
Uppsävja förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående


Förskolan Skogsglantan
Förskolan Tärningen HB
Ekoxen dagbarnvårdare Sävja
Gladers förskola
Grodans förskola
Helenas minidagis
Kojans förskola
Lottas minidagis

Grundskola – kommunal

Danmarks skola
Nåntunaskolan
Stordammens skola
Uppsävja skolan


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

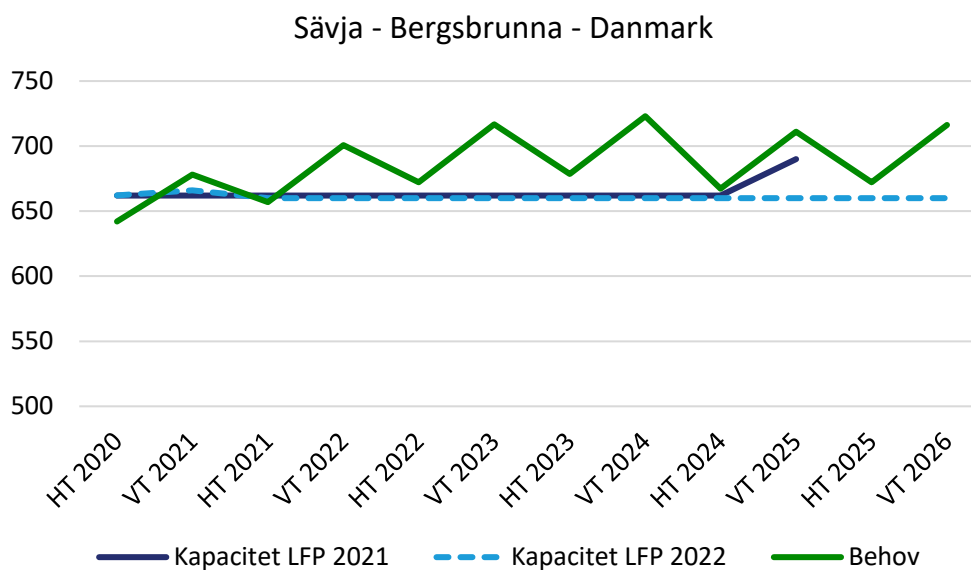

Figur 35. Kapacitet och behov i Sävja – Bergsbrunna – Danmark för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

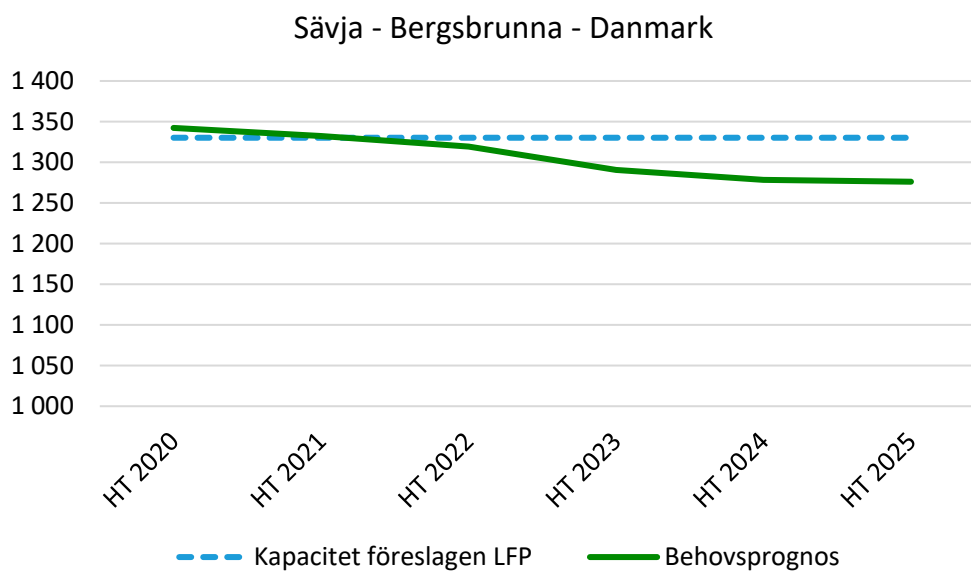

Figur 36. Kapacitet och behov i Sävja – Bergsbrunna – Danmark för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

-

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Sydöstra staden	Ny förskola. 108 - 144 platser.												
											+108		
Sydöstra staden	Ny förskola. 108 - 144 platser.												
												+108	
Sydöstra staden	Tidigare schablonåtgärder stryks.												
									+320			+320	+320
Uppsävja förskola	Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 platser.												
							+72			+72			
Totalt										+72	+108	+108	

Tabell 58. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Nåntunaskolan	Byggs ut till tvåparallellig F-6, 420 platser. Efter 2031.							
					+240			
Sydöstra staden	Ny grundskola. 420 platser							
							+420	
Sydöstra staden	Tidigare schablonåtgärder stryks.							
					+400		+630	+630
Totalt							+420	

Tabell 59. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Nya för- och grundskoleplatser i Sydöstra staden som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår

Tabell 60. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.


Utbyggnadsplaner

Fördjupad översiktsplan för Sydöstra stadsdelarna (Sävja –Bergsbrunna) möjliggör utbyggnad fram till år 2050 med 21 500 bostäder.

Detaljplanearbete för de första etapperna i Östra och Södra Nåntuna planeras att påbörjas under 2021, vilka bland annat inkluderar bostäder, förskola och skola.

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta

Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna

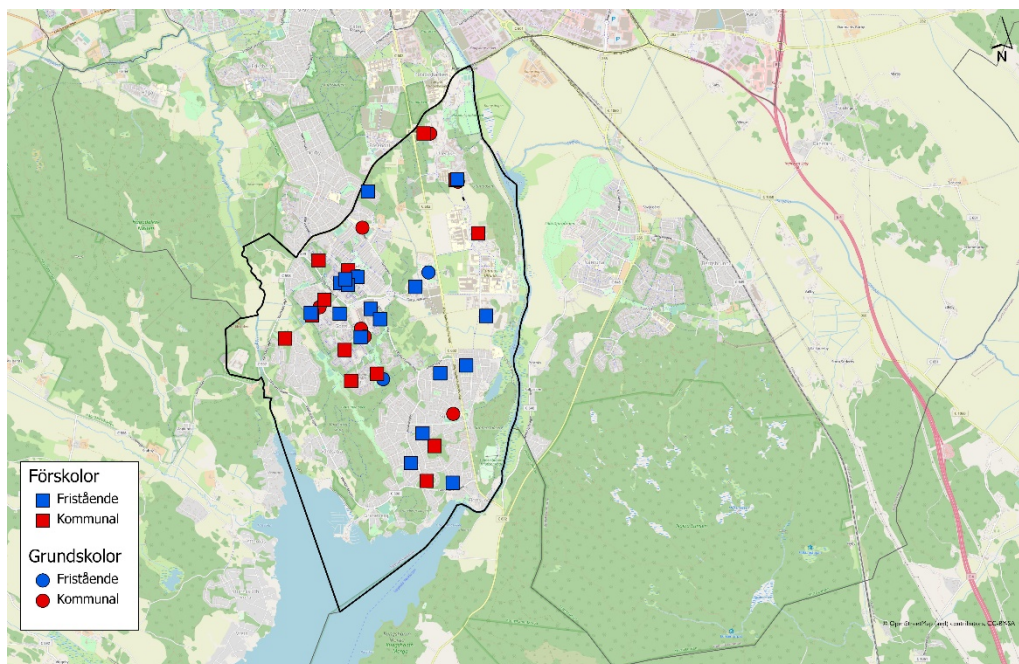

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Berwalds förskola
 Dirigentens förskola
 Ekuddens förskola
 Flöjtens förskola
 Hugo Alvéns förskola
 Orrparkens förskola
 Sopranens förskola
 Spinnrockens förskola
 Stenhammars förskola
 Sunnersta familjedaghem
 Trasthagens förskola
 Ulleråkers förskola
 Vintergatans förskola
 Växthusets förskola

Grundskola – kommunal


Ekuddens skola
 Gottsundaskolan
 Sunnerstaskolan
 Treklangen
 Valsätraskolan
 Växthuset

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Björkens förskola
 Duvans förskola
 Eddaförskolan Valthorn
 Eddaförskolan Bandstol
 Ekbackens förskola
 Fiolbackens förskola
 Förskolan Mollys Farm
 Gåsens förskola
 Kunskapsförskolan, Bäcklösa
 Kyrkklockans förskola
 Lindparkens förskola
 Malma backe förskola
 Manar Al-Houda Kooperativ
 Pilfinkens Montessoriförskola
 Sunnersta Naturförskola
 Tellusbarn Tulpanen
 Ultuna förskola
 Videungens Montessoriförskola
 Äventyrets förskola
Grundskola – fristående
 Internationella Engelska skolan
 Kajans friskola
 Manar Al-Houda
 Musiklådan


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

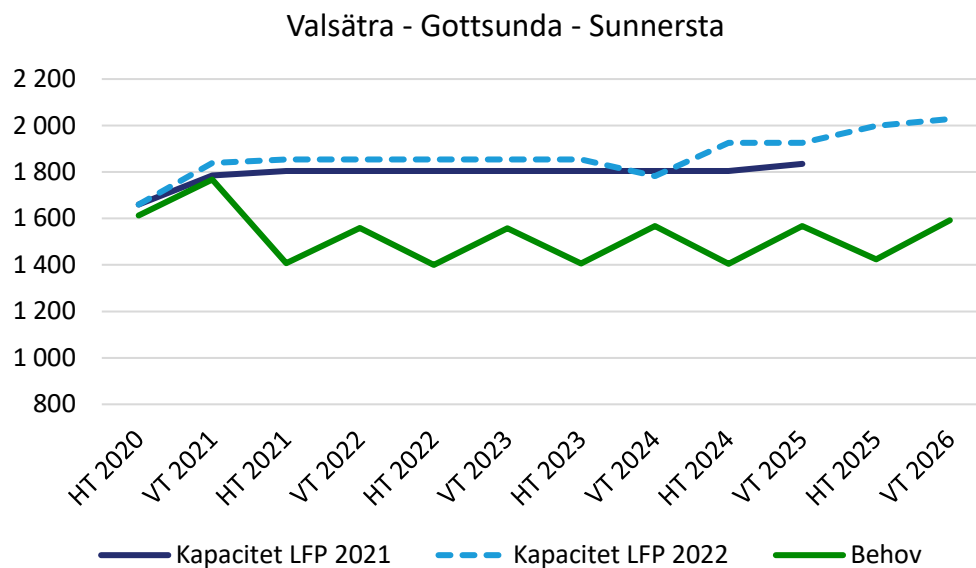

Figur 37. Kapacitet och behov i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta för förskola samt pedagogisk omsorg: Kommunal och fristående, Uppsala kommun 2020 och 2021.

Grundskola

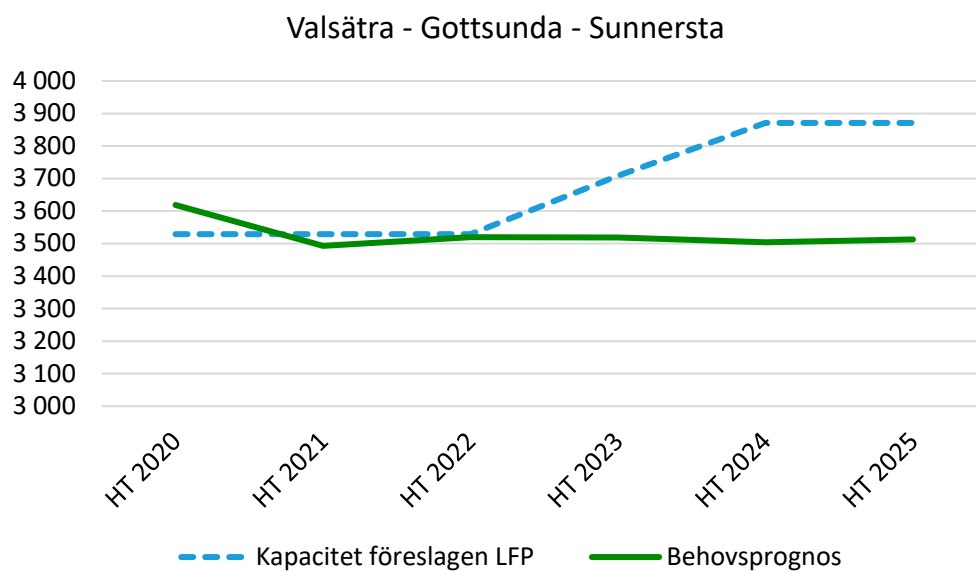

Figur 38. Kapacitet och behov i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta för kommunal och fristående grundskolor. Förra årets LFP redovisade endast kapacitet i kommunala grundskolor och har därför inte tagits med som jämförelse.

Nya åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Ulleråkers förskola	Ersättning och utökning av Ulleråkers förskola i hus 65. Ny kapacitet 144 platser.												
						+72							
Totalt						+72							

Tabell 61. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Ulleråker	Ombyggnation av Lundellska skolans lokaler. Oklar kapacitet och tidsplan.							
Totalt								

Tabell 62. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola	VT 2022	HT 2022	VT 2023	HT 2023	VT 2024	HT 2024	VT 2025	HT 2025	VT 2026	HT 2026	2027	2028-2029	2030-2031
Malma	Ny förskola. Ev. inhyrning. 108 platser.												
									+108	+108			
Ulleråker	Ny förskola, kvarteret Vinghästen.												
									+108		+108		
Ulleråker	Ny förskola, kvarteret Strofen. Inhyrning. 72 platser.												
								+72					
Valsätra	Ny förskola. Ersätter och utökar Hugo Alfvéns nuvarande byggnad. Ny kapacitet 72 platser. Preliminär tidsplan.												
							+30		+30				
Totalt								+72	+30	+108	+108		

Tabell 63. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2031
Treklangens skola	Nuvarande skola rivs och ersätts. Evakuering krävs. Ny kapacitet 420 – 630 platser.							
							+270	
Gottsundaskolan	Permanent ersättning för moduluppställning 720 platser							
			+180					
Totalt			+180				+270	

Tabell 64. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Nya för- och grundskoleplatser i Gottsunda-Valsätraområdet som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår
Nya för- och grundskolor inom Ulleråker och Ultunaområdet som följer bostadsutbyggnaden.	Pågår
Utökning av Växthuset III och Lilla Valsätra/Bäcklösaskolan.	2022

Tabell 65. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Utbyggnadsplaner

Program för utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000–7 000 nya bostäder.

Förutom ny skola och idrottshall, som är omnämnda i denna lokalförsörjningsplan behöver ytterligare skolplatser samt även förskoleplatser tillgodoses. Behovet bedöms i stor utsträckning behöva mötas i anslutning till befintliga lokaler.


Både Ulleråker och Ultuna planeras rymma cirka 6000 bostäder vardera och att bostadsbyggnationen påbörjas under 2020-talet. Utbyggnaden i området kommer att leda till ett behov av social infrastruktur.

Bilaga 2 – Gymnasieskola och särskola, hela staden

Beskrivningarna innehåller information gällande gymnasieskola och särskola. Information som anges är vilka befintliga enheter som finns i området, nya åtgärder, pågående och redan beslutade åtgärder samt utredningsuppdrag.

Utredningsuppdragens tidssättning påverkas av bostadsbyggnation, pågående program- och planarbeten samt andra pågående projekt. Tidssättningen kan därför komma att ändras.

Gymnasieskola

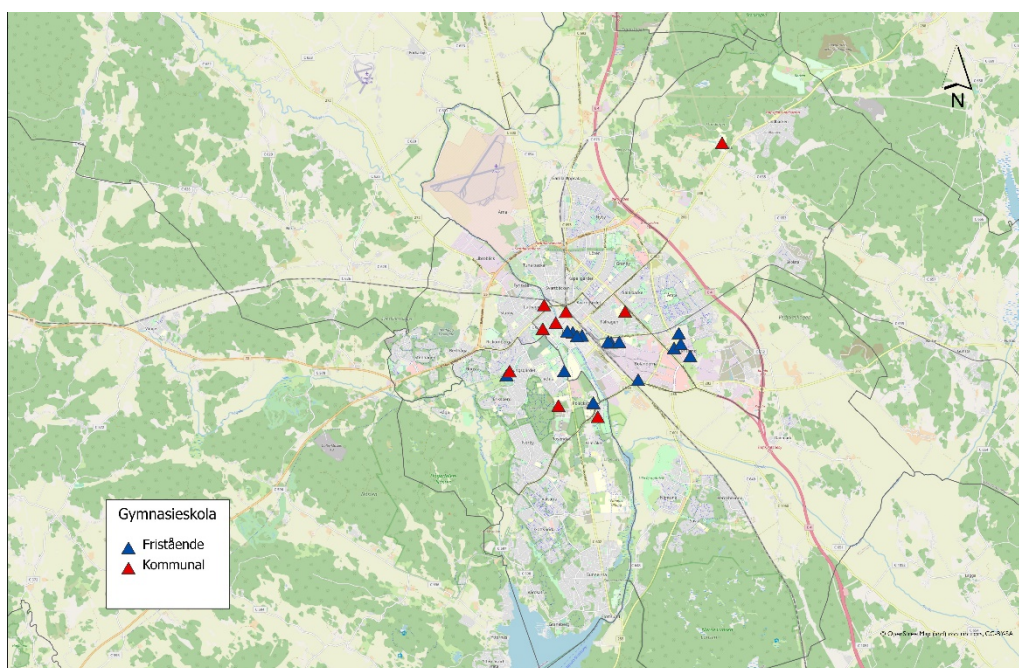

Gymnasieskola – kommunal

Celsiusskolan
Ellen Fries gymnasium
Fyrisskolan
Katedralskolan
Lundellska skolan
Rosendalsgymnasiet
Uppsala estetiska gymnasium
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Gymnasieskola - fristående

Ansgargymnasiet
Bergstrands gymnasieskola
Cultus gymnasieskola
Drottning Blankas
Gymnasieskola
Grillska gymnasiet
Hvilan utbildning
Internationella gymnasiet
Jensen gymnasium
Kunskapsgymnasiet
NTI-Gymnasiet
Praktiska gymnasiet
Realgymnasiet

Thorén Business School
Yrkesgymnasiet
Magelungens gymnasieskola
Procivitas privata
gymnasieskola

Nya åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Gymnasium	Beskrivning	Färdigställd
Lundellska skolan	Flytt till nya lokaler på Polacksbacken (Tidigare beslut: 1 400 nya gymnasieplatser i södra staden).	2024
Lundellska skolan	Lokaler för resursenheten ersätts. (Tidigare beslut: Lokaler för resursenheten måste ersättas inom Ulleråkerområdet.)	2023

Tabell 66. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Gymnasieskola	Beskrivning	Färdigställd
Ellen Fries gymnasium	Gamla Linnéskolan återtas som gymnasieskola då arbetsmarknadsförvaltningen lämnar den. Succesiv ökning till en kapacitet på 800 elever.	2022
Södra staden	1 400 nya gymnasieplatser. Ersätts av ny åtgärd: Flytt av Lundellska skolan till nya lokaler på Polacksbacken.	2023–2024
Uppsala yrkesgymnasium Jälla	Nybyggnation efter översyn av yrkesprogrammets behov.	2027


Tabell 67. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredningar

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Fortsatt översyn av gymnasieskolorna utifrån förväntat elevantal över tid, programutbud och effektivitet, särskilt gällande Uppsala kommuns yrkesgymnasier.	2022
Nya gymnasielokaler till 2026.	2022

Tabell 68. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Särskola

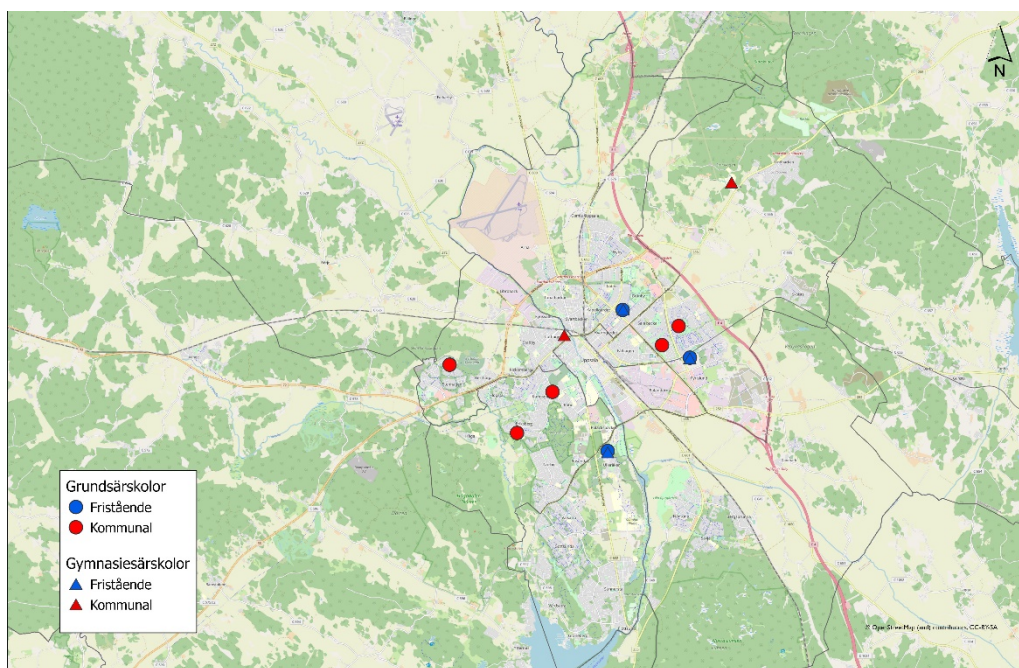

Befintliga objekt

Grundskola – kommunal

Bergaskolan grundskola
Eriksbergsskolan grundskola
Johannesbäcksskolan grundskola
Årstaskolan grundskola
Östra Stenhagenskolan grundskola

Grundskola - fristående

Ansgarskolorna; Emanuelskolan
Kajan Friskola
Labanskolan

Gymnasieskola – kommunal

Uppsala GS Fyris
Uppsala GS Jälla

Gymnasieskola – fristående

Emanuelgymnasiet
Kajan gymnasieskola
Labanskolan gymnasieskola

Nya åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Särskola	Beskrivning	Färdigställd
Ny grundskola	Ny grundskola. 50 – 75 platser. Preliminär placering och tidsplan.	2026

Tabell 69. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade åtgärder

Åtgärder som är inkluderade i Mål och budget 2022		
Särskola	Beskrivning	Färdigställd
Grundskola Brantingstorg	Ny permanent sarskoleenhet i Uvens tidigare lokaler Brantingstorg	2023-2024
Uppsala GS	Nybyggnation vid Jälla för ersättning av moduluppställningen samt samlokalisering av gymnasiesarskolan.	2027

Tabell 70. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan.

Utredning	
Beskrivning	Status/färdigställd
Ytterligare utökning av grundskolan.	2022
Planera för en grundskoleenhet i ett längre perspektiv på någon av de kommande nybyggnationerna.	2022
Elevtalsprognosen för gymnasiesarskolan utgår från att andelen elever på gymnasiet som går i sarskolan är oförändrad. Detta ger en ökning av elevantalet som inte svarar mot antalet elever som idag är inskrivna i grundskolan. Därför behöver denna prognos utredas noggrannare.	2022

Tabell 71. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Bilaga 3 – Färdigställda åtgärder 2021

Enhet	Beskrivning
Förskola	Renovering av Petterslunds förskola.
Mobila enheter	Två nya mobila enheter förskola centrala staden.
Mobil enhet	Flytt av Österledens mobila enhet.
Förskola	Lindens förskola Flytt till nya lokaler dec 2021.
Förskola	Lindbackens förskola klar för inflytt dec 2021.
Förskola	Evakuering av Österledens förskola.
Förskola	Evakuering av Tallens förskola.
Grundskola	Ersättning Eriksbergsskolans nedbrunna byggnad (modul).
Grundskola	Utökning för Lindbackens grundskola då förskolan lämnar.
Grundskola	Moduluppställning Ulleråker, ersättning Polack/Rosendal.
Grundskola	Ärentunaskolans utökning i modul.
Gymnasieskola	Ellen Fries gymnasium etapp 2.

Tabell 72. Färdigställda åtgärder 2021.
