

Lokalförsörjningsplan

för pedagogiska lokaler 2026–2035

LFP UBN 2026

Beslutad i utbildningsnämnden 2025-11-25

Godkänd i kommunstyrelsen 2025-12-16

Innehåll

Sammanfattning	4
Inledning	5
Planens innehåll.....	5
Definitioner.....	5
Styrning och uppdrag	6
Arbetets organisation.....	6
Lagbestämmelser och krav	6
Behov- och kapacitetsanalys	8
Befolkningsprognos	8
Behov och kapacitet.....	9
<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	<i>9</i>
<i>Grundskola</i>	<i>12</i>
<i>Anpassad grundskola</i>	<i>14</i>
<i>Gymnasieskola.....</i>	<i>15</i>
<i>Anpassad gymnasieskola.....</i>	<i>17</i>
Utblick.....	18
Stads- och landsbygdsutveckling	18
Åtgärder och utredningar.....	19
Nya åtgärder	19
Tidigare beslutade åtgärder	21
Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utredas ytterligare eller utgå	25
Utredningar	25
Uppföljning av utredningar som inte leder till lokalåtgärd.....	29
Ekonomi- och kostnadsutveckling	30
Investeringsbedömning.....	31
Hyreskostnad och verksamhetsekonomi	32

Bilagor

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning	1
Bälinge – Björklinge	2
Centrala staden - Fålhagen	7
Gunsta – Länna – Almunge – Knutby	12
Gävsta- Stavby – Tuna	17
Luthagen – Stenhagen	21
Norby – Eriksberg – Flogsta	26
Ramstalund – Vänge – Järlåsa	31
Sala backe – Årsta – Vaksalabygden	35
Storvreta – Vattholma – Skyttorp	40
Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala	44
Sävja – Bergsbrunna – Danmark	48
Valsätra – Gottsunda – Sunnersta	53
Bilaga 2 - Gymnasieskola och anpassad skola, hela staden	1
Gymnasieskola	1
Anpassad skola	3
Bilaga 3 – Färdigställda åtgärder 2025.....	1
Bilaga 4 – Ekonomi per åtgärd	1

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler (LFP UBN 2026) är kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Planen tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Den övergripande styrningen redovisas på sidan 6.

Sammanfattat behov

Behovsbedömningen baseras på kommunens befolkningsprognos, planer för bostadsutbyggnad samt kommunens utveckling enligt översiktsplanen. I analysen har ytterligare underlag vägts in, till exempel andelen barn som behöver en förskoleplats.

Till och med år 2035 väntas åldrarna 1–5 år respektive 16–18 år öka med sju procent vardera medan 6–15 åringar väntas minska med sex procent.

I kommunprognosen från 2025 är det förväntade antalet barn och ungdomar under lokalförsörjningsperioden fram till och med år 2035 något lägre jämfört med förra årets prognos.

Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar.

I samtliga skolformer antas tillkommande platser bedrivas i både kommunal och fristående regi.

Behovsanalysen redovisas i sin helhet på sidan 8.

Sammanfattade åtgärder och utredningar

Åtgärder är projekt som ska genomföras för att möta ett behov. Lokalförsörjningsplanen föreslår 13 nya åtgärder. Utöver det föreslås även två nya åtgärder som ännu inte arbetats in i Mål och budget 2025–2027, ny förskola och ny grundskola i Norra Hovstallängen.

I planen revideras även tidigare beslutade åtgärder utifrån nya förutsättningar. Sedan tidigare finns 40 åtgärder beslutade varav fem föreslås utredas ytterligare eller utgå.

Utredningarna syftar till att utreda hur ett behov ska mötas innan det lyfts till åtgärdsförslag. Planen innehåller 51 utredningar, varav 11 är nya.

Alla åtgärder och utredningar redovisas i sin helhet på sidan 19.

Sammanfattning ekonomi

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för hyra och verksamhetsdrift. Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär:

- 3 096 miljoner kronor i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 476 miljoner kr är för nya åtgärder
- 141 miljoner kronor i investeringar för utbildningsnämnden, varav 25 miljoner kronor är för nya åtgärder
- 107 miljoner kronor ökade hyreskostnader för utbildningsnämnden, varav nya åtgärder innebär en ökning på 11 miljoner kronor.

Till detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna.

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidan 30.

Inledning

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler (LFP UBN 2026) är kommunens planering för bostäder och lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Lokalförsörjningsplanerna revideras årligen. Planer som berör varandra koordineras för att skapa en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering.

Planens innehåll

Lokalförsörjningsplanen redovisar:

- Styrning och uppdrag
- Behov och kapacitet
- Åtgärder och utredningar
- Utblick
- Ekonomiska konsekvenser

I bilagor redovisas områdesindelade analyser, åtgärder, utredningsuppdrag, färdigställda åtgärder 2025 samt ekonomi.

Bilaga 1: Förskola och grundskola, områdesindelad

Bilaga 2: Gymnasieskola och anpassad skola, hela staden

Bilaga 3: Färdigställda åtgärder 2025

Bilaga 4: Ekonomi per åtgärd

Definitioner

Begreppsförklaring

- **Anpassad skola:** Namn för det som tidigare benämndes särskola. Gäller grundskola och gymnasieskola. Eleverna läser ämnen eller ämnesområden där ämnena ligger närmare grundskolans respektive gymnasieskolans ämnen. Ämnesområden ersätter den tidigare träningsskolan.
- **Pedagogisk omsorg:** Innefattar det som tidigare kallades dagbarnvårdare och familjedaghem.
- **Servicegraden:** Anger hur stor andel av barnen i åldrarna 1–5 år som bereds en plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
- **Lokalförsörjningsområde:** En geografisk indelning för att sammanfatta behov och kapacitet gällande social infrastruktur. För närvarande består Uppsala kommun av 12 geografiska lokalförsörjningsområden.

Styrning och uppdrag

Planen utgår från utbildningsnämndens ansvarsområden samt de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2025 (KSN-2023-03256). Arbetet med framtagandet av denna lokalförsörjningsplan är koordinerat med Mål och budget 2026 med plan för 2027–2028. Grunden utgörs av nämndens ansvar samt verksamhetsplan för pedagogiska lokaler.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska försörjning av lokaler och bostäder. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva.

I samband med beslutet av LFP UBN 2024 samt LFP UBN 2025 beslutades även att kommunledningskontoret i samarbete med utbildningsförvaltningen skulle ta fram en långsiktig strategi för lokalförsörjning med ett minskande barn/elevtal för förskola och grundskola. I arbetet med strategin tillsattes en politisk styrgrupp bestående av utbildningsnämndens gruppleddare för respektive parti. Arbete med detta har pågått successivt under 2024 - 2025 och har arbetats in i lokalförsörjningsplanen.

Uppdrag 36 i Mål och budget 2025–2027 (KSN-2023-03256) om att stärka kommunens tidiga insatser genom att utveckla familjecentralernas tillgänglighet, kvalitet och samlokalisering kan innebära att ytterligare lokaler för Öppen förskola behövs på längre sikt.

Arbetets organisation

LFP UBN 2026 tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt de kommunala bolagen Skolfastigheter AB och Uppsalahem AB. Arbetet med framtagandet leds och samordnas av kommunledningskontoret.

Planen beslutas av utbildningsnämnden och godkänns av kommunstyrelsen.

Lagbestämmelser och krav

Arbetet med lokalförsörjning utgår från lagar, krav och kommunala styrdokument. Det handlar om att se till barnets behov enligt barnkonventionen, de äldres perspektiv i enlighet med äldrevänlig kommun och en jämställd prioritering oavsett kön eller bakgrund och om att följa skollagen och miljöbalken.

Kommunala styrdokument

Skollokaler för alla skolformer behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolformernas olika behov, men de ska samtidigt vara yteffektiva, kostnadseffektiva och hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och förändringar i elevunderlaget.

Utbildningsnämnden har fattat beslut om funktionsprogram som syftar till att säkerställa dessa kvalitéer vid ny- och ombyggnation.

För förskolan finns det ett nationellt funktionsprogram som togs fram av Sveriges kommuner och regioner (UBN-2020–05666). Som komplement finns förskolans verksamhetsbeskrivning (UBN-2023-05344). Det pågår också ett arbete med uppdatering av ytor i rumsfunktionsprogrammet.

Funktionsprogram för grundskolan (UBN-2020-07955) finns framtaget för Uppsala kommun vilket uppdateras och revideras kontinuerligt. Verksamhetsbeskrivningen finns under rubriken Skollokaler för lärandet.

Vid nybyggnation och större ombyggnation av grundskolor ska en skolstruktur motsvarande förskoleklass till och med årskurs 6 respektive årskurs 7 till och med 9 eftersträvas. Alternativt en skolstruktur motsvarande förskoleklass till och med årskurs 9.

För de anpassade skolformerna samt gymnasieskolan tas projektspecifika funktionsprogram fram.

Funktionsprogram för måltidsservice finns framtaget (KSN-2025-00764) för att bättre bevaka de funktioner som dessa verksamheter behöver i framtida skollokaler. Ett funktionsprogram för städservice finns också framtaget (KSN-2022-01195).


Riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola (KSN-2020-02088) gäller vid framtagande av nya detaljplaner för nyproduktion av förskola och grundskola samt vid renovering av befintliga skolor.

Behov- och kapacitetsanalys

Befolkningsprognos


År 2024 bodde drygt 248 000 personer i Uppsala kommun. Kommunen väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. Årets prognos visar en lägre ökningstakt för totalbefolkningen jämfört med förra årets prognos. År 2035 antas befolkningen uppgå till drygt 271 600 personer, en ökning med cirka 23 000 personer jämfört med år 2024.

Störst procentuell ökning bedöms ske i åldersgruppen 80+ som ökar med 45 % under tioårsperioden. Efter år 2035 väntas totalbefolkningen fortsätta öka i jämn takt fram till år 2050. Variationer i prognoser från olika år visar på att kommunen måste ha beredskap både för en ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.

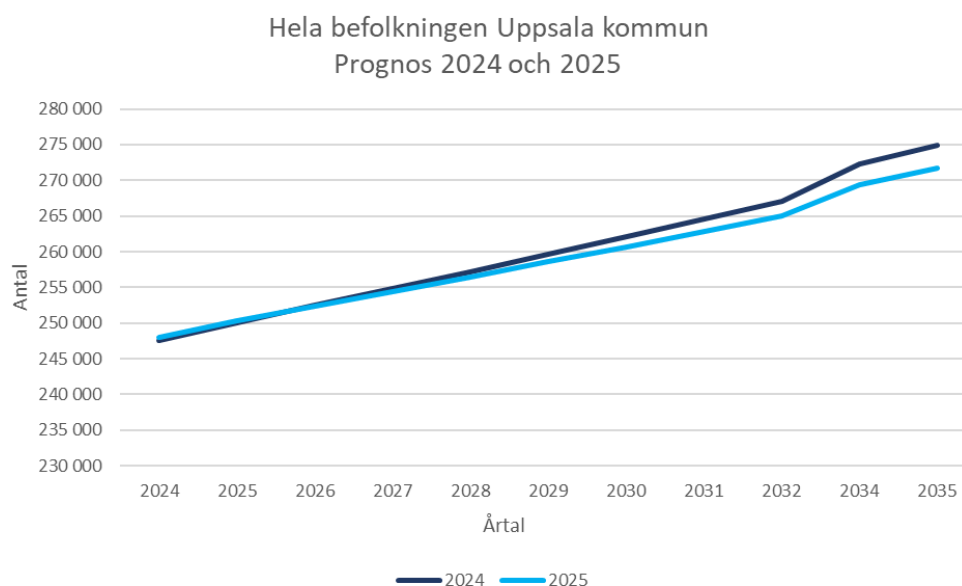


Figur 1. Kommunprognos för totalbefolkningen Uppsala kommun 2024 respektive 2025. Observera bruten axel.

På en tioårshorisont minskar samtliga åldersgrupper i antal förutom åldersgruppen 1–5 och 16–18 år som ökar i förhållande till 2024. Samtliga åldersgrupper förväntas sedan öka igen fram till 2050.

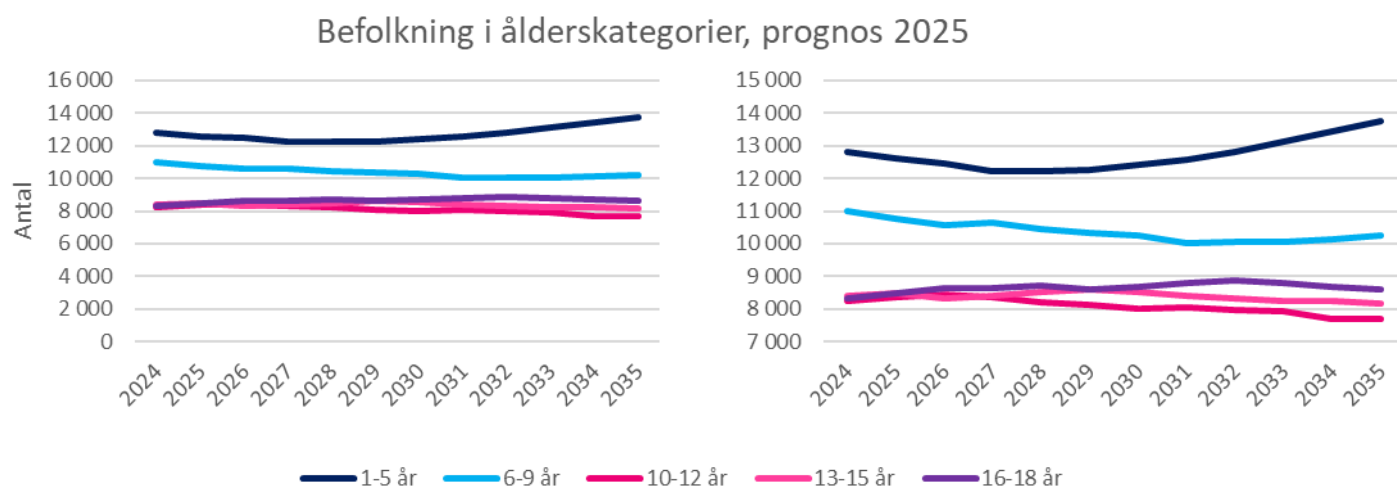

Figur 2. Befolkningsprognos 2025 för olika åldersgrupper.

Till och med år 2035 väntas åldersgruppen 1–5 år samt åldersgruppen 16–18 år öka med 7 respektive 3 procent medan åldersgruppen 6–15 år väntas minska med 6 procent.

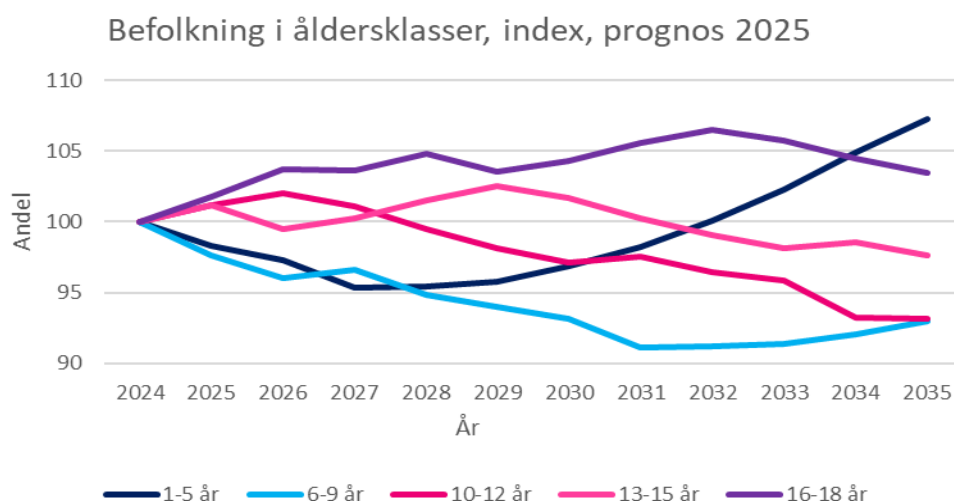

Figur 3. Procentuell ändring för olika åldersklasser (befolkningsprognos 2025). Index: 2024 = 100, förändringar jämfört med indexåret 2024.


Behov och kapacitet

Förskola och pedagogisk omsorg

2025 års befolkningsprognos visar på ett lägre antal barn i förskoleåldern under tioårsperioden än prognosen 2024. Fram till 2030 bedöms antalet barn minska till att vara cirka 400 barn färre än det faktiska antalet barn i åldern 1–5 år var år 2024, för att sedan återigen öka.

År 2035 antas antalet barn i förskoleåldern vara cirka 920 fler än år 2024. I jämförelse med prognosen 2024 bedöms åldersgruppen år 2035 vara cirka 430 barn färre än vad som prognostiserades för ett år sedan.

1 – 5 år, prognos 2024 och 2025

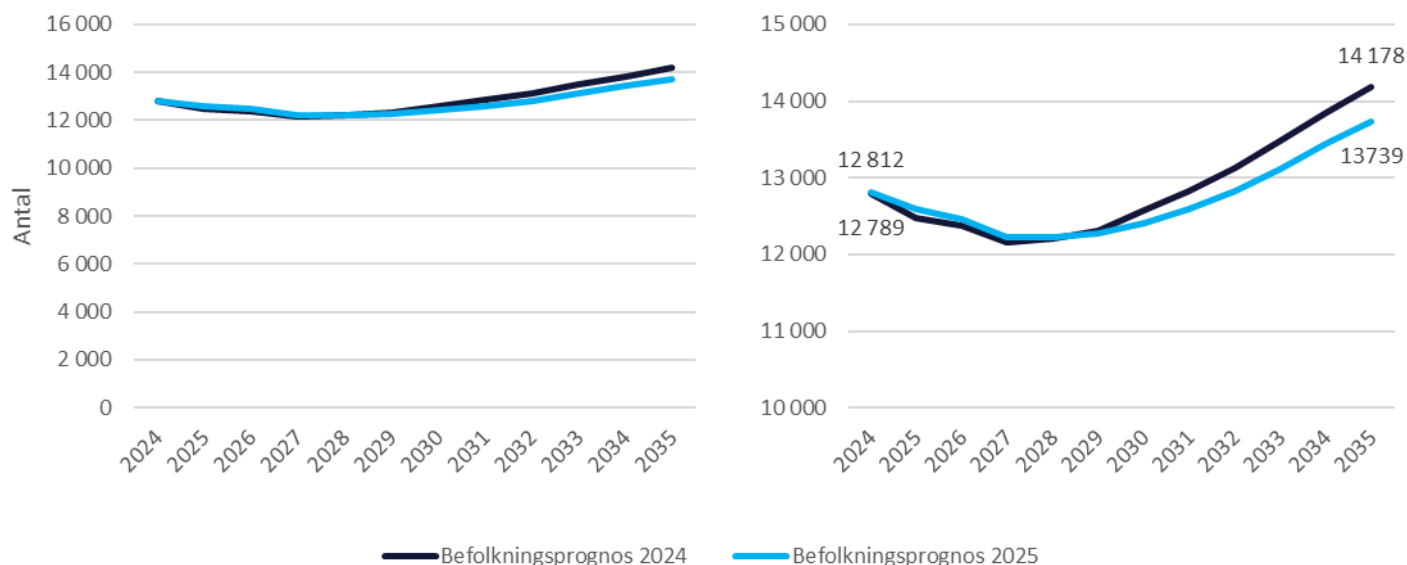


Figur 4. Jämförelse befolkningsprognos 2024 och 2025 för åldersgruppen 1–5 år. Observera bruten axel i det högra diagrammet.

Behovet av förskoleplatser varierar mellan höst och vår, se grön kurva i diagrammet nedan. Under sommaren skrivs alla barn som ska börja i grundskolan ut. Förskolan och den pedagogiska omsorgen fylls sedan successivt på under läsåret och når sitt maximala behov under vårterminens andra hälft. Kapaciteten måste därför anpassas efter vårbehovet trots att det innebär en viss överkapacitet varje höst.

Efterfrågan på förskoleplatser är inte bara ojämn över året. Den är även geografiskt ojämnt fördelad. Totalt inom kommunen råder idag ett överskott av förskoleplatser. Arbete har gjorts under året för att minska överkapaciteten i de områden där det har funnits möjlighet, till exempel genom att lämna moduluppställningar.

I områden med brist på förskoleplatser kan kapaciteten däremot kompletteras med mobila enheter där så är möjligt. Sju mobila enheter, även kallade förskolebussar, finns inom Uppsala kommun. Varje läsår är dessa enheter knutna till förskolor där kapaciteten behöver utökas. Utöver att de hjälper till att lösa en kapacitetsbrist erbjuder de även barnen en omväxlande utomhuspedagogik. Med anledning av det minskande behovet av förskoleplatser de kommande åren kan antalet mobila enheter behöva minskas.


Trots att diagrammet i figur 5 nedan visar en överkapacitet på totalen ger den planerade utbyggnationen av bostäder ett fortsatt behov av nya förskolor inom vissa områden av Uppsala kommun eftersom förskolor bör kunna erbjudas nära hemmen. I linje med uppdraget från utbildningsnämnden behöver justeringar fortsatt göras för att minska överkapaciteten på totalen för förskolan.

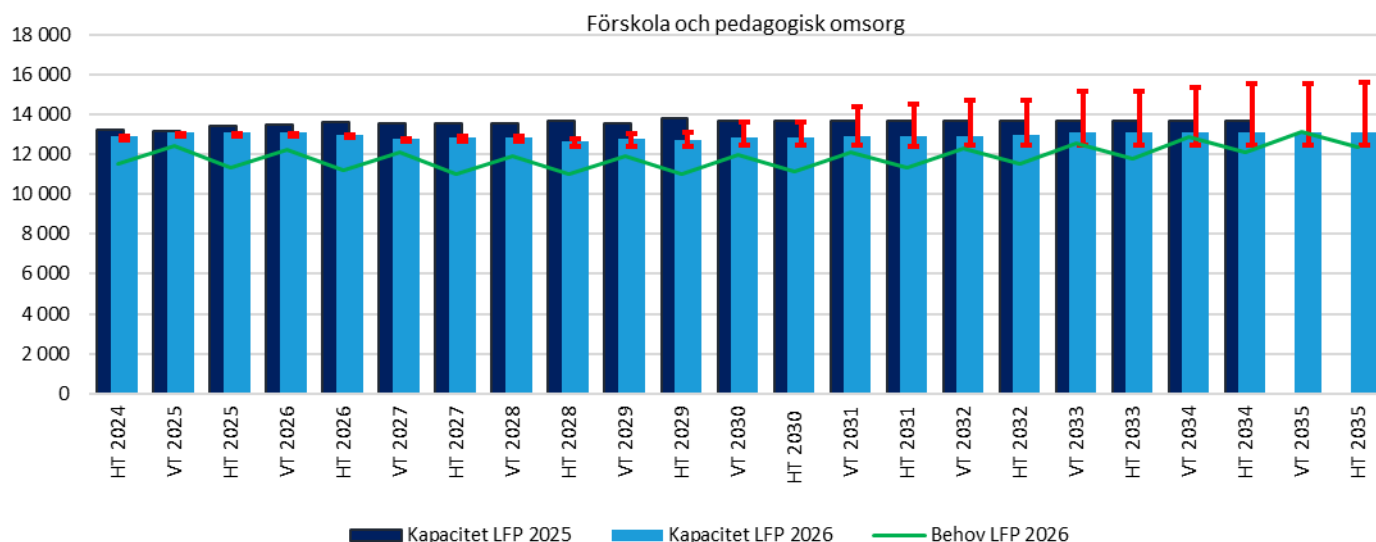

Figur 5. Total kapacitet samt behov i förskola: Kommunal och fristående. De röda staplarna visar spannet i kapacitet utifrån osäkerheten kring färdigställande samt kapacitet för varje projekt.

Förskola respektive pedagogisk omsorg är ett erbjudande som många, men inte alla, nyttjar. Den så kallade servicegraden anger hur stor andel av barnen i åldrarna 1–5 år som bereds en plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Planering sker efter en total servicegrad på 90 procent men den faktiska siffran varierar under läsårets gång samt mellan lokalförsörjningsområden.

Drygt 60 procent av dagens cirka 13 000 platser inom förskola och pedagogisk omsorg bedrivs i kommunal regi. I kapacitets- och behovsprognosen beräknas behovet av förskoleplatser tillgodoses i kommunal regi om inte annat är känt.

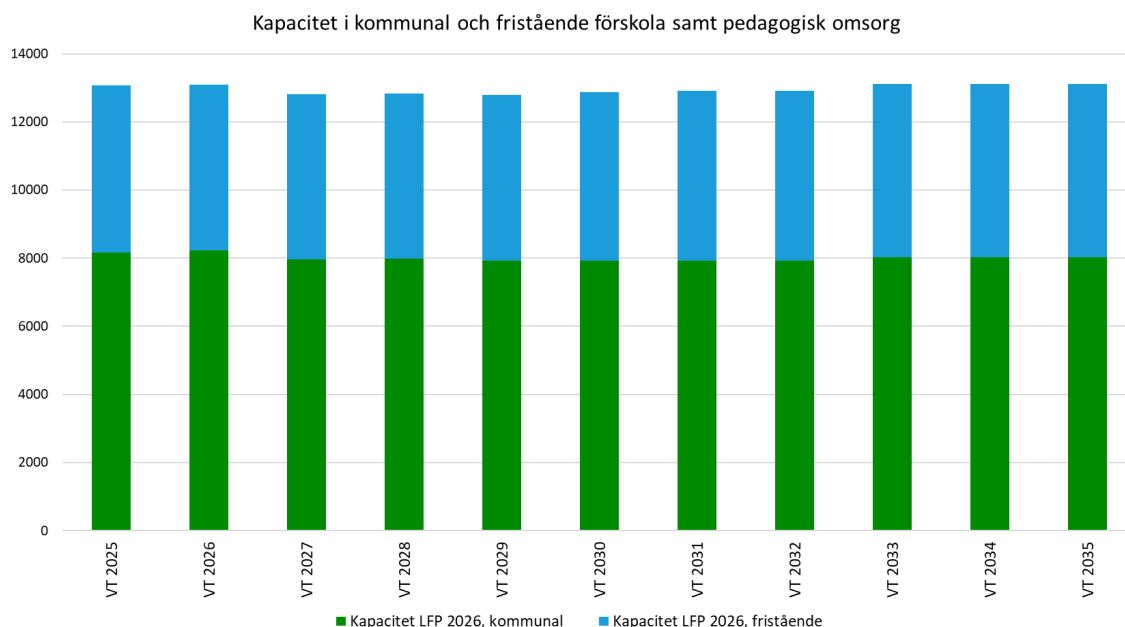

Figur 6. Total kapacitet, kommunal samt fristående förskola samt pedagogisk omsorg

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats för vårdnadshavare som är hemma med barn i åldrarna 0–6 år. Uppdraget innebär bland annat att erbjuda en pedagogisk miljö, att främja språkutveckling och läsning samt som en övergång till förskola/skola.

Uppdraget från kommunfullmäktige innebär även att ge ett tidigt stöd i samverkan med kommunens Råd och Stöd-verksamhet samt med regionens Mödra- och barnhälsovård enligt avtal med Region Uppsala.

Mål och budget 2025–2027 beskriver i uppdrag 36 att kommunen ska stärka tidiga insatser genom att utveckla familjecentralernas tillgänglighet, kvalitet och samlokalisering. Öppen förskola kan vara samlokaliserad med en vårdcentral och arbetar alltid familjecentrerat. Öppna förskolor i Uppsala kommun drivs av kommunen, samfund eller föreningar. Öppna förskolor ska vara politiskt och religiöst obundna, om inte bör benämningen vara endast familj/barnverksamhet.

I lokalförsörjningsplanen redovisas förändringar i fastighetsbeståndet för Öppen förskola under berörda områden. De ingår däremot inte i kapacitetsredovisningen.

Befintliga lokalresurser


Ett behov av evakueringar i samband med renoveringar av förskolans lokalbestånd finns. För att minska överkapaciteten och kostnader för tillfälliga moduluppställningar väljer nämnden att evakuera in i befintligt bestånd där så är möjligt.

Pedagogisk omsorg har också ett visst behov av gemensamma lokaler vilka finns utspridda inom kommunen, till exempel i Kungsgärdet och i Björklinge. Till största delen äger dock verksamheten rum i dagbarnvårdarnas egna hem.

Grundskola

Befolkningsprognosen för åldersgruppen 6–15 år sänks i 2025 års prognos i jämförelse med 2024. Åldersgruppen bedöms minska under tioårsperioden, från cirka 27 650 elever år 2024 till 26 117 år 2035, en minskning med cirka 1 500 elever i åldersgruppen.

6–15 år, prognos 2024 och 2025

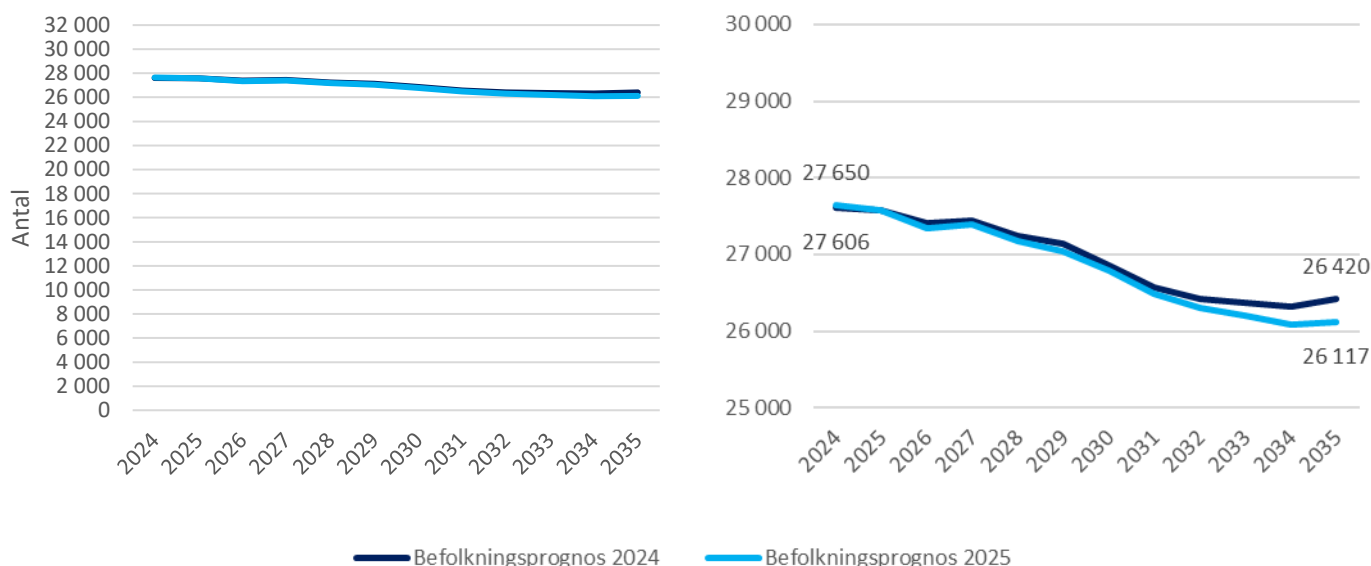


Figur 7. Jämförelse befolkningsprognos 2024 och 2025 för åldersgruppen 6–15 år. Bruten axel i det högra diagrammet

Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen med avräkning av elever i anpassad grundskola. Ut- respektive inflöde till och från andra kommuner ingår också i beräkningen.

En grundskola är av olika anledningar sällan fullbelagd utifrån kapacitetsbegreppet. Det beror till exempel på skolvalet, att elever börjar och slutar och att olika undervisningsgrupper tillkommer. För att kommunen ska kunna lokalförsörja i rätt omfattning krävs en viss marginal. Annars finns det risk att kommunen har för få elevplatser.


I lokalförsörjningsplanens diagram redovisas därför planeringskapaciteten, 90 procent av den totala kapaciteten, som är det elevantal kommunen planerar för. I tabeller över nyproduktion anges däremot hela kapaciteten.

I områdesbilagan redovisas områdets behov som det antal barn och ungdomar som bor i området och som behöver en grundskoleplats. Barn och ungdomar i området kan gå i skola i området eller i annat område. Platser i området kan användas till barn och ungdomar från området eller från annat område.

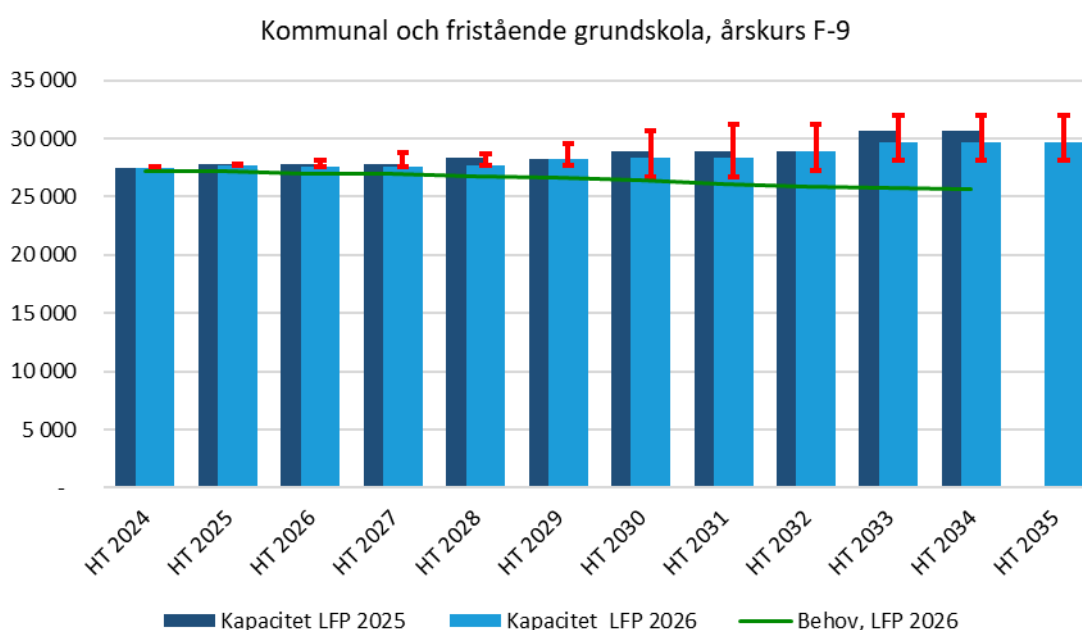

Figur 8. Total kapacitet samt behov i grundskola: Kommunal och fristående. De röda staplarna visar på spannet i kapacitet utifrån osäkerheten kring färdigställande samt kapacitet för varje projekt.

Drygt 80 procent av dagens cirka 27 000 platser inom grundskolan bedrivs i kommunal regi. I kapacitets- och behovsprognosen beräknas behovet av grundskoleplatser tillgodoses i kommunal regi om inte annat är känt.

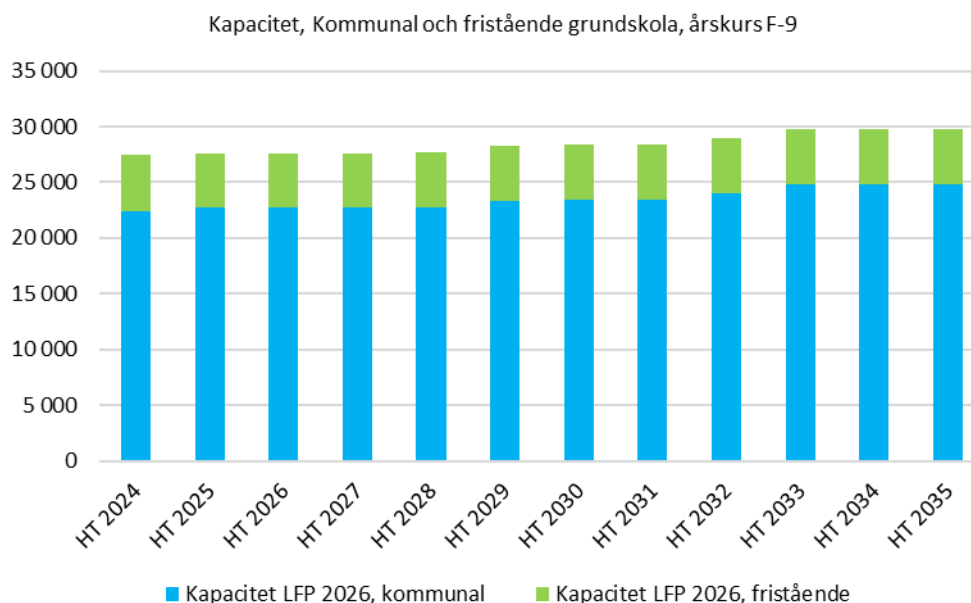

Figur 9. Total kapacitet, kommunal samt fristående grundskola

Trots att diagrammet visar en överkapacitet på totalen ger den planerade utbyggnationen av bostäder ett fortsatt behov av nya grundskolor inom vissa områden av Uppsala kommun eftersom grundskolor bör kunna erbjudas nära hemmen, i synnerhet för de yngre eleverna. I linje med uppdraget från utbildningsnämnden har justeringar gjorts i denna plan för att minska överkapaciteten på totalen. Fortsatta justeringar behövs.

Befintliga lokalresurser

Grundskolan i kommunal regi består av 58 enheter, vissa av dem lokaliserade till olika byggnader. Kommunen har också 5 resursenheter kopplade till grundskolan. Det finns ett behov av evakueringar i samband med renoveringar av grundskolans lokalbestånd. För att minska överkapaciteten och kostnader för tillfälliga moduluppställningar väljer nämnden att evakuera in i befintligt bestånd där så är möjligt.


Anpassad grundskola

I anpassade grundskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna får en utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden.

Anpassade grundskolan har också integrerade elever. Det innebär att eleven undervisas i en grundskoleklass men läser utifrån anpassade grundskolans kursplan.

Antalet elever i anpassad grundskola har ökat de senaste åren och förväntas fortsätta öka de närmaste fem åren, dock långsammare än tidigare. Därefter förväntas behovet stabiliseras. Andelen elever som läser ämnesområden har ökat de senaste åren men förväntas stabiliseras. Många elever i denna grupp har fysiska funktionsnedsättningar och behovet av personal är stort. Detta måste beaktas i lokalförsörjningen.

Elevtalsprognos i anpassad grundskola (ej integrerade elever)

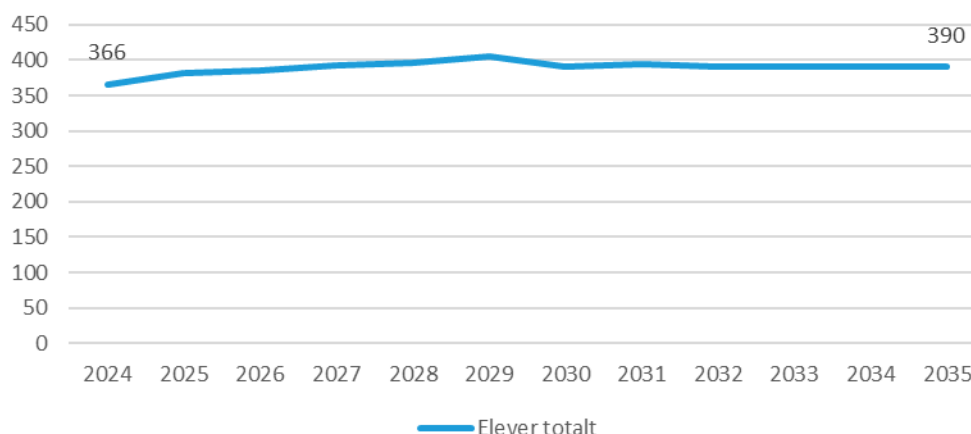

Figur 10. Elevtalsprognos, anpassad grundskola i kommunal samt fristående regi.


Befintliga lokalresurser

Den anpassade grundskolan i kommunal regi är idag lokaliserad i fem olika enheter. Gottsunda anpassad grundskola har en filial i Brantingsskolan. En del av Årsta anpassad grundskolas verksamhet är förlagd till moduluppställningen vid Årsta skola. När den avvecklas 2027 minskar kapaciteten där. En översyn av den anpassade grundskolans lokalförsörjning görs gemensamt av kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen för att lösa det ökade behovet av platser inom skolformen och den minskande kapaciteten vid flera enheter.

Gymnasieskola

Åldersgruppen 16–18 år har ökat något i prognosen 2025 i förhållande till prognosen 2024, från cirka 8300 personer 2024 till 8600 personer 2035.


16-18 år, prognos 2024 och 2025

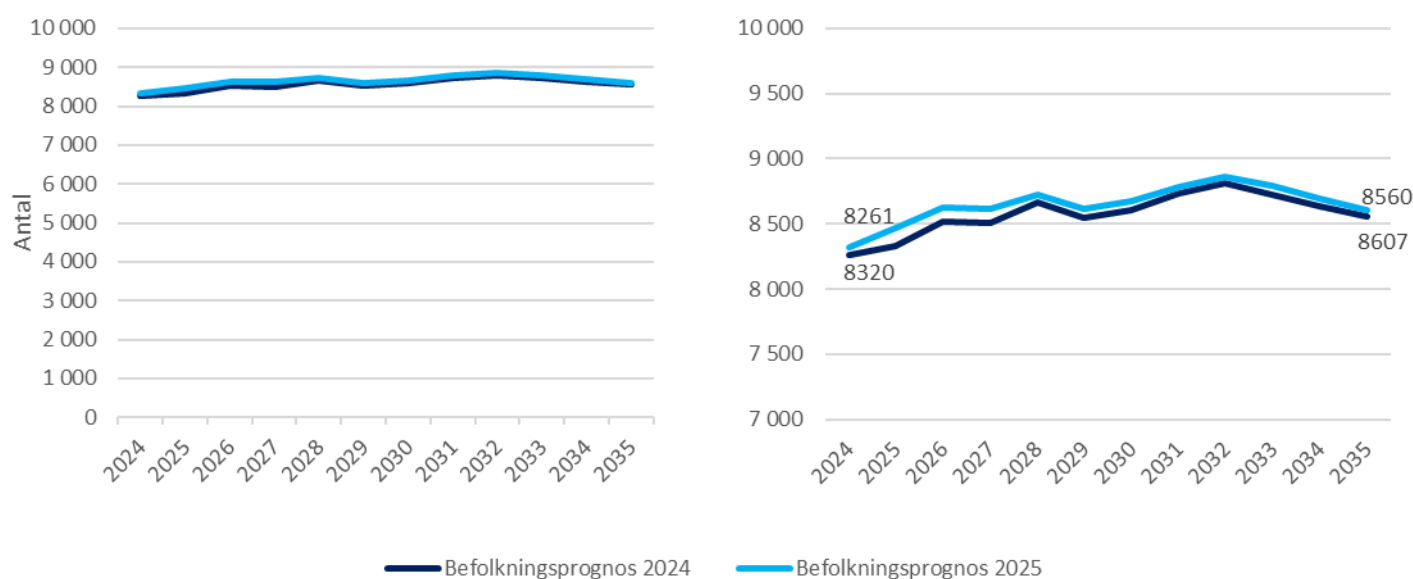

Figur 11. Jämförelse befolkningsprognos 2024 och 2025 för åldersgruppen 16 – 18 år. Bruten axel i det högra diagrammet


Behovet av elevplatser beräknas utifrån befolkningsprognosen med avräkning av elever i särskilda skolformer, till exempel anpassad gymnasieskola. In- och utflöde från och till andra kommuner tas också med i beräkningen.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Eleverna har möjlighet att välja om, börja om och hoppa av. Detta leder till att det finns mer än tre årskullar inne i systemet samtidigt. Antalet elever som går i gymnasieskola i Uppsala kommun ligger därför ofta över 100 procent av befolkningen i åldrarna 16–18 år trots att inte alla ungdomar går en gymnasieutbildning.

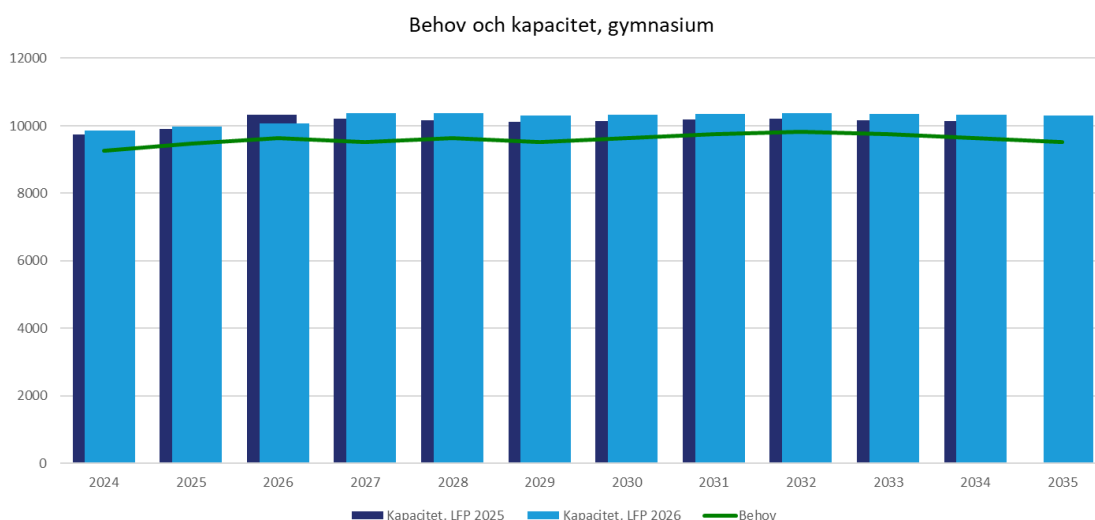

Figur 12. Total kapacitet samt behov i gymnasieskola: Kommunal och fristående.

Drygt 70 procent av dagens cirka 9 800 platser inom gymnasieskolan bedrivs i kommunal regi. I kapacitets- och behovsprognosen beräknas behovet av platser tillgodoses i kommunal regi om inte annat är känt.

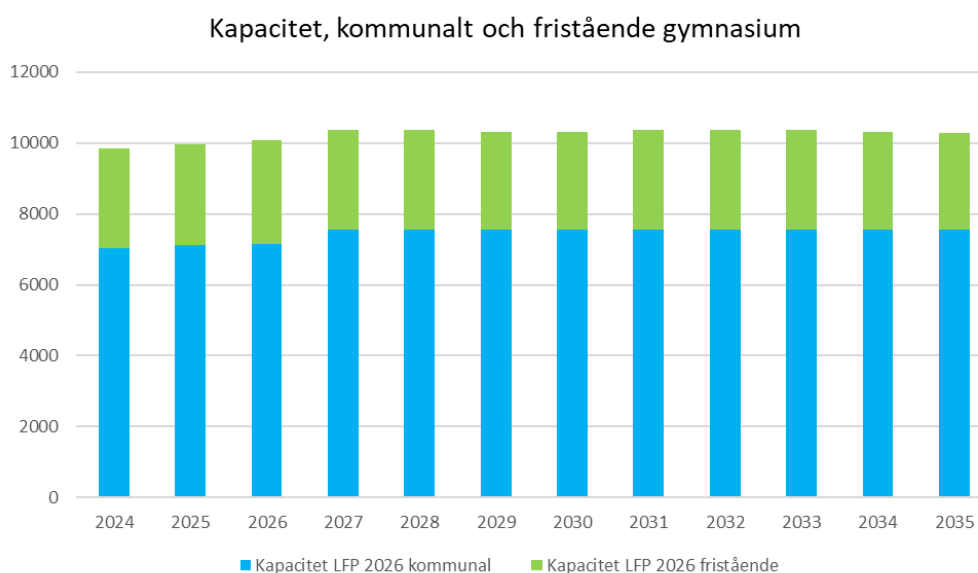

Figur 13. Total kapacitet, kommunal samt fristående gymnasieskola


Befintliga lokalresurser

Gymnasieskolans kapacitet är anpassat till behovet under planperioden. För yrkesutbildningar har gymnasieskolan ett behov av specialiserade lokaler.

Idrottsutbildningarna som erbjuds inom gymnasieskolan har skilda behov av lokaler. Några få utbildningar använder Celsiusskolans idrottshall medan övriga använder idrottsanläggningar. Vissa idrotter behöver specialsalar och speciellt utformade anläggningar som exempelvis golf, BMX, gymnastik, fäktning och simning. Behovet av lokaler och anläggningar beaktas i lokalförsörjningsplanen för idrott och fritid, LFP IFN 2026 (IFN-2025-00102).

Anpassad gymnasieskola

I den anpassade gymnasieskolan finns flera nationella program och ett individuellt program. De nationella programmen är nästan uteslutande yrkesprogram som ska förbereda eleverna för ett yrkesliv och kräver därför ändamålsenliga lokaler för respektive program. Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. Antalet elever i den anpassade gymnasieskolan förväntas öka under 10-årsperioden.

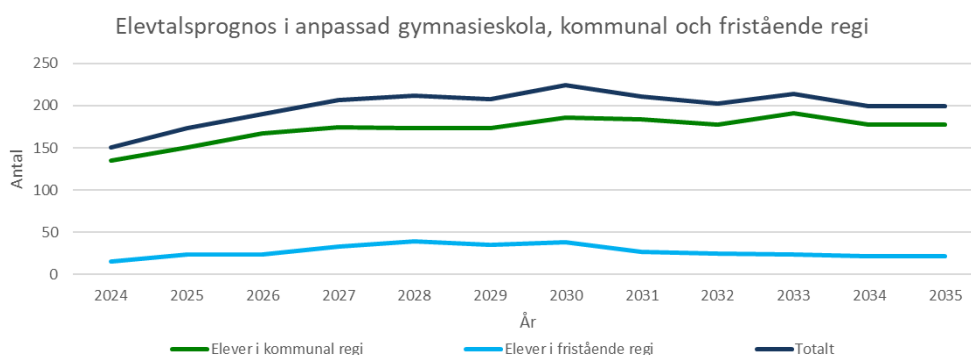

Figur 14. Elevtalsprognos, anpassad gymnasieskola i kommunal samt fristående regi.

Befintliga lokalresurser

Den anpassade gymnasieskolans lokaler är fördelade på två enheter. I den översyn som görs över gymnasiernas lokaler ingår både en möjlighet till utökning samt att se till att elever får tillgång till lokaler med god tillgänglighet.

Samnyttjande

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver flera kommunala verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal.

Sex åtgärder i lokalförsörjningsplanen samnyttjas mellan kommunala nämnder. Det är framför allt lokaler för fritidsklubb som samnyttjas inom grundskolors lokaler. Utöver det gäller även samnyttjande med föreningslivet av flertalet idrottshallar.

Utblick

Stads- och landsbygdsutveckling

2023 fattade kommunfullmäktige beslut om en planeringsstrategi (KSN-2023-01011) för att hålla översiktsplanen från 2016 aktuell. En ny översiktsplan ska vara framtagen till 2028. Planeringsstrategin lyfter att den långsiktiga utbyggnadsinriktningen i Uppsala tätort successivt behöver inriktas på att stödja utvecklingen i de områden som ingår i fyrspårsavtalet, så att förutsättningar finns för de 33 000 bostäderna enligt kommunens åtagande.

Det ekonomiska läget har inneburit att bostadsbyggandet bromsat in i kommunen. I mars 2025 beslutade kommunstyrelsen portföljen för samhällsbyggnadsprojekt 2025 (KSN-2016-2215). Balanseringen av projektportföljen som helhet görs varje år för en 15-årsperiod. Balanseringen 2025 innebär bland annat att tempot generellt skruvas ner. Kommunen prioriterar projekt som ingår i fyrspårsavtalet eller ligger längs med spårvägssträckorna. Det betyder att Rosendal, Ulleråker, Gottsunda/Valsätra, Ultuna och Sydöstra stadsdelarna prioriteras. Utanför staden prioriteras Storröta framför andra program och projekt.

I arbetet har en planeringsram införts för att koncernens investeringar i exempelvis skolor, VA och exploaterbar mark sker i samma takt. I 2025 års balansering är planeringsramen satt till 1500 bostäder per år.

Beredskap för kommande behov

Vid planering av utbyggnation av bostäder i kommunen görs en bedömning av vilket behov av social infrastruktur bostadsbyggnationen genererar. I vilken omfattning och takt bostäderna sedan byggs påverkar när, var och hur behovet uppstår. Planeringen av social infrastruktur behöver alltså, trots långa ledtider, vara anpassningsbar för ändringar i bostadsbyggandet. Det kan exempelvis innebära att skjuta fram projekt eller ett behov av tillfälliga lösningar.

Det ekonomiska läget påverkar lokalförsörjningen utifrån att bostäder inte väntas stå färdiga i den takt som tidigare var planerat. Det kan exempelvis leda till att behovsunderlaget kommer senare för förskolor eller att planerade särskilda bostäder skjuts framåt.

Kommunen måste även ha en beredskap för att kommande befolkningsprognoser ger ett större behov av till exempel förskole- eller skolplatser än vad som finns idag. Behovet av förskoleplatser kan öka relativt snabbt i stadsbyggnadssammanhang varför en viss överkapacitet på totalen ändå måste finnas. Därmed finns även en ekonomisk risk för eventuella tomplatser.

Inom större utbyggnationsområden kan antalet tomplatser bli stort om byggetapperna skjuts fram och nya skollokaler har byggts i etapp 1. Det kan handla om skollokaler med en lägre beläggning under de första åren.

En svårighet inom större utbyggnationsområden kan också vara motsatsen, att antalet platser inte räcker till eftersom planering sker efter ett långsiktigt behov som tenderar att bli lägre än den första puckeln i barnantal som syns redan några år efter inflyttning. Här finns alltså en risk för att vårdnadshavare och deras barn får åka längre än vad kommunens närhetshetsprincip syftar till.

Åtgärder och utredningar

Tabellerna nedan redovisar åtgärder i kommunal regi. En utredning syftar till att utreda hur ett konstaterat behov av lokal ska mötas. Åtgärder avser genomförande och att beställning görs till hyresvärd för att utföra projektet. Genomförandet följer olika processer beroende på fastighetsägare, exempelvis om det är ett kommunalägt bolag eller om en privat hyresvärd.

Det finns olika anledningar till att åtgärder föreslås. Den främsta anledningen till förslag på nyproduktion gäller utökning av antalet bostäder inom ett visst område. Om renovering behövs föreslås åtgärder i lokalförsörjningsplanen i de fall renoveringen är så pass omfattande att evakuering av verksamheten blir nödvändig. Ibland kan då statusen på konstruktionen eller byggnaden visa sig vara så dålig att renovering inte är möjlig. I sådana fall krävs ett nytt beslut om rivning och ersättning alternativt nedläggning.

Nya åtgärder

Förskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd
Boländernas förskola	Renovering. Evakueras till Fålhagsledens moduler HT2026.	Nej	HT 2027
Ringmurens förskola (Sävja)	Förskolan läggs ned. Verksamheten flyttar till nya Uppsävja förskola.	Nej	VT 2027
Sten Stures förskola (Polacksbacken)	Avetablering av moduler. Förskolan läggs ned.	Nej	HT 2027
Ulleråkers förskola	Förskolan läggs ned. Verksamheten har flyttat till Stadsskogens förskola.	Nej	VT 2026

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola.

Nya åtgärder för förskola som inte är inkluderade i Mål och budget 2026

- Ny förskola vid Norra Hovstallängen, preliminär kapacitet 108 platser, färdigställd HT 2032.

Grundskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd
Gränbyskolan	Renovering. Evakuering krävs.	KTN och IFN	HT 2030
Ramsta skola	Renovering. Evakuering från HT 2026.	IFN	HT 2027
Stacken, resursenhet	Renovering. Evakuering alternativt flytt preliminärt 2026.		HT 2027
Stordammens skola	Renovering. Evakuering krävs.		HT 2029
Sunnerstaskolan	Renovering. Evakuering krävs.		VT 2029
Östra Stenhagens skola	Renovering. Evakuering krävs.	IFN	HT 2028

Tabell 2. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för kategori Grundskola.

Nya åtgärder för grundskola som inte är inkluderade i Mål och budget 2026

- Ny grundskola vid Norra Hovstallängen, 630 platser, färdigställd HT 2032.

Anpassad grundskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd
Östra Stenhagen anpassad grundskola	Renovering. Evakuering inom befintliga lokaler.	Nej	HT 2028

Tabell 3. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för anpassad grundskola.

Anpassad gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd
Uppsala Jälla AG	Ny lokal för snickeriverksamhet.	Nej	VT 2027

Tabell 4. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för anpassad gymnasieskola.

Gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd
Uppsala Jälla	Ny lokal för stall.	Nej	VT 2027

Tabell 5. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för gymnasieskola.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar
Almtuna förskola (Fålhagen)	Ny förskola. Ny kapacitet 144 platser.	Nej	VT 2029	
Arkitektens förskola (Vänge)	Avetablering av moduler. Förskolan läggs ned.	Nej	HT 2026	Beslutades av utbildningsnämnden den 20 maj 2025
Bälingeby förskola (Bälinge)	Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 platser.	Nej	VT 2026 HT 2026	Färdigställd juni 2026
Fålhagsledens förskola (Boländerna)	Avetablering av moduler. Förskolan läggs ned.	Nej	HT 2026	Beslutades av utbildningsnämnden den 20 maj 2025
Gåvsta förskola	Permanent ersättning av modulförskolan. Kapacitet 144 platser.	IFN och KTN	HT 2027 HT 2028	Försening i projekt
Hällby förskola (Rickomberga)	Avetablering av moduler. Verksamheten flyttar till Karlavagnens nya förskola.	Nej	HT 2026 VT 2027	Beslutades av utbildningsnämnden den 17 juni 2025
Järlåsa förskola	Permanent ersättning av modulförskolan. Kapacitet 80 platser.	Nej	VT 2027	
Karlavagnens förskola (Studentstaden)	Befintlig förskola rivs, ersätts och utökas. Ny kapacitet 72 platser. Evakuerade till Hemmings förskola. Ny förskola. Kapacitet 72 platser.	Nej	VT 2026 VT 2027	Försening i projekt
Kristallens öppna förskola (Gottsunda)	Nya lokaler i Gottsunda centrum.		HT 2025	Färdigställd december 2025
Källparkens förskola (Sala backe)	Ersätts och utökas. Ny kapacitet 108 platser. Evakuerade till Kamomillens förskola.	Nej	VT 2027 HT 2027	Försening i projekt
Länna förskola	Renovering. Evakuering krävs preliminärt from HT2026.	Nej	VT 2028	
Myrgångens förskola (Nåntuna)	Renoveras. Evakuerade till moduluppställning.	Nej	HT 2025	Färdigställd december 2025
Stenhagens öppna förskola	Förskolan flyttar in i Västra Stenhagens lokaler.	Nej	HT 2026	Beslutades av utbildningsnämnden den 20 maj 2025

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar
Stenhammars förskola (Gottsunda)	Renoveras. Evakuering krävs.	Nej	HT 2026 VT 2027	
Uppsåvja förskola (Bergsbrunna)	Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 platser.	Nej	HT 2026	Färdigställd oktober 2026
Voksenåsens förskola (Flogsta Ekeby)	Renovering. Evakuerade till moduluppställning.	Nej	HT 2025	Färdigställd december 2025
Västra Stenhagens förskola	Förskolan läggs ned och Stenhagens öppna förskola tar över lokalerna.	Nej	HT 2026	Beslutades av utbildningsnämnden den 20 maj 2025

Tabell 6. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för förskola.

Anpassad grundskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar
Gottsunda anpassad grundskola (före detta Eriksberg anpassad grundskola)	Nya lokaler för Eriksberg Gottsunda anpassad grundskola.	IFN	HT 2030	
Årstaskolan anpassad grundskola	Moduluppställning avvecklas.		HT 2027	

Tabell 7. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad grundskola

Grundskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar
Almtunaskolan	Renovering av skolbyggnad och ersättning av kök- och matsalsbyggnad. Evakuerade till Brantingsskolan.	IFN och KTN	VT 2029	
Almunge skola	Renoveras. Evakueras etappvis.	IFN	HT 2029 HT 2030	
Björklunge skola	Renoveras. Evakuering krävs. preliminärt från HT2025.	IFN	HT 2027 HT 2030	Justerad tidplan
Björkvallsskolan	Renoveras. Evakueras etappvis.	IFN och KTN	HT 2026	Färdigställd november 2026
Bälinge Ekebykorset	Ny grundskola. 690 630 platser. Ersätter Bälinge skolas nuvarande lokaler.	IFN och KTN	HT 2029	
Eriksbergsskolan	Renoveras. Renovering/ombyggnation, preliminär kapacitet 420 platser.	IFN och KTN	HT 2030	
Funbo skola	Avetablering av moduluppställning.	Nej	HT 2029 VT 2029	
Gamla Uppsala skola	Permanent ersättning av moduluppställning. 420 platser. Evakuerade till modulerna på Gränby sportfält.	IFN och KTN	HT 2028	
Gävsta skola	Renovering /ombyggnation av befintlig skolbyggnad och permanent ersättning av moduluppställning. Utökning av antalet elevplatser. Evakuering krävs.	IFN och KTN	HT 2030	Utredningen inom projektet visar ett behov av omfattande ombyggnation.
Storvretaskolan	Renoveras. Etappvis evakuering till modulerna vid Ärentunaskolan krävs preliminärt från HT2026.	IFN	HT 2028	

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar
Sverkerskolan	Förbättra ändamålsenligheten i Sverkers lokaler på Götgatan i samband med ombyggnation av Götgatan (fd Fyrisskolan).	Nej	HT 2026 VT 2027	Försening i projekt.
Tuna skola	Renovering. Evakuering krävs.	IFN	HT 2025 HT 2027	
Västra Stenhagenskolan	Anpassningar av lokaler för utökat högstadium. Renovering. Evakuering krävs.	IFN och KTN	VT 2026 VT 2027	Golvrenovering pågår. Evakuering har visat sig behövas.
Årstaskolan	Moduluppställning avvecklas.	KTN	HT 2027	
Ärentunaskolan	Renoveras. Evakueras etappvis.	IFN och KTN	HT 2026	

Tabell 8. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för grundskola.

Anpassad gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar
Uppsala AG, Fyris	Tillgänglighetsanpassningar på Götgatan för Uppsala AG.	Nej	HT 2026 VT 2027	Försening i projekt
Uppsala AG, Jälla	Permanent ersättning av moduluppställning.	Nej	HT 2029	

Tabell 9. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad gymnasieskola.

Gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar
Ekebygymnasiet	Avveckling av Ekebygymnasiet genom flytt av verksamheten till Götgatan (fd Fyrisskolan).	Nej	HT 2026 VT 2027	Försening i projekt
Götgatan (fd Fyrisskolan)	Ombyggnation av fd Fyrisskolan för anpassning till Restaurang- och livsmedelsprogrammet	Nej	HT 2026 VT 2027	Försening i projekt
Katedralskolan	Utbyggnad av matsal	Nej	VT 2026	
Uppsala Jälla expeditionshuset	Renovering och anpassning av expeditionshuset		VT 2027	

Tabell 10. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för gymnasieskola.

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utredas ytterligare eller utgå

Förskola

Åtgärd	Förklaring	Koppling till annan LFP
Flöjtens förskola (Gottsunda), renovering	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej
Glimmerms förskola (Eriksberg), renovering	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej
Ulleråker, hus 65, Ny förskola i hus 65. Kapacitet 144 platser.	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej

Tabell 11. Beslutade åtgärder för förskola i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.

Grundskola

Åtgärd	Förklaring	Koppling till annan LFP
Järlåsa skola, Nybyggnation av kök och matsal i samband med nybyggnation av förskola. Ev. utökning.	Åtgärden utgår. Endast underhållsrenovering som inte kräver evakuering.	KTN
Ulleråker grundskola, Ombyggnation till grundskola	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej

Tabell 12. Beslutade åtgärder för grundskola i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.

Utredningar

Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar.

Nya utredningar

Förskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Norby-Eriksberg-Flogsta:</i> Glimmerms förskola (Eriksberg) renoveras. Evakuering krävs.	Nej	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Ny förskola i Ulleråker, hus 65. Kapacitet 144 platser.	Ja	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Flöjtens förskola (Gottsunda), renoveras. Evakuering krävs.	Nej	

Tabell 13. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Bälinge – Björklinge:</i> Skuttunge skola renoveras. Evakuering krävs.	Nej	
<i>Centrala staden-Fålhagen:</i> Nannaskolan utökar i lokaler som kulturskolan lämnar.	Nej	KTN
<i>Gunsta – Länna – Almunge – Knutby:</i> Knutby skola renoveras. Evakuering krävs.	Nej	
<i>Ramstalund – Vänge – Järlåsa</i> Renovering av idrottshall, kök och matsal vid Vänge skola.	Nej	IFN
<i>Sala backe-Årsta-Vaksalabygden:</i> Palmladsskolan renoveras. Evakuering krävs.	Nej	
<i>Storvreta-Vattholma-Skyttorp:</i> Pluggparadiset renoveras. Evakuering krävs.	Nej	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Ombyggnation av Kronåsens skola (Lundellska skolans förra lokaler).	Ja	

Tabell 14. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Gymnasieskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Kommunövergripande</i> Utred nytt elevhem för gymnasieskolan	Nej	Nej

Tabell 15. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan.

Tidigare beslutade utredningar

Förskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Bälinge-Björklinge:</i> Ny förskola i Bälinge. 108 platser.	Ja	
<i>Centrala staden-Fålhagen:</i> Botulvs förskola, ersätts och utökas. 108 platser	Nej	
<i>Centrala staden-Fålhagen:</i> Ny förskola vid Kv Hugin. 72 platser. Ev inhyrning.	Nej	
<i>Gunsta-Länna-Almunge-Knutby:</i> Ny förskola i Almunge	Nej	
<i>Gunsta-Länna-Almunge-Knutby:</i> Ny förskola i Länna. 72 platser. Ev inhyrning.	Ja	
<i>Gunsta-Länna-Almunge-Knutby:</i> Renovering och evakuering av Lillgärdets förskola.	Nej	
<i>Gunsta-Länna-Almunge-Knutby:</i> Södra Gunsta, etapp 2, ny förskola, 108 platser.	Ja	

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Kommunövergripande:</i> Utred eventuell utökning av öppna förskolor i koordinering med regionens utökning av antalet familjecentraler.	Ja	AMN och SCN
<i>Luthagen-Stenhagen:</i> Nya förskolor i Börjetull/Libroback. Ev inhyrningar.	Nej	
<i>Norby-Eriksberg-Flogsta:</i> Ny förskola vid Hammarparken. 72 platser. Ev inhyrning	Nej	
<i>Norby-Eriksberg-Flogsta:</i> Nyproduktion av Silikatets förskola	Nej	
<i>Norby-Eriksberg-Flogsta:</i> Ytterligare förskolor i Rosendal.	Nej	
<i>Sala backe-Årsta-Vaksalabygden:</i> Ny förskola i Östra Salabacke etapp 3. 72 platser. Ev inhyrning.	Nej	
<i>Sala backe-Årsta-Vaksalabygden:</i> Ytterligare förskoleplatser i Skölsta	Nej	
<i>Sala backe-Årsta-Vaksalabygden:</i> Årsta skoltomt, ny förskola 108 platser	Nej	
<i>Storvreta-Vattholma-Skyttorp:</i> Nya förskolor i Södra Storvreta. 144 platser vardera.	Ja	
<i>Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala:</i> Ny förskola i Gränbystaden. 72 platser. Ev inhyrning.	Nej	
<i>Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala:</i> Ny förskola i Tuna backar.	Nej	
<i>Sävja-Bergsbrunna-Danmark:</i> Nya förskolor i Sydöstra staden som följer bostadsutbyggnaden.	Ja	
<i>Sävja-Bergsbrunna-Danmark:</i> Renovering/ombyggnation av Ringmurens förskola	Nej	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Nya förskolor i Gottsunda-Valsätraområdet som följer bostadsutbyggnaden.	Ja	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Nya förskolor i Ulleråker.	Ja	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Nya förskolor i Ultuna.	Ja	

Tabell 16. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.

Anpassad grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Kommunövergripande:</i> Ytterligare utökning av anpassad grundskola	Nej	
<i>Sävja-Bergsbrunna-Danmark:</i> Ny anpassad grundskola vid Uppsävjaskolan	Nej	

Tabell 17. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.

Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Bälinge-Björklinge:</i> Nybyggnation Bälinge skola.	Nej	IFN och KTN
<i>Gunsta-Länna-Almunge-Knutby:</i> Ny grundskola i Gunsta.	Nej	IFN och KTN
<i>Norby-Eriksberg-Flogsta:</i> Renovering av Flogstaskolan.	Nej	IFN
<i>Sala backe-Årsta-Vaksalabygden:</i> Utökning av Årstaskolan inklusive anpassad grundskola.	Nej	KTN
<i>Storvreta-Vattholma-Skyttorp:</i> Ny grundskola i Södra Storvreta.	Ja	IFN och KTN
<i>Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala:</i> Renovering alternativt ersättning av Fredrika Bremerskolan.	Nej	IFN och KTN
<i>Svartbäcken-Gränby-Gamla Uppsala:</i> Renovering av Tunabergsskolan.	Nej	
<i>Sävja-Bergsbrunna-Danmark:</i> Nya grundskoleplatser i Sydöstra staden som följer bostadsutbyggnaden	Ja	IFN och KTN
<i>Sävja-Bergsbrunna-Danmark:</i> Nåntunaskolan utreds för utbyggnation till tvåparallellig F - 6, 420 platser.	Nej	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Ny grundskola i Södra Ulleråker	Ja	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Ny grundskola i Ultuna	Ja	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Nyproduktion av Treklängens skola	Nej	
<i>Valsätra-Gottsunda-Sunnersta:</i> Renovering av Valsätraskolan	Nej	IFN

Tabell 18. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.

Gymnasieskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
<i>Kommunövergripande:</i> Ny gymnasieenhet	Ja	
<i>Kommunövergripande:</i> Utveckling av Jälla skolområde på lång sikt.	Nej	

Tabell 19. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.

Uppföljning av utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande ersättning av Fålhagsledens förskola utgår på grund av minskat behov.
- Utredning gällande nyttjande av öppna förskolans lokaler i Disponentvillan utgår eftersom tydligare fördelning mellan samnyttjande parter av befintliga lokalytor har gjorts.
- Utredning gällande ersättning av Hällbys förskola utgår på grund av minskat behov.
- Utredning gällande utökning av Västra Stenhagens förskola utgår på grund av minskat behov.
- Utredning gällande ersättning av Sten Stures förskola utgår på grund av minskat behov.
- Utredning gällande ersättning av Arkitektens förskola utgår på grund av minskat behov samt höga kostnader.
- Utredning gällande ny förskola i Skyttorp utgår på grund av minskat bostadsbyggande.
- Utredning gällande nya Kullens förskola utgår på grund av minskat behov.
- Utredning gällande utökning av Växthuset III och Lilla Valsätra/Bäcklösaskolan utgår på grund av minskat behov.

Ekonomi- och kostnadsutveckling

Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera sätt. Investeringsmedel behövs för att bekosta åtgärder i de fastigheter där kommunkoncernen är fastighetsägare. Investeringsmedel behövs också för nämnden då det gäller verksamhetens behov av exempelvis möbler. Det behöver även säkerställas att utbildningsnämnden både har medel för hyra och för att driva verksamheten. Beräkningarna av kostnader sker antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, tex hyra per kvadratmeter.

Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär:

- 3 096 miljoner kronor i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 476 miljoner kr är för nya åtgärder
- 141 miljoner kronor i investeringar för utbildningsnämnden, varav 25 miljoner kronor är för nya åtgärder
- 107 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för utbildningsnämnden huvudsakligen beroende på nya och tidigare beslutade åtgärder gällande nyproduktion och renovering. Nya åtgärder innebär en ökning på 11 miljoner kronor. Bland annat eftersom lokaler lämnas och nya åtgärder gällande renoveringar som får hyreseffekt för utbildningsnämnden.

Till detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna.

De ekonomiska konsekvenserna stäms löpande av i arbetet med Mål och budget.

Kommande investerings- och hyreskostnader för lokaler som kan komma av pågående utredningar är inte inkluderade i beräkningarna om det inte särskilt anges annat.

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning för åtgärder i kommunkoncernens fastighetsbestånd och verksamhetsnära investeringar i inventarier för nämnden.

Investeringar i kommunkoncernen										
Belopp i miljoner kronor	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Nya föreslagna åtgärder</i>										
Förskola	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	48,0	66,0	127,0	108,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad gymnasieskola	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma	75,0	76,0	127,0	108,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsnära investeringar	0,0	5,8	2,1	8,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nya åtgärder	75,0	81,8	129,1	116,1	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tidigare beslutade åtgärder</i>										
Förskola	272,0	127,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	308,2	397,3	555,4	545,0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	85,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad gymnasieskola	59,5	51,6	66,7	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma	724,6	581,1	653,0	554,3	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsnära investeringar	19,3	18,5	17,1	46,5	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa tidigare beslutade åtgärder	743,9	599,6	670,1	600,8	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalsumma	818,9	681,4	799,2	716,9	221,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav fastighetsinvestering	799,6	657,1	780,0	662,3	197,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav verksamhetsnära investering	19,3	24,3	19,2	54,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabell 20. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och verksamhetsnära investering för nämnden i form av inventarier. Investeringarna är angivna i antaget prisläge 2025 och är inte indexerade.

Vissa åtgärder togs bort efter inlämning till Mål och budget 2026. Investeringar kan i stället komma att användas för åtgärder som ligger utanför Mål och budget 2026.

Fastighetsinvestering per barn/elev										
Belopp i kronor										
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Förskola	35 602	17 501	4 036	0	0	0	0	0	0	0
Grundskola	15 899	20 870	30 676	29 594	9 000	0	0	0	0	0
Gymnasieskola	17 534	905	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalsumma	69 035	39 277	34 711	29 594	9 000	0	0	0	0	0

Tabell 21. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och verksamhetsnära investering för nämnden i form av inventarier.

Hyreskostnad och verksamhetsekonomi

Hyra

Bedömning av hyreseffekter för åtgärder i lokalförsörjningsplanen, både nya och tidigare beslutade åtgärder.

Hyresförändringar										
Belopp i miljoner kronor	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Nya föreslagna åtgärder</i>										
Förskola	-0,3	-1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	0,0	1,1	1,9	3,2	3,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad gymnasieskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma	-0,3	0,2	2,1	3,2	3,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tidigare beslutade åtgärder</i>										
Förskola	-3,1	-1,2	-6,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	12,0	6,8	4,4	34,7	23,6	14,8	0,0	0,0	-8,4	-8,4
Gymnasieskola	1,5	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola	0,0	-3,5	-3,5	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassad gymnasieskola	0,0	1,5	-0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma	10,4	23,5	-6,0	40,4	26,9	18,2	0,0	0,0	-8,4	-8,4
Totalsumma	10,1	23,7	-3,9	43,6	30,0	20,9	0,0	0,0	-8,4	-8,4

Tabell 22. Hyresförändring för nämnden till följd av åtgärder i lokalförsörjningsplanen, är angivna i antaget prisläge för året för åtgärden.

Total hyreskostnad inklusive hyresändringar, med index											
Belopp i miljoner kronor	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Förskola	236	237	239	237	246	251	256	261	266	271	277
Grundskola	490	511	530	546	595	634	664	677	691	696	702
Gymnasieskola	168	173	197	201	205	209	213	218	222	226	231
Anpassad grundskola	16	17	13	10	10	14	18	18	18	19	19
Anpassad gymnasieskola	9	9	11	11	13	14	14	14	14	15	15
Totalsumma	919	947	990	1006	1070	1121	1164	1188	1211	1227	1243

Tabell 23. Total hyreskostnad för nämnden, inklusive hyresförändringar. Hyran är indexerad.

Total hyreskostnad inklusive hyresändringar, utan index											
Belopp i miljoner kronor	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Förskola	236	233	230	223	227	227	227	227	227	227	227
Grundskola	490	502	510	516	554	580	598	598	598	589	581
Gymnasieskola	168	169	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Anpassad grundskola	16	16	13	9	9	13	16	16	16	16	16
Anpassad gymnasieskola	9	9	11	10	12	12	12	12	12	12	12
Totalsumma	919	929	953	949	992	1022	1043	1043	1043	1035	1026

Tabell 24. Total hyreskostnad för nämnden, inklusive hyresförändringar. Hyran för befintligt bestånd är inte indexerad. Hyresförändringar är angivna i antaget prisläge för året för åtgärden.

Hyreskostnad per barn/elev Belopp i tusen kronor											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Förskola	29,8	30,3	31,1	30,9	31,9	32,2	32,3	32,4	32,3	32,1	32,1
Grundskola	61,8	65,3	68,9	71,1	77,2	81,3	83,9	84,0	83,9	82,4	81,3
Gymnasieskola	21,2	22,1	25,6	26,1	26,6	26,8	27,0	27,0	26,9	26,8	26,7
Totalsumma	112,8	117,6	125,7	128,1	135,7	140,2	143,2	143,4	143,1	141,3	140,0

Tabell 25. Total hyreskostnad per barn/elev. Tabellen utgår ifrån befolkningsprognosen och andelen barn/elever som går i kommunal verksamhet. Hyreskostnaden är ungefärlig och beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner.

Ekonomisk utblick

Kostnadsnivån i nyproduktion har stigit de senaste åren och riskerar att under rådande byggkonjunktur fortsatt ligga på en hög nivå. Om de åtgärder som planen omfattar ska klaras inom investeringsramen i Mål och budget ställs höga krav på en effektiv projekterings- och byggprocess.

Hyrorna inom utbildningsnämnden har ökat under många år och tar idag en jämförelsevis stor del av den totala verksamhetsersättningen.

Hyreskostnadens andel av ersättning per barn och elev (grundbelopp och strukturersättning) har ökat inom alla skolformer under de senaste åren. Inom förskola har den budgeterade hyreskostnadens andel av ersättning per barn ökat med 6,2 procentenheter under perioden 2020 – 2025. Inom grundskola är motsvarande ökning 2,7 procentenheter och inom gymnasieskolan 3,0 procentenheter.

Under perioden har antal barn i förskoleålder minskat samtidigt som nya lokaler har högre hyra än snitthyran per barn. Först år 2031 kommer antalet barn i förskolan att vara på samma nivå som år 2024 enligt den senaste befolkningsprognosen från maj 2025. Grundskolan har haft en svag ökning av antal elever fram till 2024. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet elever i grundskolan att bli färre fram till år 2035. Därefter blir eleverna fler igen och når samma nivå som idag ca år 2041. Samtidigt färdigställs nya skolor enligt tidigare planer. Dessa lokaler har högre hyra än snitthyran per elev. Enligt samma prognos kommer antalet elever inom gymnasieskolan att öka fram till 2032.

I Mål och budget ges ett ägardirektiv till Uppsala kommun Skolfastigheter AB att tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för samnyttjade, effektiva och långsiktigt hållbara lokallösningar. Bolaget ska ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet som främjar jämlika livsvillkor och likvärdig skola med konkurrenskraftiga hyror.

När helt nya förskolor och skolor planeras ska det finnas möjlighet att pröva nya koncept för en mer kostnadseffektiv byggprocess. Även om nya möjligheter realiserar kommer hyreskostnaden per barn och elev fortsätta att öka i och med att andelen nya lokaler ökar i förhållande till befintliga lokaler med låg hyra.

Nyckeltal

Hyreskostnad per kvm											
Belopp i kronor											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Förskola	1 790	1 806	1 777	1 730	1 739	1 739	1 739	1 725	1 725	1 725	1 725
Grundskola	1 999	2 048	2 120	2 106	2 218	2 239	2 306	2 247	2 247	2 286	2 253
Gymnasieskola	2 373	2 566	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
Anpassad grundskola	2 391	2 391	2 053	1 496	1 496	1 670	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
Anpassad gymnasieskola	2 875	3 273	3 338	4 221	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715
Snittkostnad per kvm (samtliga kategorier)	2009	2068	2141	2115	2178	2191	2236	2199	2199	2219	2201

Tabell 26. Tabellen visar skolformernas hyreskostnad per kvadratmeter i kommunal verksamhet. Hyreskostnaden är ungefärlig och beräknad utifrån hyresindikationer och schabloner.

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning

För respektive område redovisas befintligt bestånd samt åtgärder och utredningar för förskola och grundskola.


- Bälinge – Björklinge
- Centrala staden – Fålhagen
- Gunsta – Länna – Almunge – Knutby
- Gävsta- Stavby – Tuna
- Luthagen – Stenhagen
- Norby – Eriksberg – Flogsta
- Ramstalund – Vänge – Järlåsa
- Sala backe – Årsta – Vaksalabygden
- Storvreta – Vattholma – Skyttorp
- Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala
- Sävja – Bergsbrunna – Danmark
- Valsätra – Gottsunda – Sunnersta



Bälinge – Björklinge

Börje – Jumkil – Åkerlänna

Befintliga lokaler

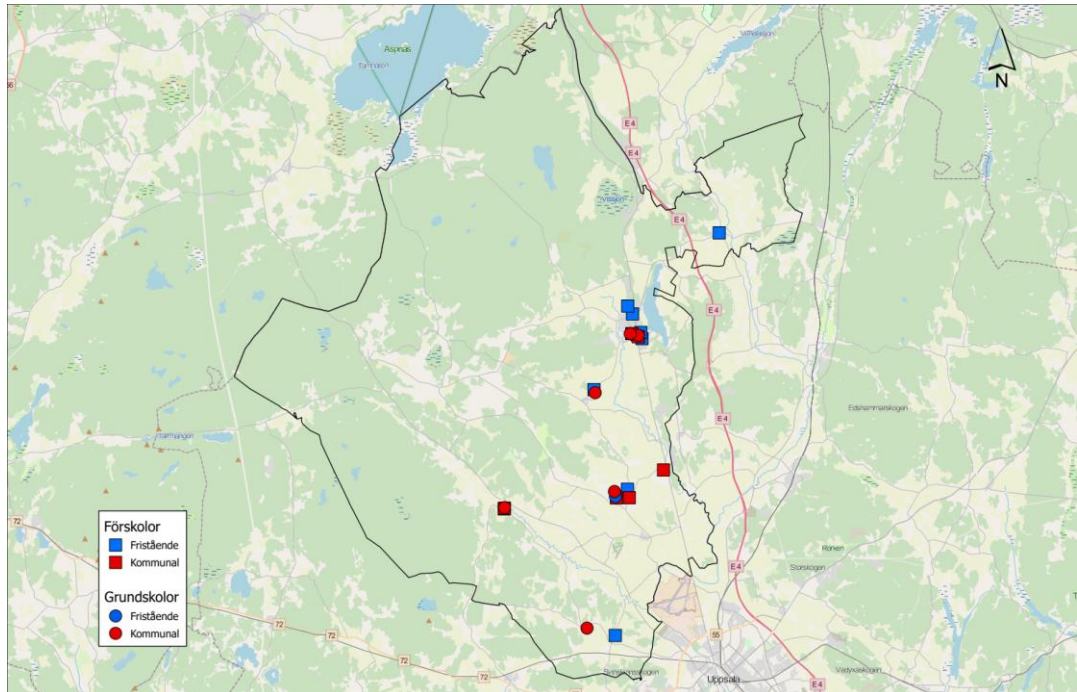

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg - kommunal

Björklinge familjedaghem
Bälingeby förskola (evakuerade till Klockarbols förskola)
Jumkils familjedaghem
Jumkils förskola
Klockarbols förskola
Lövstalöts förskola
Ramsjö förskola
Åkerlänna familjedaghem

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående

Förskolan Barnasinn
Förskolan Björkängen
Björklinge förskola
Börjans förskola
Ekoxen dagbarnvårdare
Förskolan Villa Lära
Hagmarkens förskola
Lill-Skutts förskola
Skrindans förskola
Solstugans förskola

Grundskola - kommunal

Björklinge skola
Björkvallsskolan
Bälinge skola
Börje skola
Jumkils skola
Skuttunge skola



Grundskola - fristående

Hagmarkens Skola

Utveckling behov och kapacitet

Björklinge respektive Bälinge/Lövstalöt är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Planarbete pågår för fler bostäder i Bälinge och i Björklinge. Utbyggnaden i området bedöms på lång sikt leda till ökat behov av för- och grundskola trots att takten på bostadsbyggandet bromsat in.

Förskola

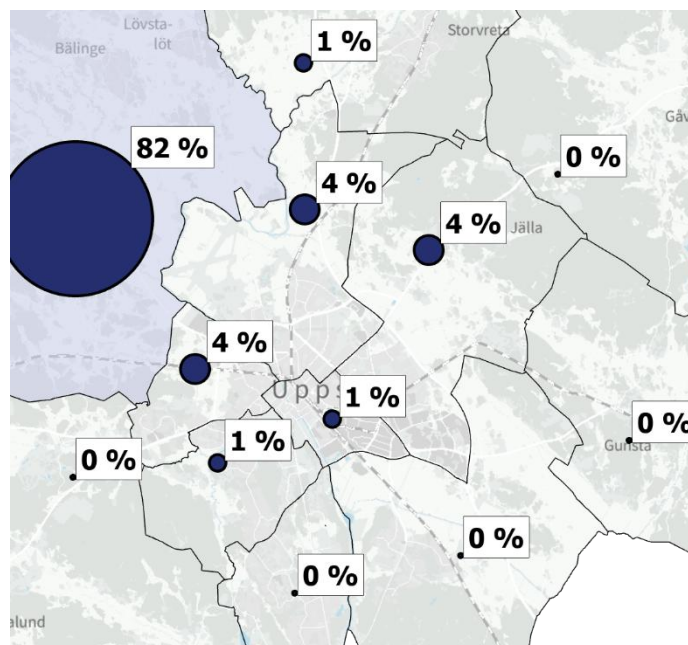
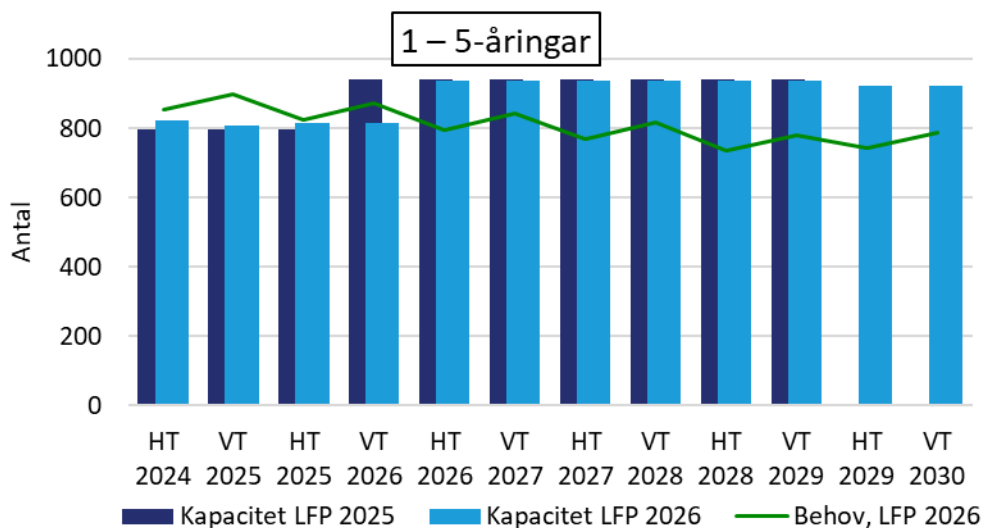


Figur 15 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Bälunge – Björklinge och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 809 platser används 770 av barn boende i området i maj.

Grundskola

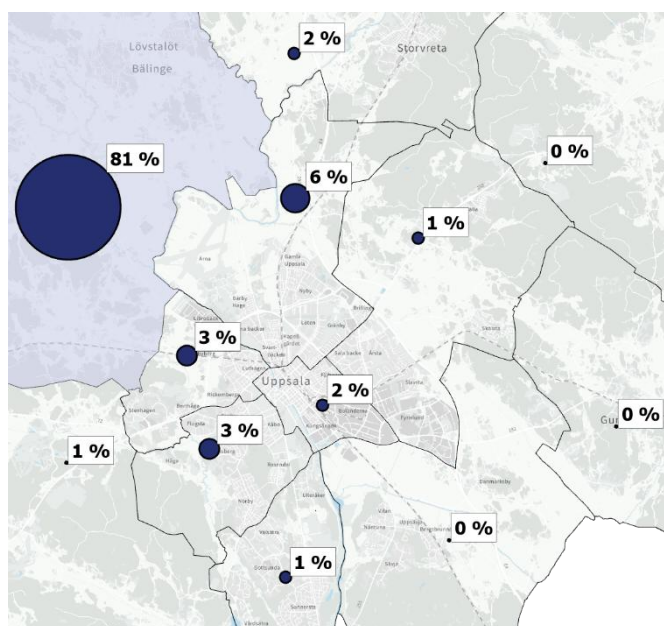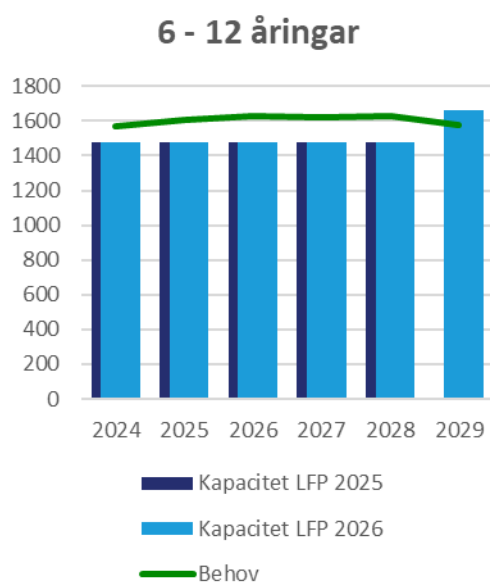

Figur 16 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Bälunge – Björklunge och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 476 platser användes 1 308 av barn boende i området i april.

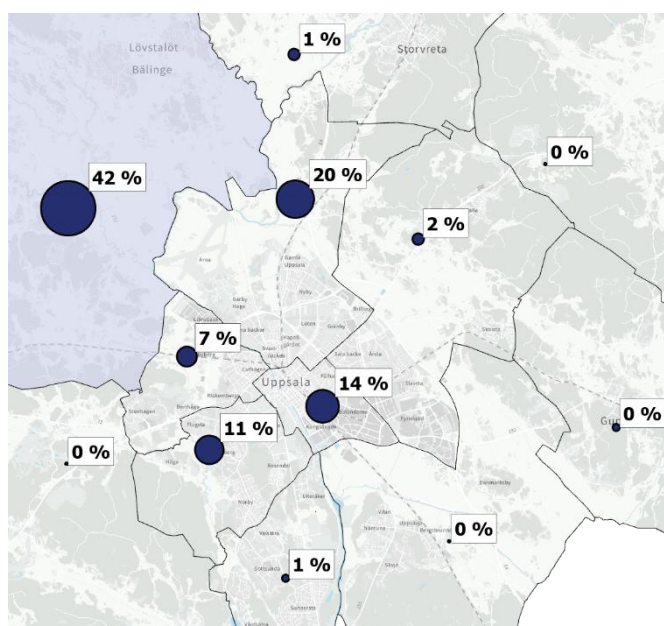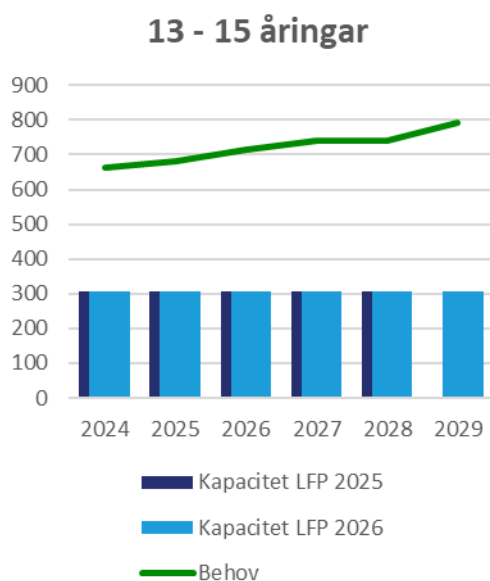

Figur 17 Diagrammet visar antalet 13–15 åringar som bor i Bälunge – Björklunge och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet på 308 platser användes 276 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

—

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Bälingeby förskola (Bälinge)	Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 platser.												
	144	144											
Totalt	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 27. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Bälinge – Björklinge.

Grundskola	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Björklinge skola	Renoveras. Evakuering krävs. preliminärt från HT2025.							
		±0			±0			
Björkvallsskolan	Renoveras. Evakueras etappvis. Preliminär tidsplan för färdigställande.							
	0							
Bälinge Ekebykorset	Ny grundskola. 690 630 platser. Ersätter Bälinge skolas nuvarande lokaler.							
				204				
Totalt	0	0	0	204	0	0	0	0

Tabell 28. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Bälinge – Björklinge.

Utredningar*Förskola*

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Ny förskola i Bälinge. 108 platser.	Ja	—

Tabell 29. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Bälinge – Björklinge.

Grundskola


Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Nybyggnation Bälinge skola.	Nej	IFN
Skuttunge skola renoveras. Evakuering krävs.	Nej	—

Tabell 30. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Bälinge – Björklinge.

Centrala staden - Fålhagen

Kungsängen - Boländerna

Befintliga lokaler

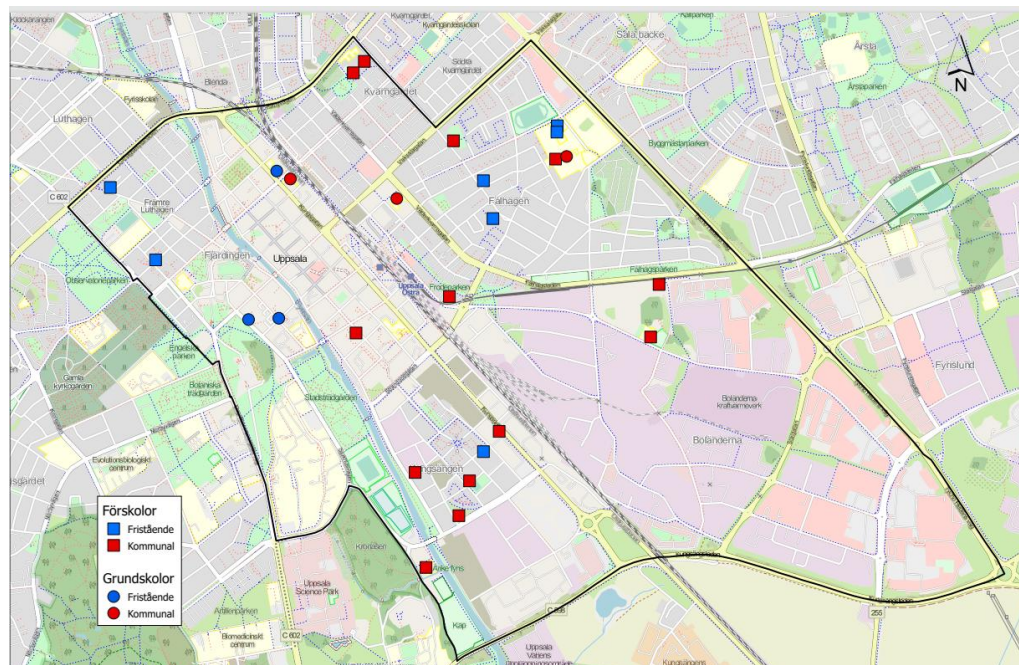

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Boländernas förskola
 Botulvs förskola
 Frodeparkens förskola
 Fålhagsledens förskola
 Gudruns förskola
 Höganäs förskola
 Kungsängens förskola
 Petterslunds förskola
 Skyttelns förskola
 Sten Stures förskola
 Tallens förskola
 Årikets förskola
 Åsiktens förskola

Grundskola – kommunal

Almtunaskolan (evakuerade till
 Brantingsskolan)
 Nannaskolan
 Vaksalaskolan

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Barnhagens förskola
 Björkhagens förskola
 Dibber S:t Johannes förskola
 Familjedaghemmet Humlan, Ekoxen
 Iors förskola
 Plantans förskola
 Vildrosens förskola

Grundskola – fristående

Katarinaskolan
 Magelungen Uppsala
 Raoul Wallenbergskolan



Utveckling behov och kapacitet

Nybyggnation av bostäder i Centrala staden – Fålhagen sker främst genom utveckling av Kungsängen, kvarteret Hugin och viss förtätning i andra delar. Nya förskolor möjliggörs bland annat inom detaljplaner för kvarteret Hugin samt inom Ångkvarnen och Kungsängen.

I Norra Hovstallängen i Kungsängen, där det tidigare låg en bussdepå, föreslås bland annat förskola och grundskola möjliggöras.

Redovisade åtgärder avses kunna täcka såväl ett behov av nya platser på grund av bostadsutbyggnad i området samt tillgodose brist av platser i centrala delarna av Uppsala.



Förskola

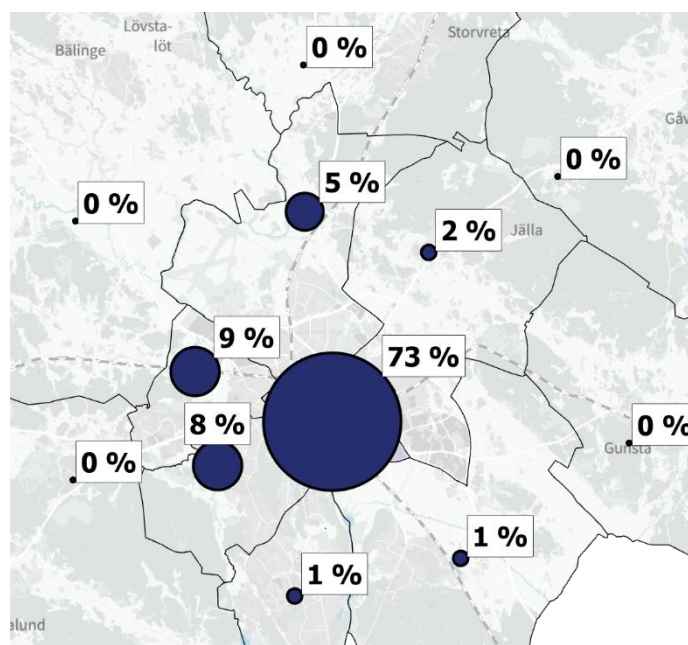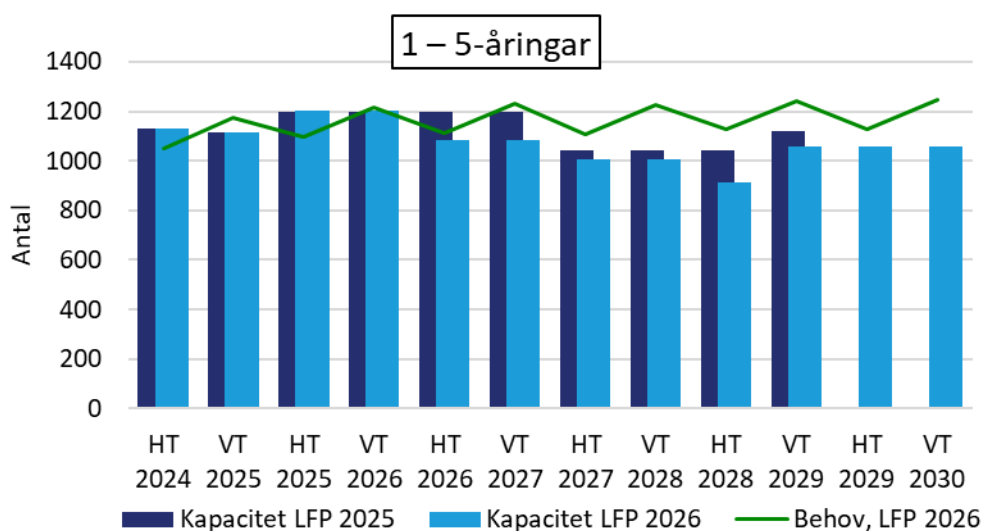

Figur 18 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Centrala staden - Fålhagen och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 1 116 platser används 699 av barn boende i området i maj.

Grundskola

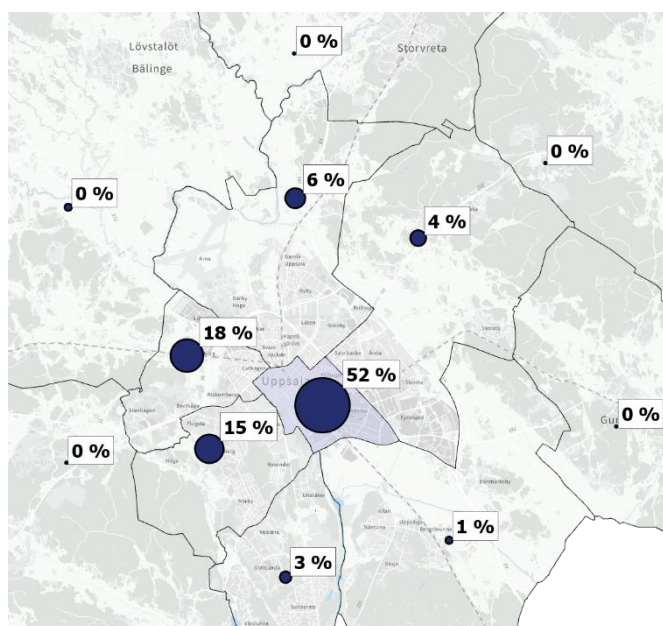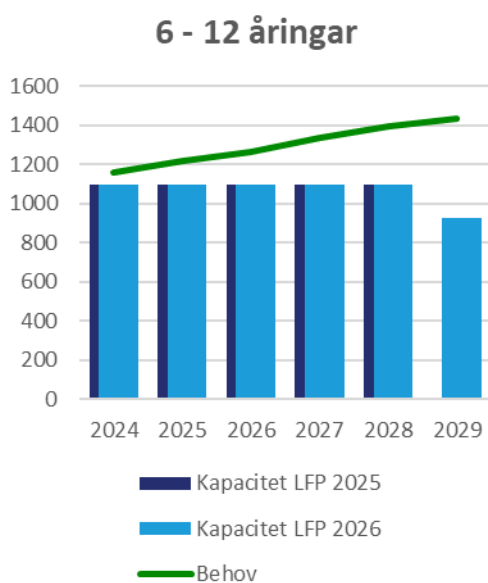

Figur 19 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Centrala staden - Fålhagen och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 094 platser användes 561 av barn boende i området i april.

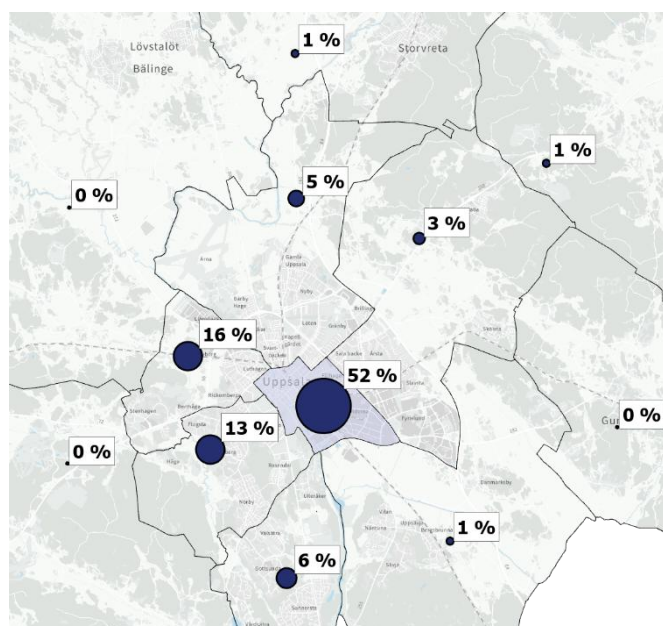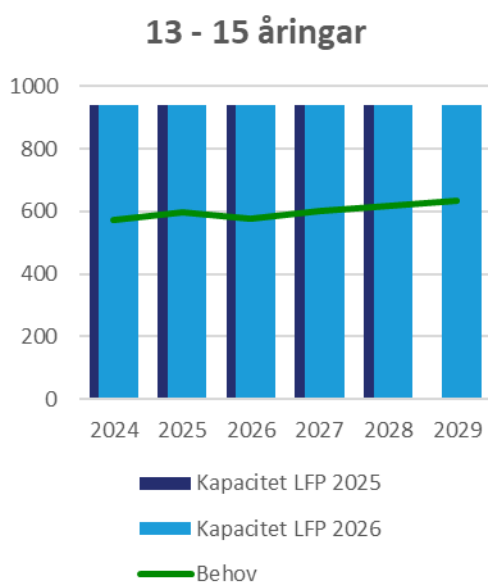

Figur 20 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Centrala staden - Fålhagen och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 941 platser användes 290 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Boländernas förskola	Renovering. Evakuering krävs.												
				±0									
Sten Stures förskola (Polacksbacken)	Avetablering av moduler. Förskolan läggs ned.												
				-76									
Totalt	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 31. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Centrala staden - Fålhagen.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Norra Hovstallängen	Ny grundskola. 630 platser.							
							630	
Totalt	0	0	0	0	0	0	630	0

Tabell 32. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Centrala staden - Fålhagen.

Nya åtgärder som inte är inkluderade i Mål och budget 2026

- Ny förskola vid Norra Hovstallängen, preliminär kapacitet 108 platser, färdigställd HT 2032.
- Ny grundskola vid Norra Hovstallängen, 630 platser, färdigställd HT 2032.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Almtuna förskola (Fålhagen)	Ny förskola. Ny kapacitet 144 platser.												
							144						
Fålhagsledens förskola (Boländerna)	Avetablering av moduler och förskolan läggs ned												
		-75											
Totalt	0	-75	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0

Tabell 33. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Centrala staden - Fålhagen.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2033	2034- 2035
Almtunaskolan	Renovering av skolbyggnad och ersättning av kök- och matsalsbyggnad. Evakuerade till Brantingsskolan.							
				-186				
Totalt	0	0	0	-186	0	0	0	0

Tabell 34. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Centrala staden - Fålhagen.

Utredningar*Förskola*

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Botulvs förskola, ersätts och utökas. 108 platser	Nej	—
Ny förskola vid Kv Hugin. 72 platser. Ev inhyrning.	Nej	—

Tabell 35. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Centrala staden - Fålhagen.

Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Nannaskolan utökar i lokaler som kulturskolan lämnar.	Nej	KTN


Tabell 36. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Centrala staden - Fålhagen.

Beslutade utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande ersättning av Fålhagsledens förskola utgår på grund av minskat behov.
- Utredning gällande ersättning av Sten Stures förskola utgår på grund av minskat behov.

Gunsta – Länna – Almunge – Knutby

Befintliga lokaler

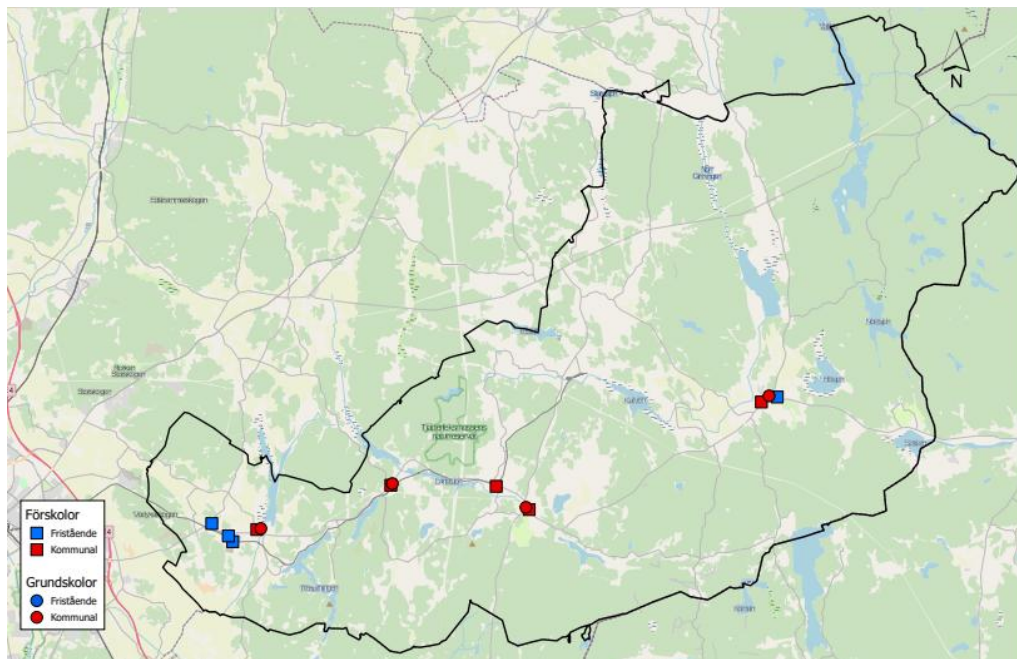

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Almunge förskola
Funbo förskola
Lillgårdets förskola
Lustigkullens förskola
Länna förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Ekoxens dagbarnvårdare Funbo
JENSEN förskola Gunsta
Kråkskogens förskola
Regnbågen pedagogisk omsorg
Sjumilaskogens förskola



Grundskola – kommunal

Almunge skola
Funbo skola
Knutby skola
Länna skola

Utveckling behov och kapacitet

Gunsta, Länna, Almunge och Knutby är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Planarbete för bostäder pågår i flera av orterna. Utbyggnaden av framför allt Gunsta bedöms leda till ett behov av förskole- och grundskoleplatser. Befolkningsutvecklingen för barn i området bedöms dock bli lägre än tidigare eftersom bostadsbyggandet har bromsat in.

Förskola

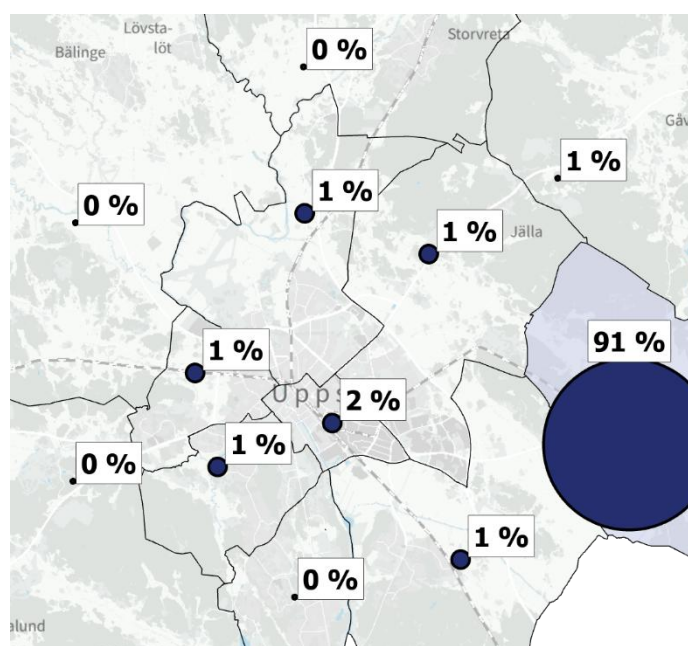
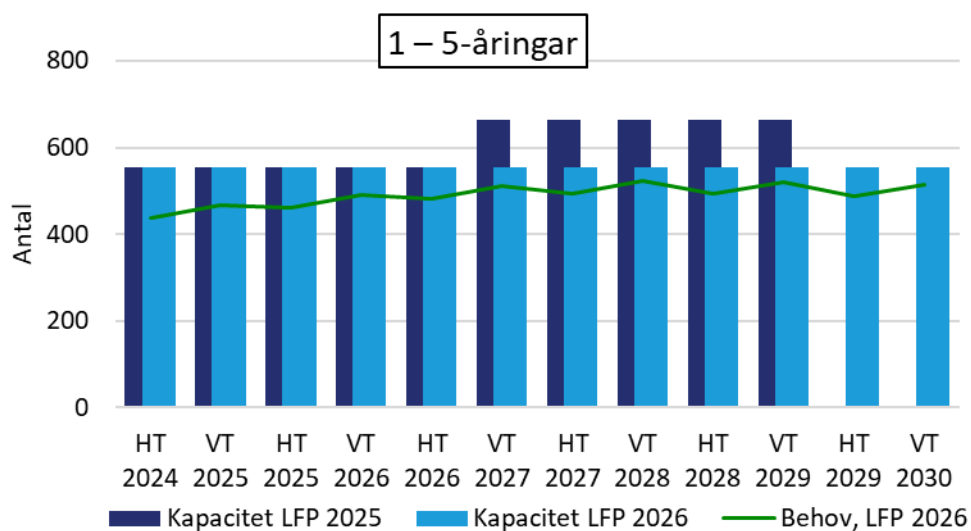


Figur 21 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 555 platser används 433 av barn boende i området i maj.

Grundskola

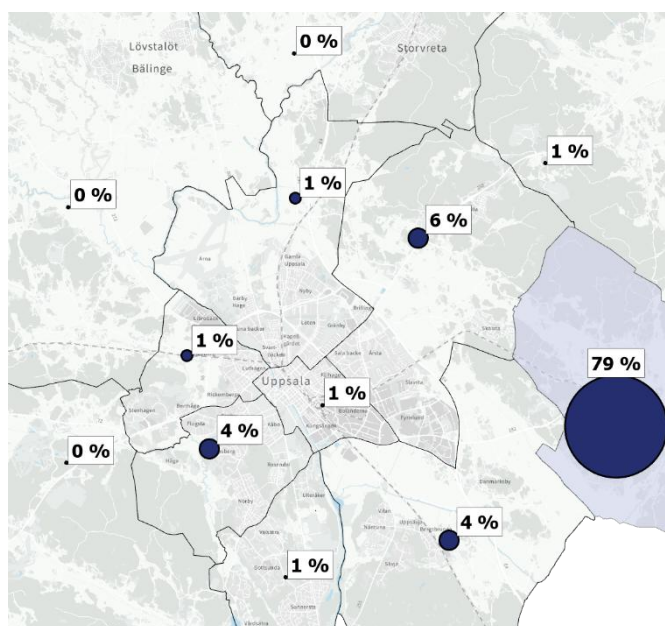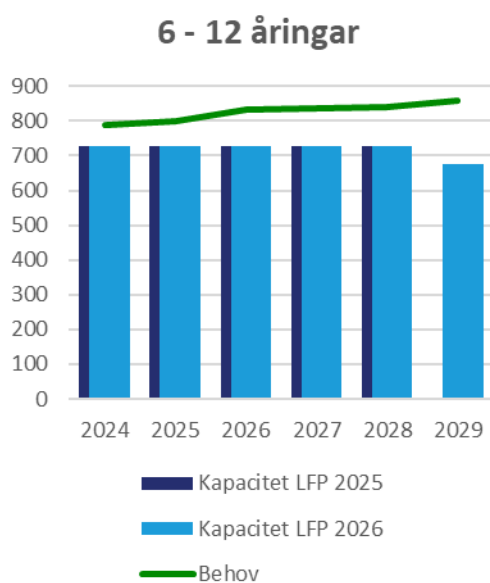

Figur 22 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 727 platser användes 621 av barn boende i området i april.

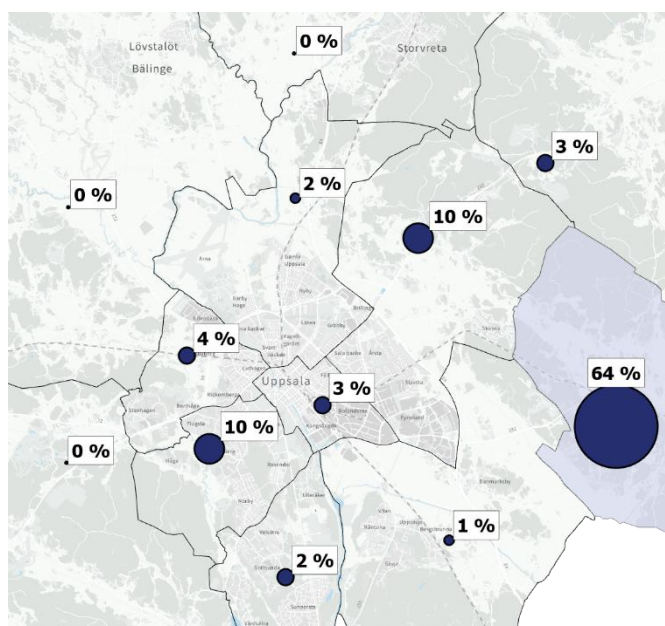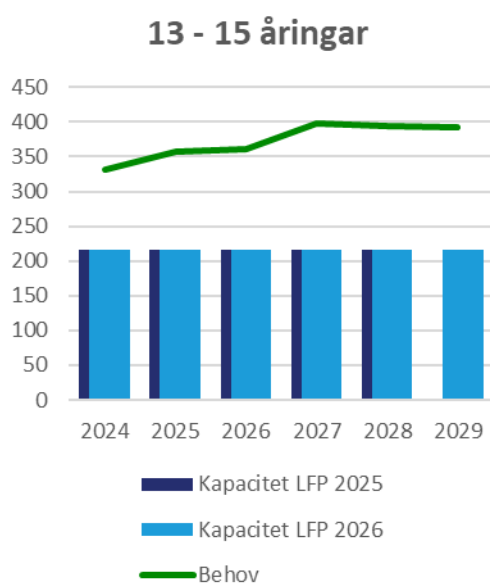

Figur 23 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 216 platser användes 206 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

—

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Länna förskola	Renoveras. Evakuering krävs preliminärt from HT2026.												
					±0								
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 37. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Almunge skola	Renoveras. Evakueras etappvis.							
				0	0			
Funbo skola	Avetablering av moduluppställning.							
				-60				
Totalt	0	0	0	-60	0	0	0	0

Tabell 38. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby.

Utredningar

Förskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Ny förskola i Almunge.	Nej	—
Ny förskola i Länna. 72 platser. Ev inhyrning.	Ja	—
Renovering och evakuering av Lillgärdets förskola.	Nej	—
Södra Gunsta, etapp 2, ny förskola, 108 platser.	Ja	—

Tabell 39. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby.


Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Knutby skola renoveras. Evakuering krävs.	Nej	—
Ny grundskola i Gunsta.	Nej	IFN och KTN

Tabell 40. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Gunsta – Länna – Almunge – Knutby.

Gåvsta- Stavby – Tuna

Befintliga lokaler

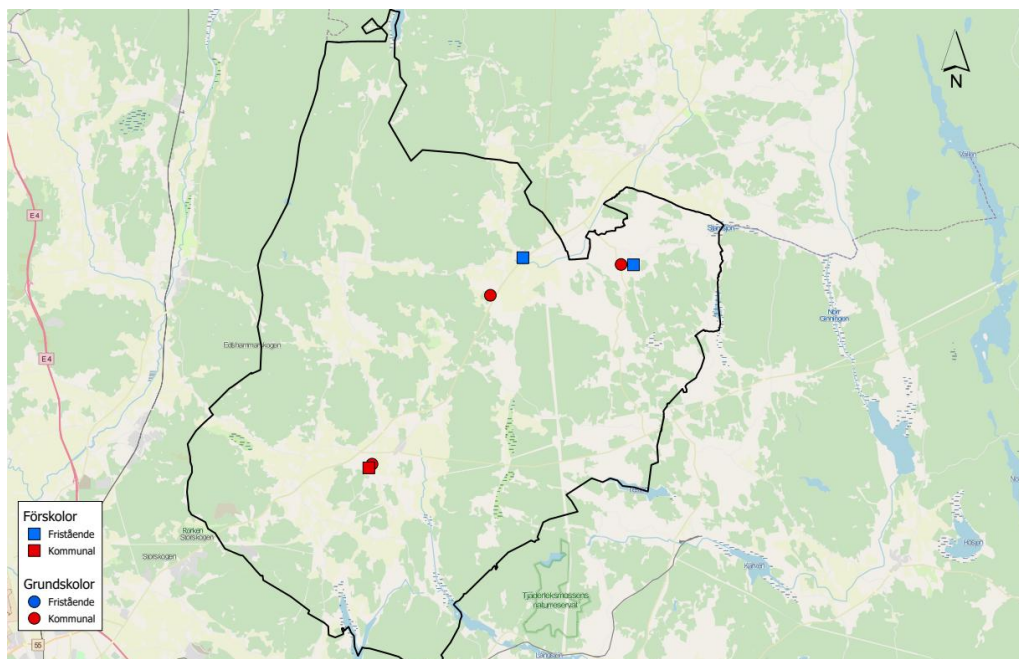

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Gåvsta förskola
Rasbo familjedaghem

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Blåklinten Dagbarnvårdare
Smulans förskola
Tunabarnens förskola

Grundskola – kommunal



Gåvsta skola
Stavby skola
Tuna skola

Utveckling behov och kapacitet

Gåvsta är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort och viss planreserv för bostäder finns på orten. Planering av ny permanent byggnad för Gåvsta förskola samt för renovering alternativt ombyggnation av Gåvsta grundskola pågår.

Jälla/Lindbacken tillhör lokalförsörjningsområdet Sala backe – Årsta – Vaksalabygden.

Förskola

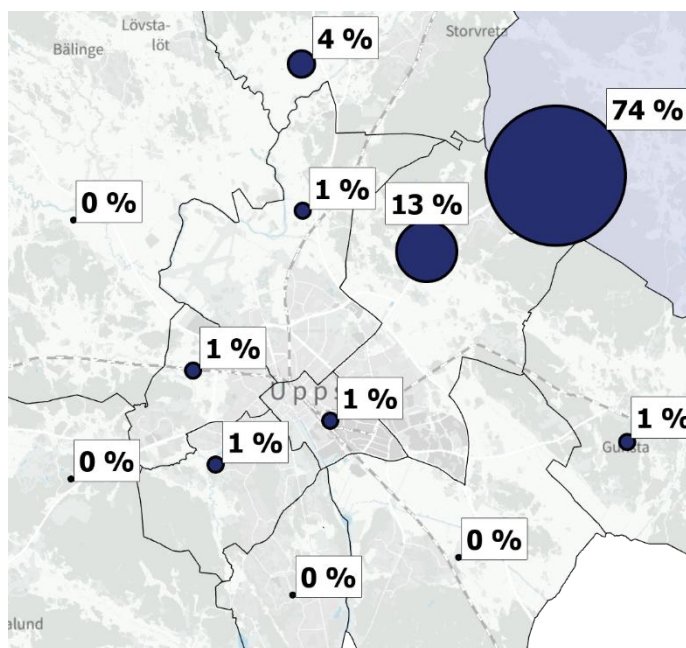
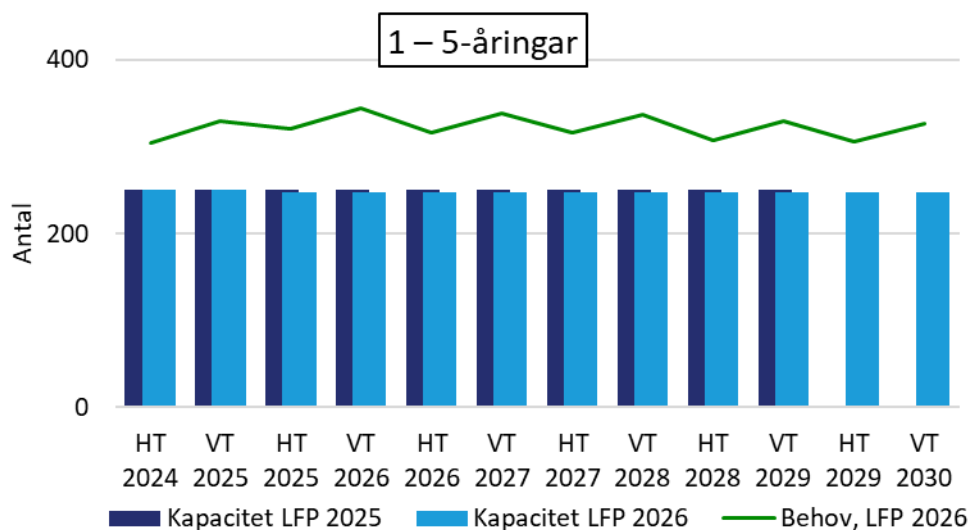


Figur 24 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Gåvsta- Stabvy – Tuna och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 251 platser används 253 av barn boende i området i maj.

Grundskola

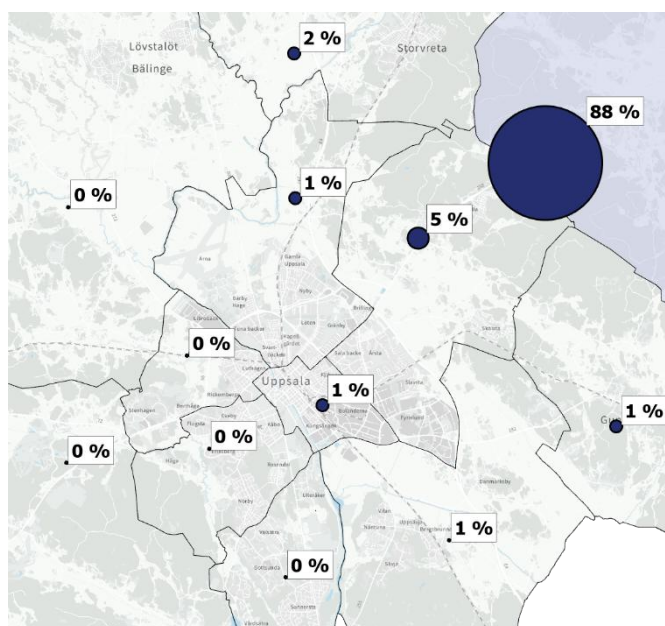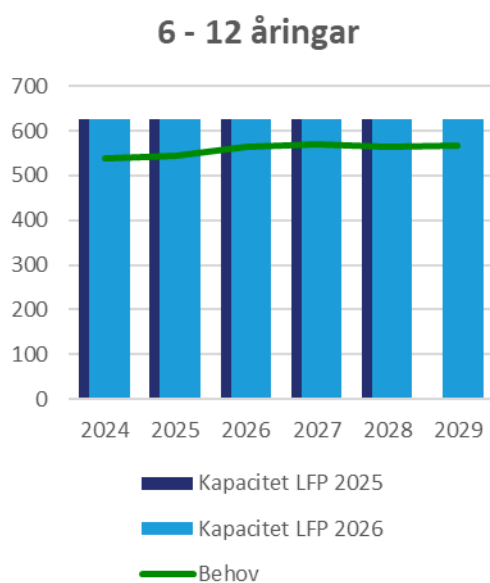

Figur 25 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Gåvsta- Stavby – Tuna och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 626 platser användes 475 av barn boende i området i april.

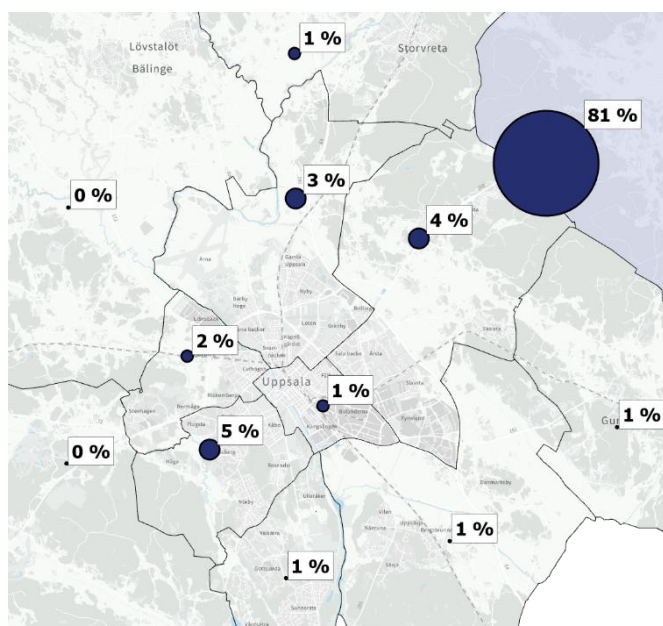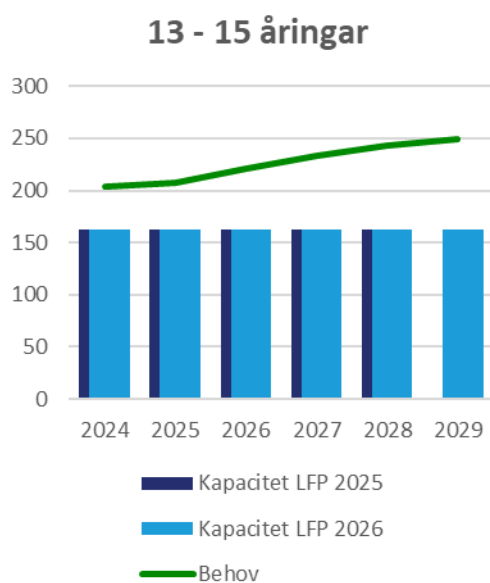

Figur 26 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Gåvsta- Stavby – Tuna och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 162 platser användes 156 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

—

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Gåvsta förskola	Permanent ersättning av modulförskolan. Kapacitet 144 platser.												
				0		0							
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 41. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Gåvsta- Stavby – Tuna.

Grundskola


	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Gåvsta skola	Renovering /ombyggnation av befintlig skolbyggnad och permanent ersättning av moduluppställning. Utökning av antalet elevplatser. Evakuering krävs.							
					120			
Tuna skola	Renovering. Evakuering krävs.							
		0						
Totalt	0	0	0	0	120	0	0	0

Tabell 42. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Gåvsta- Stavby – Tuna.

Luthagen – Stenhagen

Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo

Befintliga lokaler

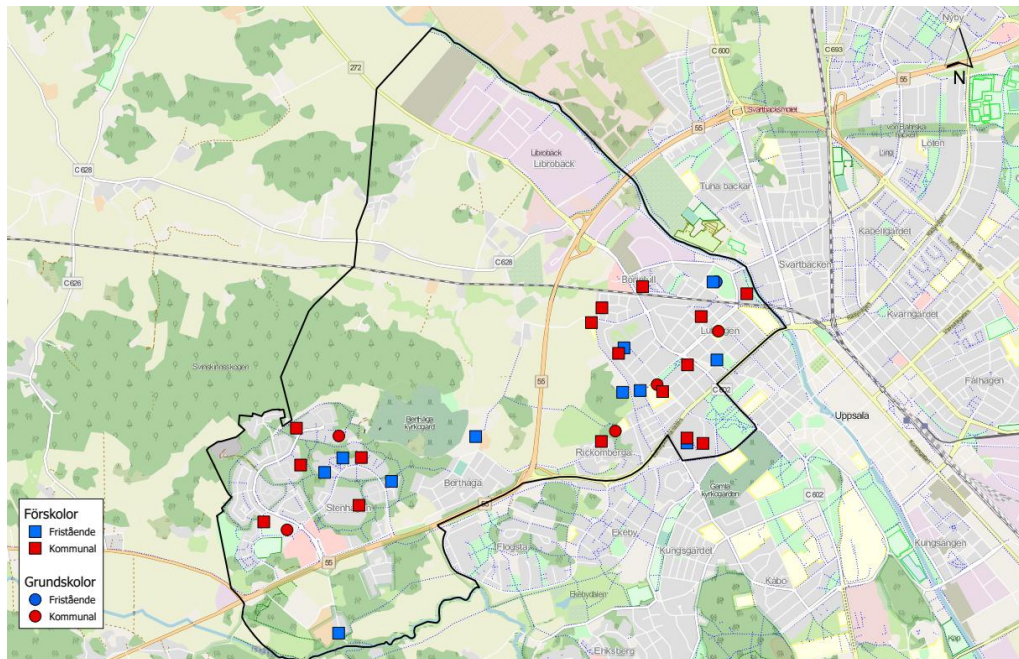

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Bergabiten förskola
Brune förskola
Fyrisvallens förskola
Gjutformens förskola
Hällby förskola
Karlavagnens förskola
Kims förskola
Luthagens familjedaghem
Luthagens förskola
Opalens förskola
Rackarbergets förskola
Stenhällens förskola
Stenrösets förskola
Tiunda förskola
Tullmästarens förskola
Västra Stenhagens förskola

Grundskola – kommunal

Eriksskolan
Sverkerskolan
Tiundaskolan
Västra Stenhagenskolan
Östra Stenhagenskolan

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Barnbitens förskola
Glinets förskola
Norlandia förskolor - Seminariet
Nyponets förskola
Rackarungen kooperativ
Röda Stugans förskola
Sagoskogens förskola
Solrosens förskola
Stabby Montessoriförskola
Stentrollens familjedaghem 2
Stentrollens familjedaghem 3
Svanens förskola

Grundskola – fristående



Uppsala Musikklasser

Utveckling behov och kapacitet

I området planeras framför allt utveckling ske i Librobäck och Börjetull, både för bostäder och verksamheter. Börjetull pekas ut som en framtida stadsnod i översiktsplanen.

I detaljplanen för Börjetull finns planlagt för bostäder, förskolor och ett vård- och omsorgsboende. Viss förtätning av bostäder planeras i andra delar av lokalförsörjningsområdet, exempelvis inom Stenhagen och Studentstaden.

Förskola

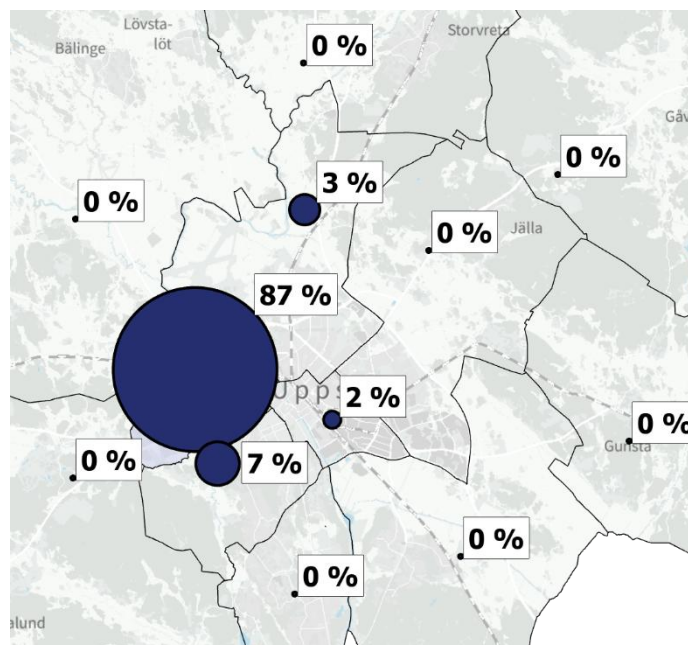
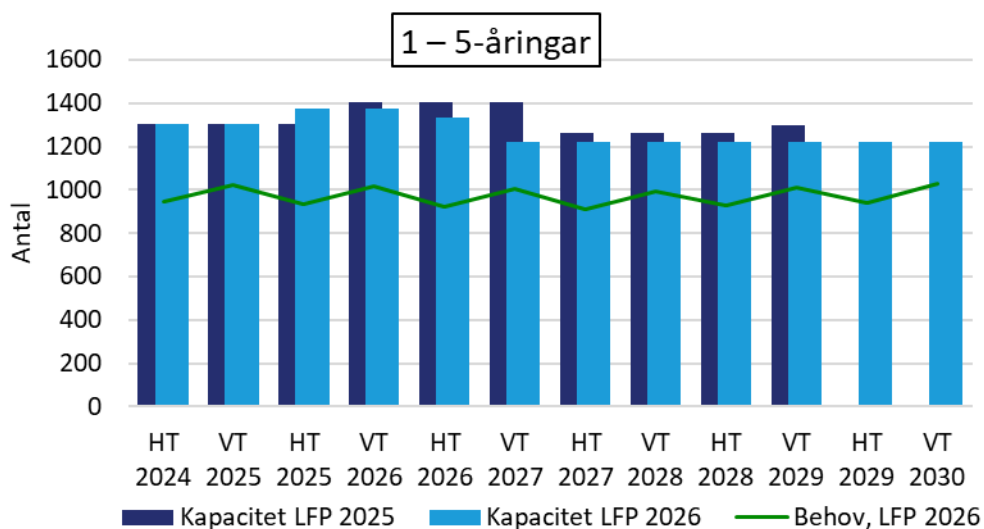


Figur 27 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Luthagen – Stenhagen och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 1 305 platser används 836 av barn boende i området i maj.

Grundskola

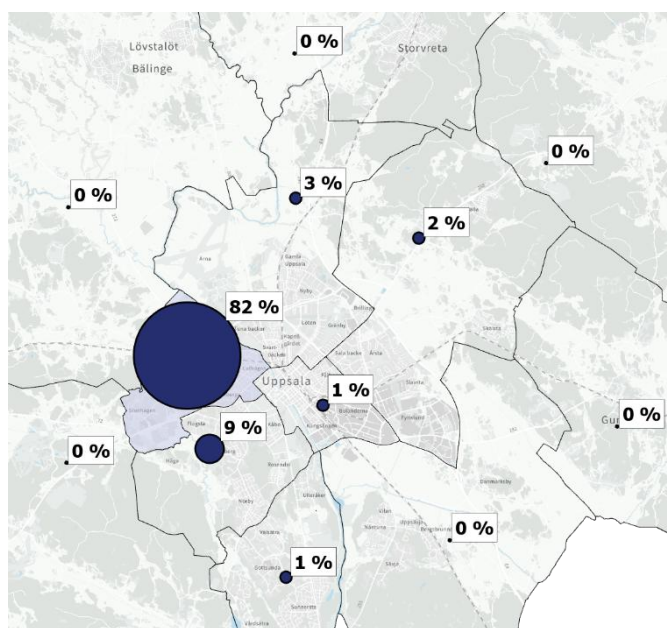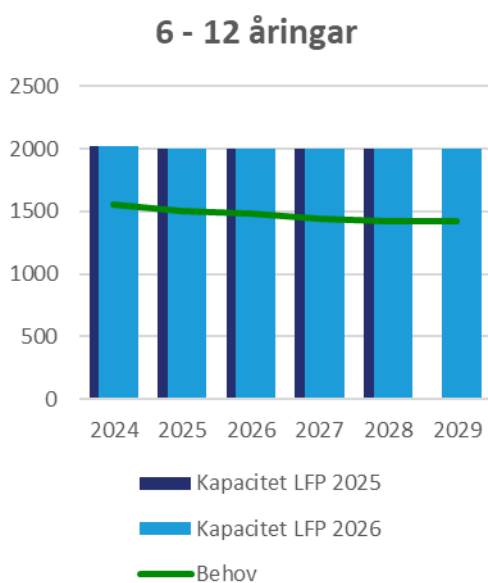

Figur 28 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Luthagen – Stenhagen och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 996 platser användes 1 248 av barn boende i området i april.

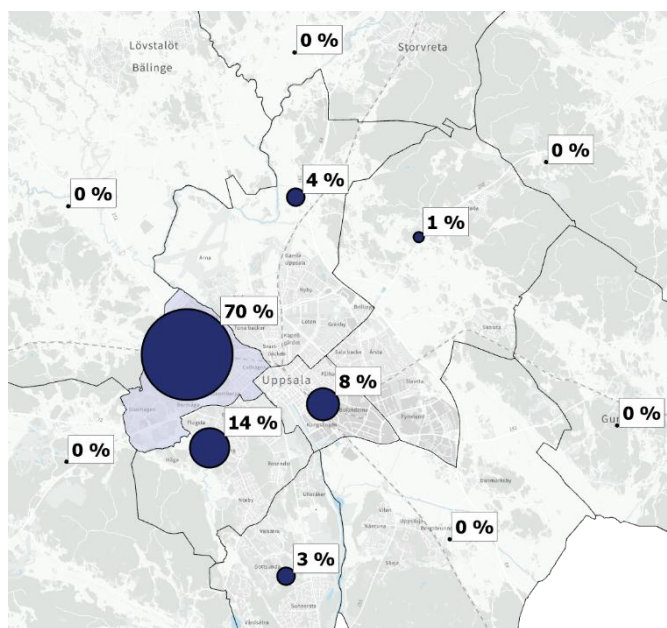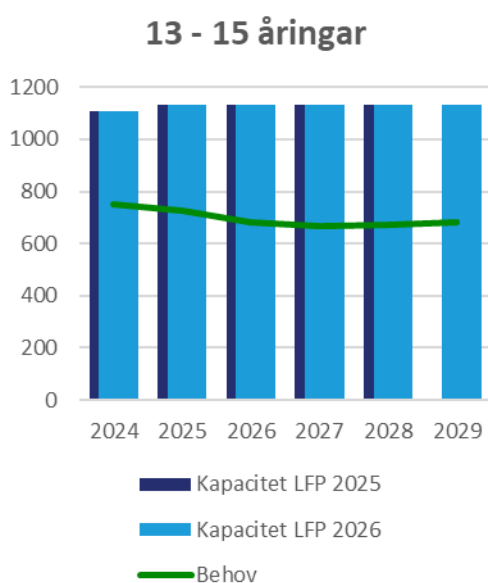

Figur 29 Diagrammet visar antalet 13–15 åringar som bor i Luthagen – Stenhagen och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 134 platser användes 521 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Östra Stenhagenskolan	Renovering. Evakuering krävs.							
			±0					
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 43. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Luthagen – Stenhagen.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Hällby förskola (Rickomberga)	Avetablering av moduler. Verksamheten flyttar till Karlavagnens nya förskola.												
		-144	-144										
Karlavagnens förskola (Studentstaden)	Ny förskola. Kapacitet 72 platser.												
	72		72										
Stenhagens öppna förskola	Förskolan flyttar in i Västra Stenhagens lokaler.												
		±0											
Västra Stenhagens förskola	Förskolan läggs ned och Stenhagens öppna förskola tar över lokalerna.												
		-36											
Totalt	0	-36	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 44. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Luthagen – Stenhagen.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2033	2034- 2035
Sverkerskolan	Förbättra ändamålsenligheten i Sverkers lokaler på Götgatan i samband med ombyggnation av Götgatan (fd Fyrisskolan).							
	0	±0						
Västra Stenhagenskolan	Anpassningar av lokaler för utökat högstadium. Renovering. Evakuering krävs.							
	0	±0						
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 45. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Luthagen – Stenhagen.

Utredningar*Förskola*

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Nya förskolor i Börjetull/Libroback. Ev inhyrningar.	Nej	—

Tabell 46. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Luthagen – Stenhagen.


Beslutade utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande ersättning av Hällbys förskola utgår på grund av minskat behov.
- Utredning gällande utökning av Västra Stenhagens förskola utgår på grund av minskat behov.

Norby – Eriksberg – Flogsta

Kåbo – Ekeby - Rosendal – Polack – Håga

Befintliga lokaler

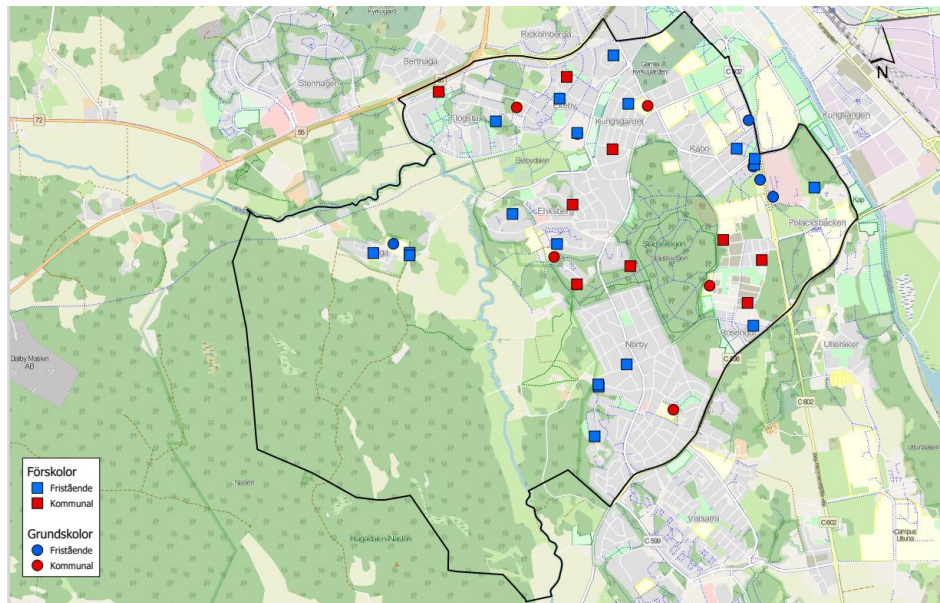

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg - kommunal

Diabasens förskola
Flogsta förskola
Glimmerns förskola
Grindstugans förskola
Kåbo familjedaghem
Rosendals förskola
Stadsskogens förskola
Täljstenens förskola
Voksenåsens förskola

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående

Berga förskola
Diamantens Förskola
Ekeby förskola
Förskolan Da Vinci
Förskolan Näktergalen -
Uppsala Waldorfförskola
Förskolan Tittut
Gluntens Montessoriförskola
Grannbarnens förskola

Humlans förskola
JENSEN förskola Kåbo
Lingonbackens förskola
Liten Lär, småbarnsskola
Myggans förskola
Norlandia förskolor
- Karlsro
Kåbo förskola
Kåbo ängars förskola
Rosengårdens
Waldorfförskola
Småfolkets förskola
Uppsala Montessoriförskola

Grundskola – kommunal

Bergaskolan
Eriksbergsskolan
(evakuerade till Rosendals skola)
Flogstaskolan
Hågaladsskolan
Malmaskolan
Rosendals skola



Grundskola – fristående

Gluntens Montessoriskola
JENSEN grundskola Uppsala Kåbo
JENSEN grundskola Uppsala Polacksbacken
Kunskapsskolan Uppsala
Kunskapsskolan Uppsala -Norra
Uppsala Enskilda skola
Uppsala Waldorfskola

Utveckling behov och kapacitet

Utbyggnad av området Rosendal pågår. Ytterligare utbyggnation av bostäder planeras också inom Eriksberg och Flogsta men bostadsbyggandet och behovsunderlaget i de västra delarna bedöms lägre än tidigare.

Förskola

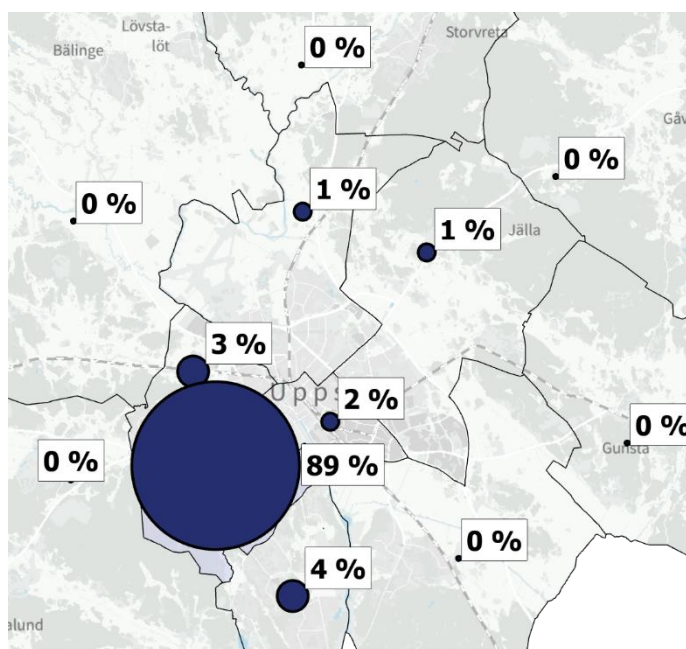
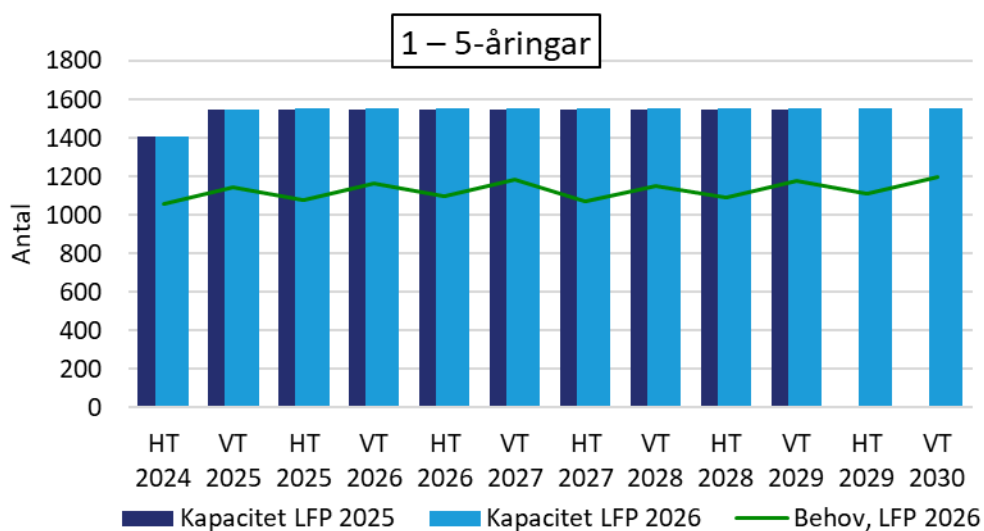


Figur 30 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Norby – Eriksberg – Flogsta och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.


Av områdets kapacitet på 1 548 platser används 945 av barn boende i området i maj.

Grundskola

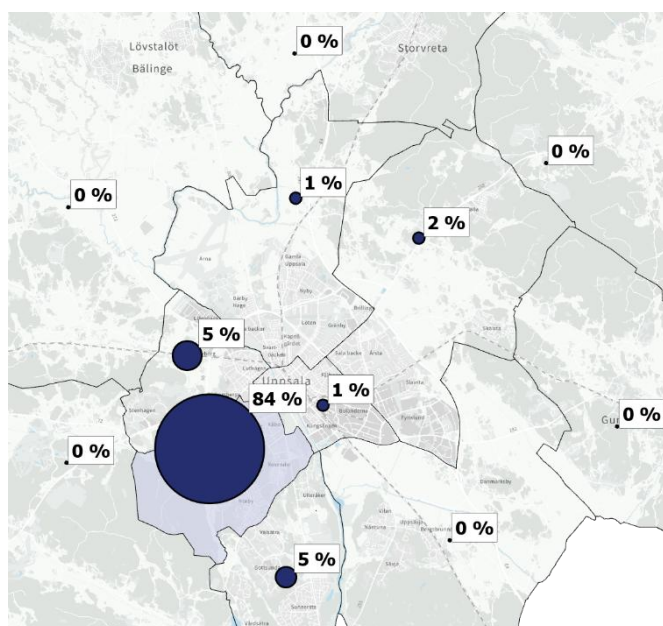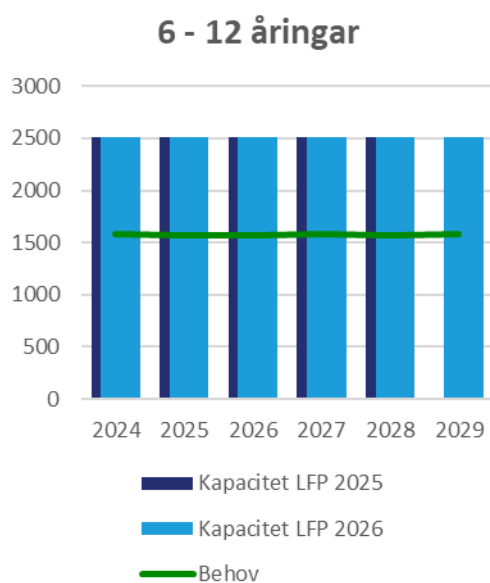

Figur 31 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Norby – Eriksberg – Flogsta och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 2 511 platser användes 1 313 av barn boende i området i april.

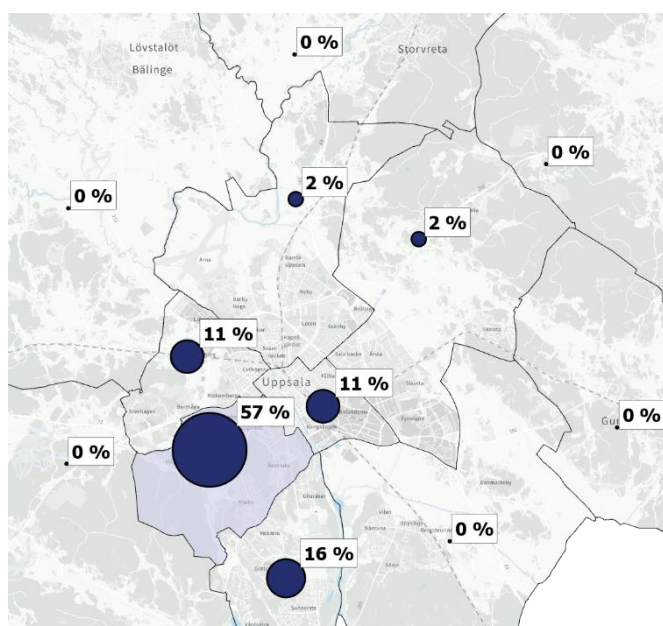

Figur 32 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Norby – Eriksberg – Flogsta och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 450 platser användes 393 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

—

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Voksenåsens förskola (Flogsta Ekeby)	Renovering. Evakuerade till moduluppställning. (Färdigställd december 2025)												
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 47. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Norby – Eriksberg – Flogsta.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Eriksbergsskolan	Renoveras. Renovering/ombyggnation, preliminär kapacitet 420 platser.							
					420			
Totalt	0	0	0	0	420	0	0	0

Tabell 48. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Norby – Eriksberg – Flogsta.

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utredas ytterligare eller utgå

Åtgärd	Förklaring	Koppling till annan LFP
Glimmerns förskola (Eriksberg), renovering	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej

Tabell 49. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.

Utredningar*Förskola*

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Glimmerns förskola renoveras. Evakuering krävs.	Nej	—
Ny förskola vid Hammarparken. 72 platser. Ev inhyrning	Nej	—
Nyproduktion av Silikatets förskola.	Nej	—
Ytterligare förskolor i Rosendal.	Nej	—

Tabell 50. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Norby – Eriksberg – Flogsta.

Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Renovering av Flogstaskolan.	Nej	IFN


Tabell 51. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Norby – Eriksberg – Flogsta.

Beslutade utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande nyttjande av öppna förskolans lokaler i Disponentvillan utgår på grund av omfördelning av lokalytan mellan samnyttjande parter.
- Utredning av Kullens nya förskola utgår på grund av minskat behov.

Ramstalund – Vänge – Järlåsa

Befintliga lokaler

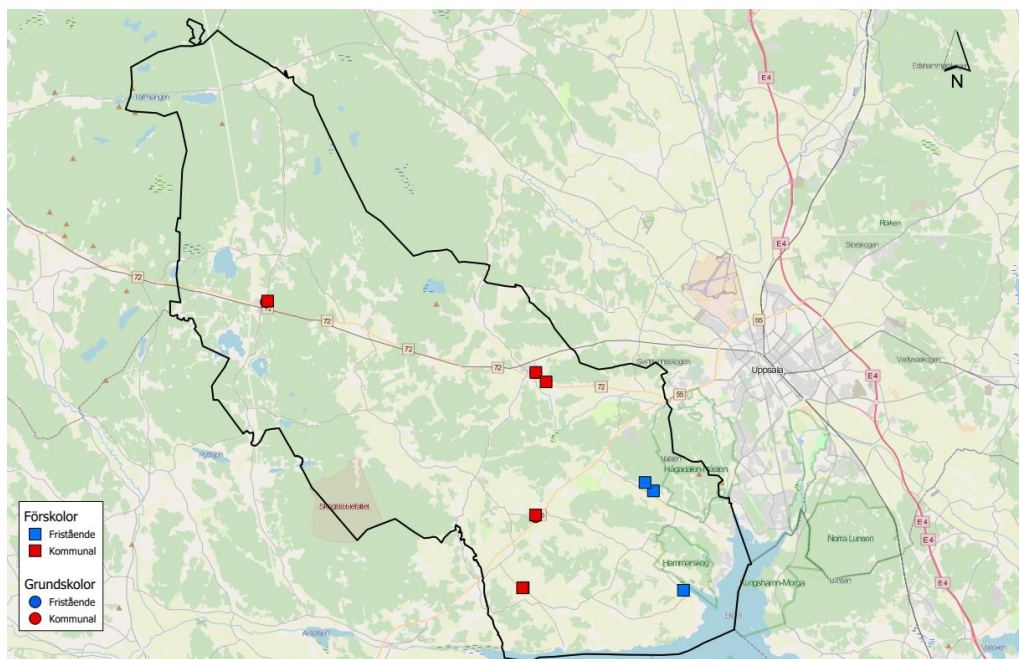

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Arkitektens förskola
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda
Järlåsa förskola
Ramsta förskola
Vänge förskola

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående

Bytorgets förskola
Dalby hage förskola
Föräldrakooperativet Balingsta förskola
Näsdalens förskola



Grundskola – kommunal

Järlåsa skola
Ramsta skola
Vänge skola

Utveckling behov och kapacitet

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Pågående detaljplanering möjliggör för ytterligare bostäder i Vänge och Järlåsa.

Förskola

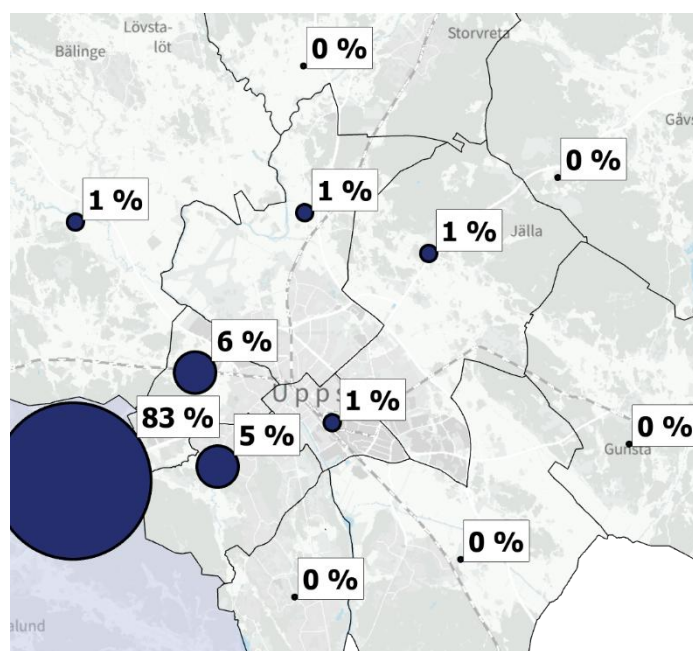
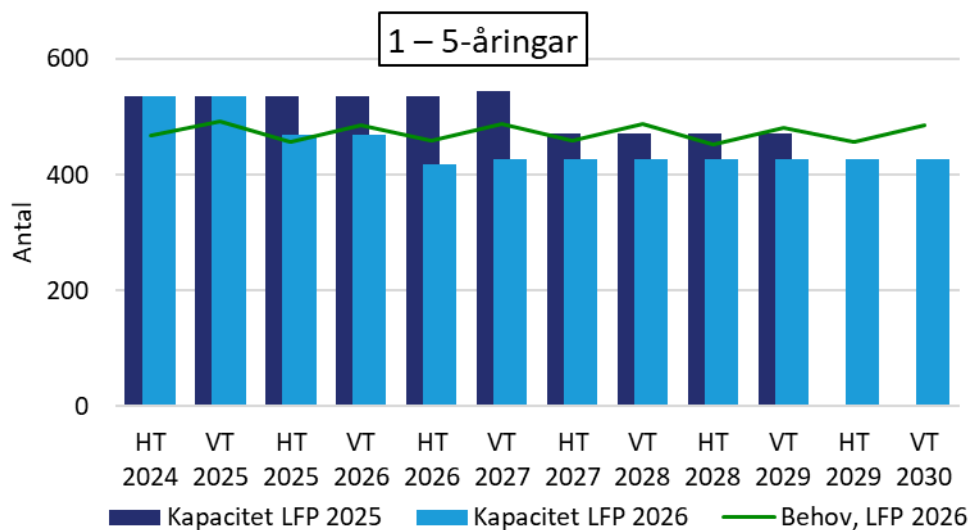


Figur 33 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Ramstalund – Vänge – Järlåsa och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 536 platser används 397 av barn boende i området i maj.

Grundskola

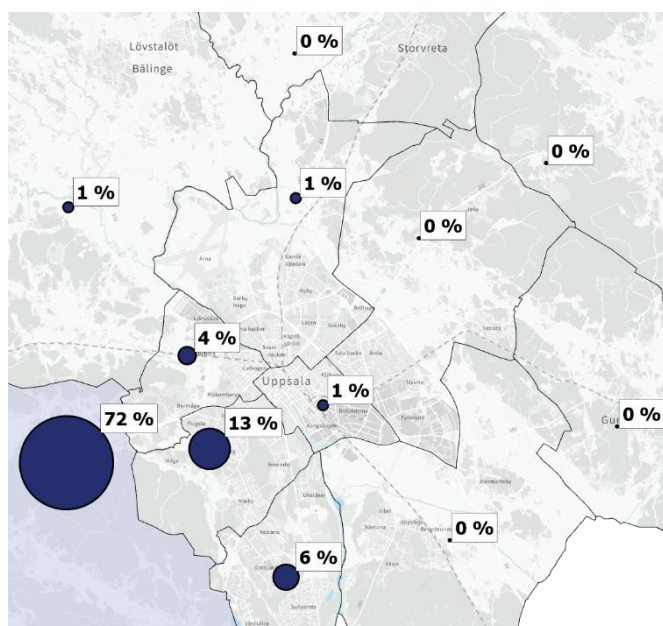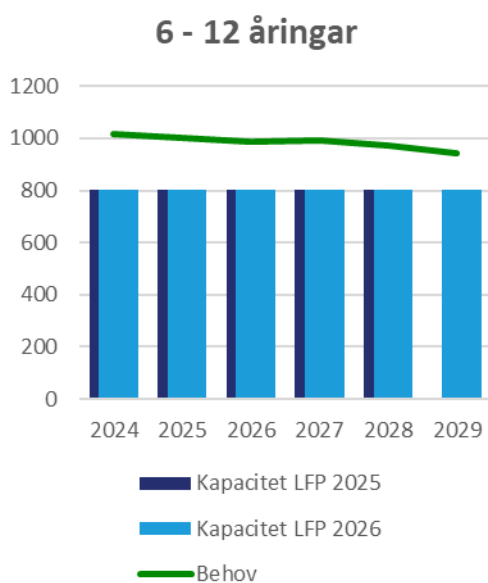

Figur 34 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Ramstalund – Vänge – Järlåsa och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 800 platser användes 723 av barn boende i området i april.

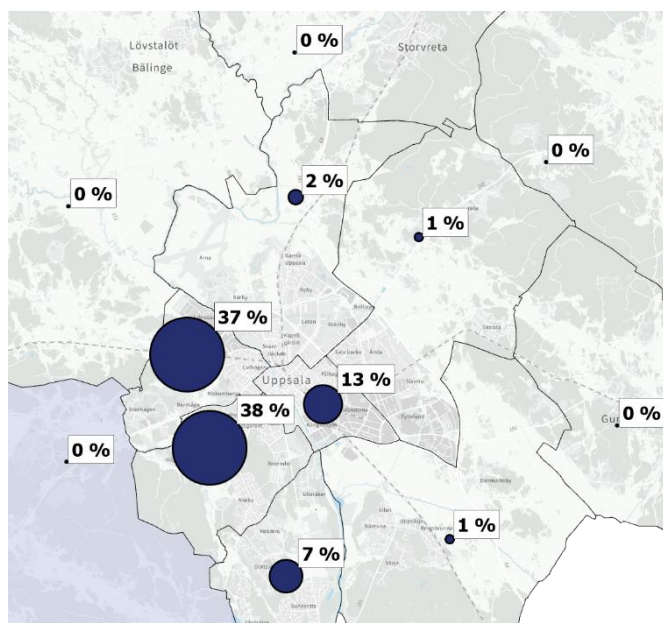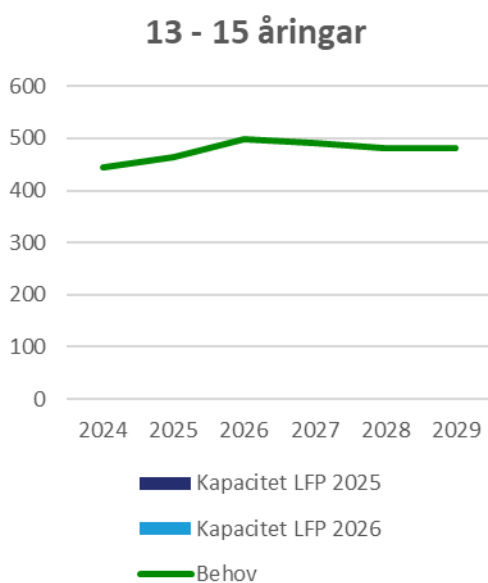

Figur 35 Diagrammet visar antalet 13–15 åringar som bor i Ramstalund – Vänge – Järlåsa och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Området saknar högstadieplatser.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Ramsta skola	Renovering. Evakuering från HT 2026							
		±0						
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 52. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Ramstalund – Vänge – Järlåsa.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Arkitektens förskola (Vänge)	Avetablering av moduler och förskolan läggs ned												
		-72											
Järlåsa förskola	Permanent ersättning av modulförskolan. Kapacitet 72 platser.												
			±0										
Totalt	0	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 53. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Ramstalund – Vänge – Järlåsa.

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utredas ytterligare eller utgå

Åtgärd	Förklaring	Koppling till annan LFP
Järlåsa skola, Nybyggnation av kök och matsal i samband med nybyggnation av förskola. Ev. utökning.	Åtgärden utgår. Endast underhållsrenovering som inte kräver evakuering.	KTN

Tabell 54. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.


Beslutade utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande ersättning av Arkitektens förskola utgår på grund av minskat behov samt höga kostnader.

Sala backe – Årsta – Vaksalabygden

Fyrislund - Slavsta - Lindbacken

Befintliga lokaler

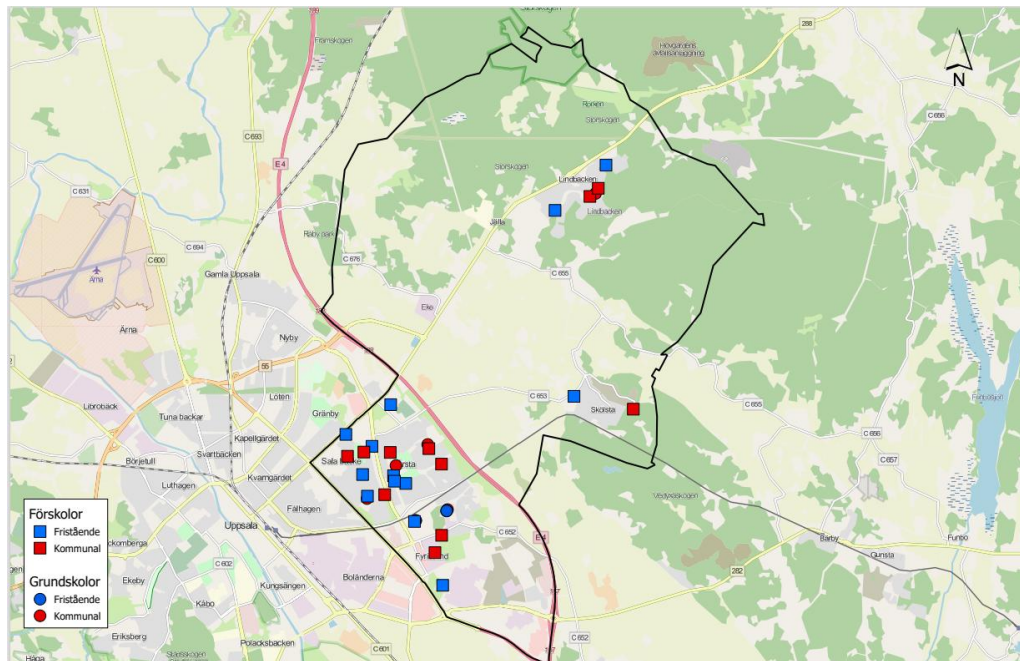

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Axelina förskola
Kamomillens förskola
Källparkens förskola
(evakuerade till Kamomillens förskola)
Lindbackens förskola
Salabacke förskola
Skogstorpets förskola
Skölsta förskola
Slavsta förskola
Årstaparkens förskola
Äppellundens förskola

Grundskola – kommunal

Brantingskolan
Johannesbäcksskolan
Lindbackens skola
Palmbladsskolan
Ångelstaskolan
Årsta skolan

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Boklundens förskola
Dibber Källparkens förskola
Dibber Årsta förskola
Ekoxen dagbarnvårdare
Vaksala
Estia förskola
Fasanens förskola
Färgkritans familjedaghem
Kastanjens Montessoriförskola

Grundskola – fristående

Uppsala International school
Ansgarskolorna; Kyrkskolan, Källskolan och Trädgårdsskolan



Norlandia förskolor - Skölsta
Norlandia förskolor - Uppfinnaren
Norlandia förskolor - Upplevelsen
Norlandia förskolor - Upptäckten
Prästgårdens förskola
Tellusbarn Sparrisen

Utveckling behov och kapacitet

Planerad bostadsbyggnation i området förväntas i första hand ske inom Östra Sala backe. Möjlighet för ytterligare bostäder finns också framför allt i Skölsta och Lindbacken.

Källparkens förskola är riven och under projektering samtidigt som behovet av ytterligare förskolor skjuts fram då takten för nya bostäder är lägre än tidigare förväntat.

Förskola

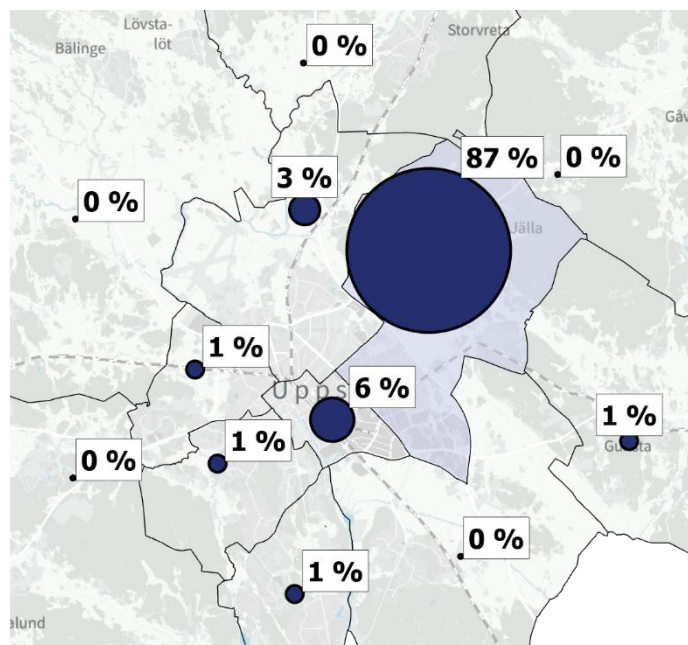
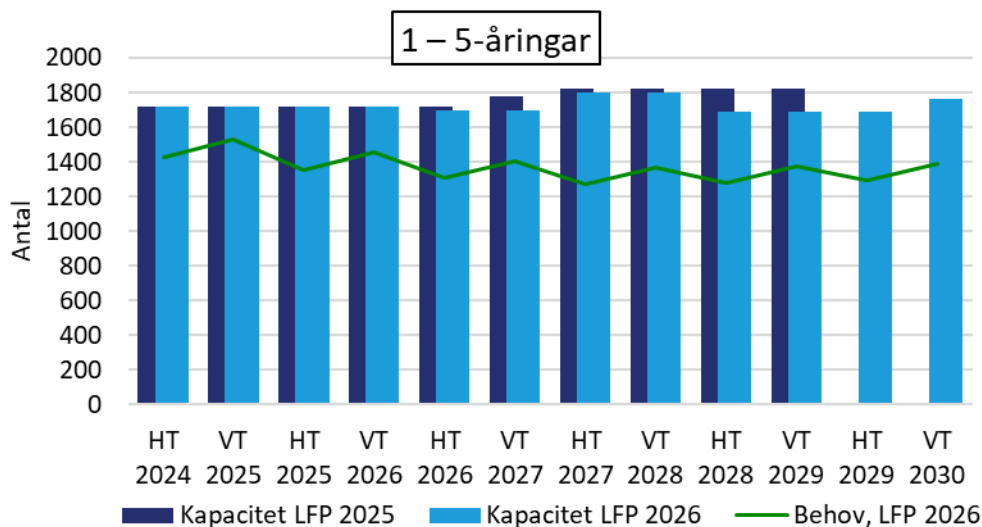


Figur 36 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 1 722 platser används 1 282 av barn boende i området i maj.

Grundskola

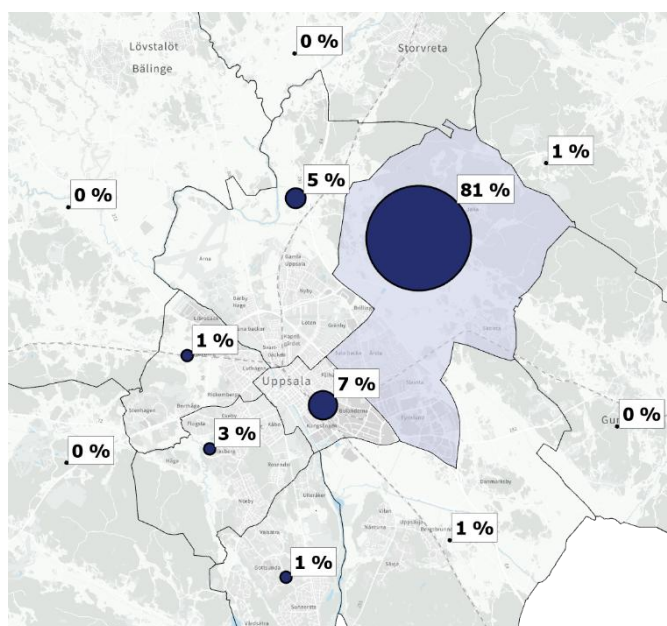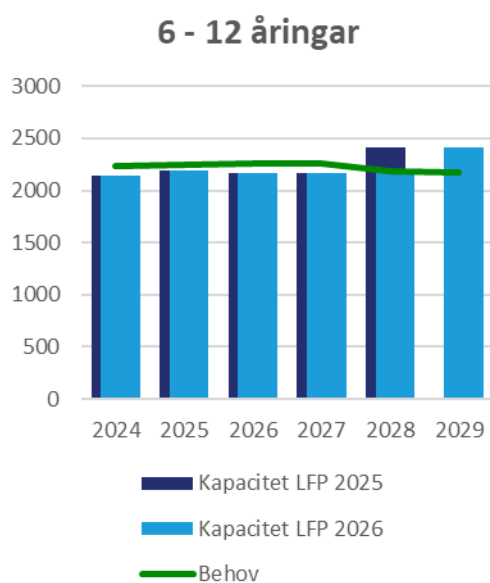

Figur 37 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 2 189 platser användes 1 774 av barn boende i området i april.

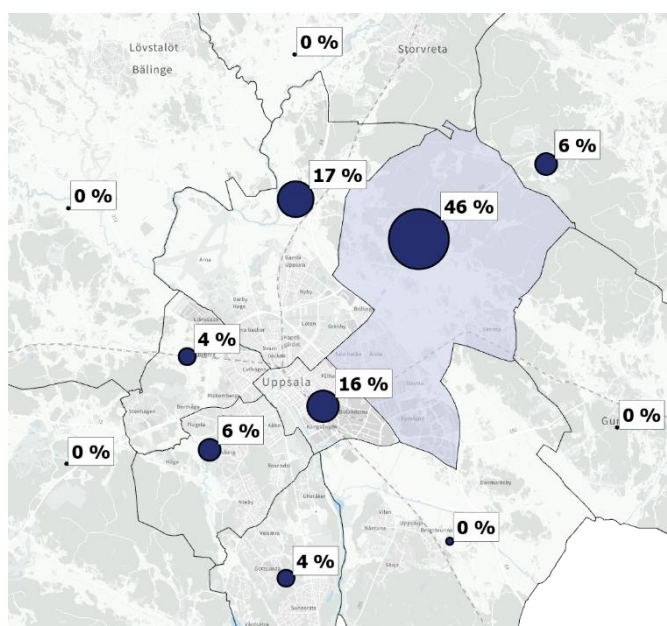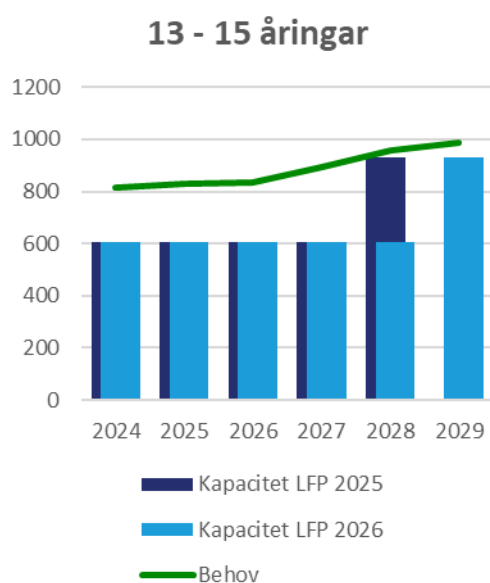

Figur 38 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 608 platser användes 372 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

—

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Källparkens förskola (Sala backe)	Ersätts och utökas. Ny kapacitet 108 platser. Evakuerade till Kamomillens förskola.												
			108	108									
Totalt	0	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 55. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Årstaskolan	Moduluppställning avvecklas.							
		-125						
Totalt	0	-125	0	0	0	0	0	0

Tabell 56. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden.

Utredningar

Förskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Ny förskola i Östra Salabacke etapp 3. 72 platser. Ev inhyrning.	Nej	—
Ytterligare förskoleplatser i Skölsta.	Nej	—
Årsta skoltomt, ny förskola 108 platser.	Nej	—

Tabell 57. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden.


Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Palmladsskolan renoveras, evakuering.	Nej	—
Utökning av Årstaskolan inklusive anpassad grundskola.	Nej	—

Tabell 58. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Sala backe – Årsta – Vaksalabygden.

Storrreta – Vattholma – Skyttorp

Befintliga lokaler

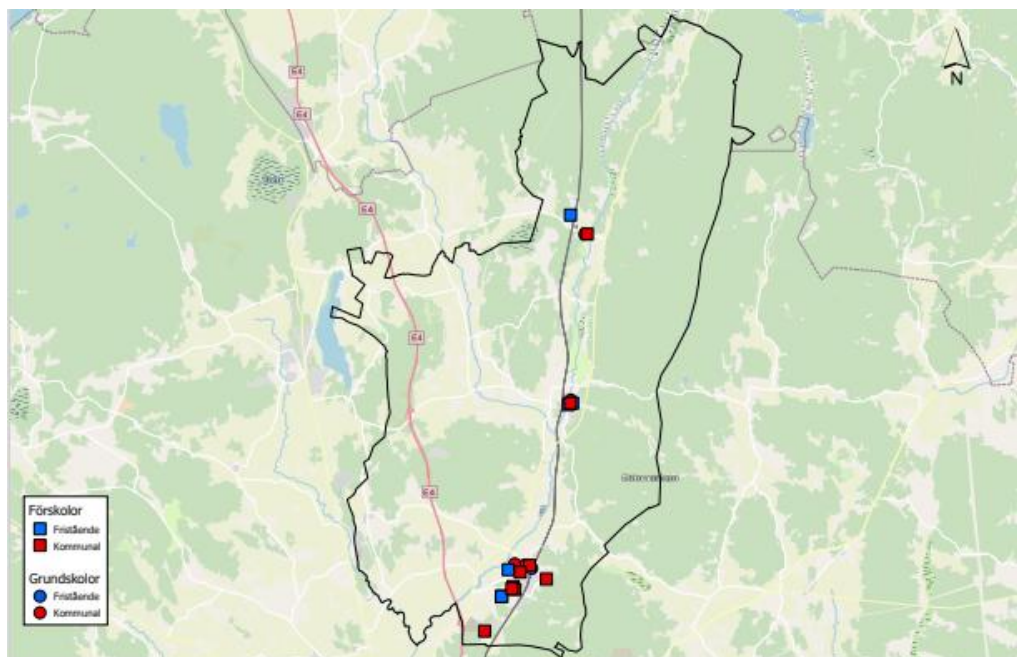

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Astrakanens förskola
Fullerö förskola (evakuerade till Lyckebo förskola)
Lyckebo förskola
Malmvågens förskola
Molnets förskola
Skogsbackens förskola
Skyttorps förskola
Vretens förskola

Grundskola – kommunal

Pluggparadiset
Skyttorps skola
Storrretaskolan
Vattholmaskolan
Ärentunaskolan

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående

Ekoxen dagbarnvårdare Storrreta
Familjedaghemmet Alm
Förskolan Majgården
Hyttans förskola
I Ur och Skur Pinneman
Lilla lyktans familjedaghem
Skyttorpskottarna



Grundskola – fristående

Ansgarsskolorna: Fridhemsskolan

Utveckling behov och kapacitet

Storvreta, Vattholma respektive Skyttorp är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Pågående detaljplanering möjliggör för bostäder i framför allt Storvreta. För Storvreta inklusive Fullerö Hage finns också en fördjupad översiktsplan från 2012 och en genomförandeplan från 2018. Genomförandeplanen tar höjd för cirka 2000 bostäder. Bostadsbyggandet bedöms leda till ytterligare behov av samhällsservice i olika former men har bromsat in.

Förskola

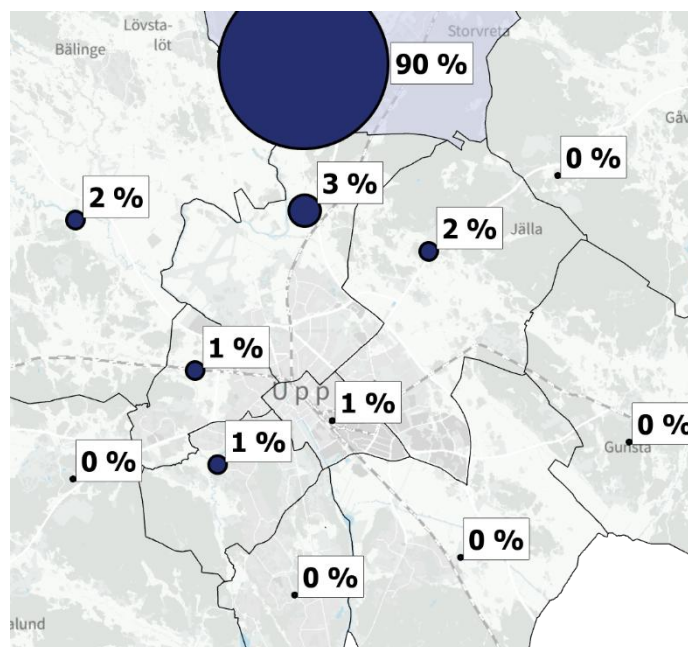
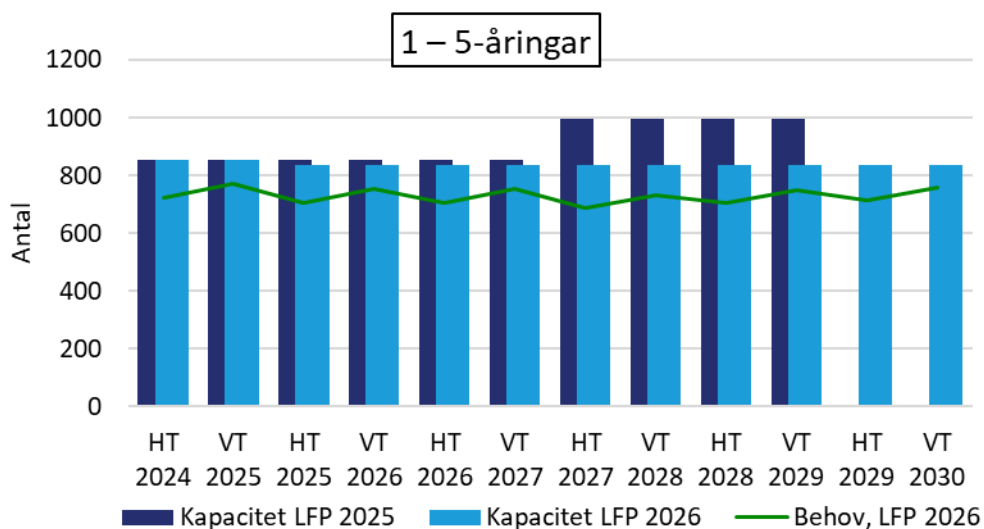


Figur 39 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Storvreta – Vattholma – Skyttorp och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 854 platser används 703 av barn boende i området i maj.

Grundskola

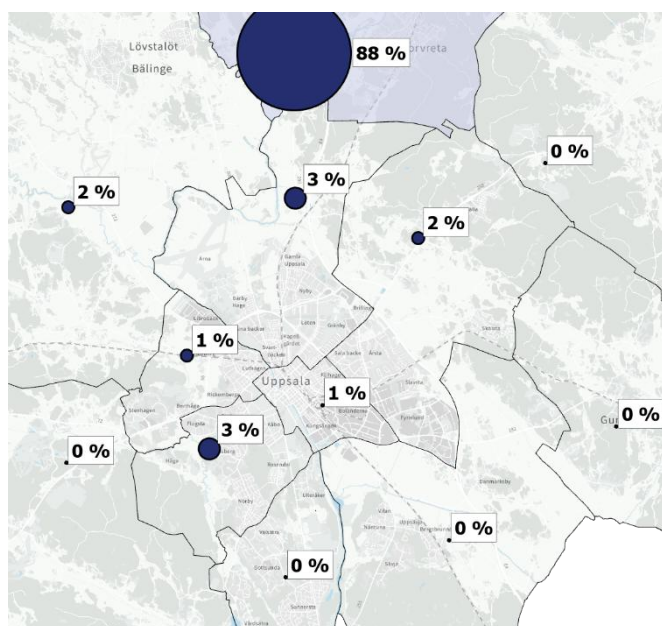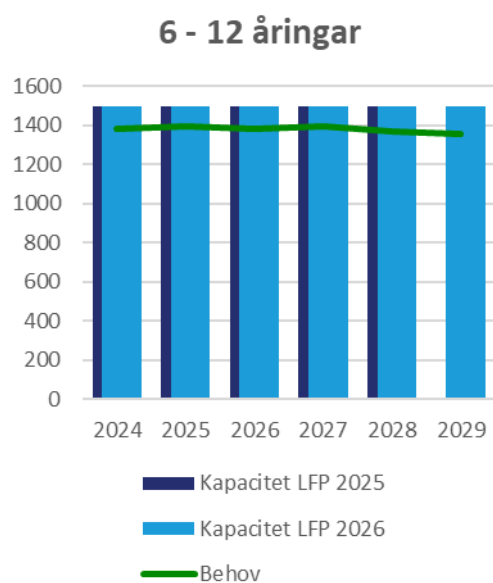

Figur 40 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Storvreta – Vattholma – Skyttorp och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 496 platser användes 1 181 av barn boende i området i april.

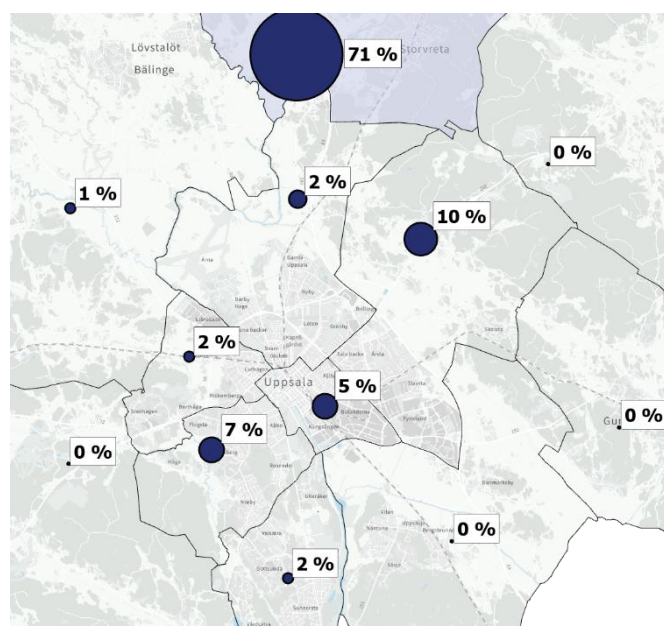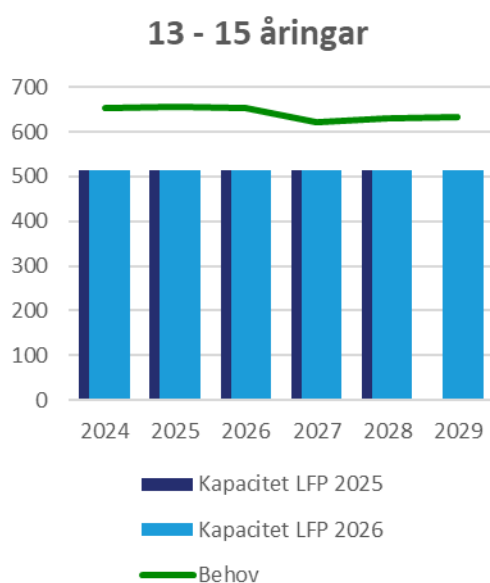

Figur 41 Diagrammet visar antalet 6–12-åringar som bor i Storvreta – Vattholma – Skyttorp och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 513 platser användes 457 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder*Förskola*

—

Grundskola

—

Tidigare beslutade åtgärder*Grundskola*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2033	2034- 2035
Storrretaskolan	Renoveras. Evakuering till modulerna vid Ärentunaskolan krävs preliminärt from HT2026.							
			0					
Ärentunaskolan	Renoveras. Evakueras etappvis.							
	0							
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 59. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Storrreta – Vattholma – Skyttorp.

Utredningar*Förskola*

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Nya förskolor i Södra Storrreta. 144 platser vardera.	Ja	—

Tabell 60. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Storrreta – Vattholma – Skyttorp.

Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Pluggparadiset renoveras. Evakuering krävs.	Nej	—
Ny grundskola i Södra Storrreta.	Ja	IFN och KTN

Tabell 61. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Storrreta – Vattholma – Skyttorp.


Beslutade utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande ny förskola i Skyttorp utgår på grund av minskat bostadsbyggande.

Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala

Tuna Backar – Kapellgårdet – Kvarngärdet – Nyby – Löten

Befintliga lokaler

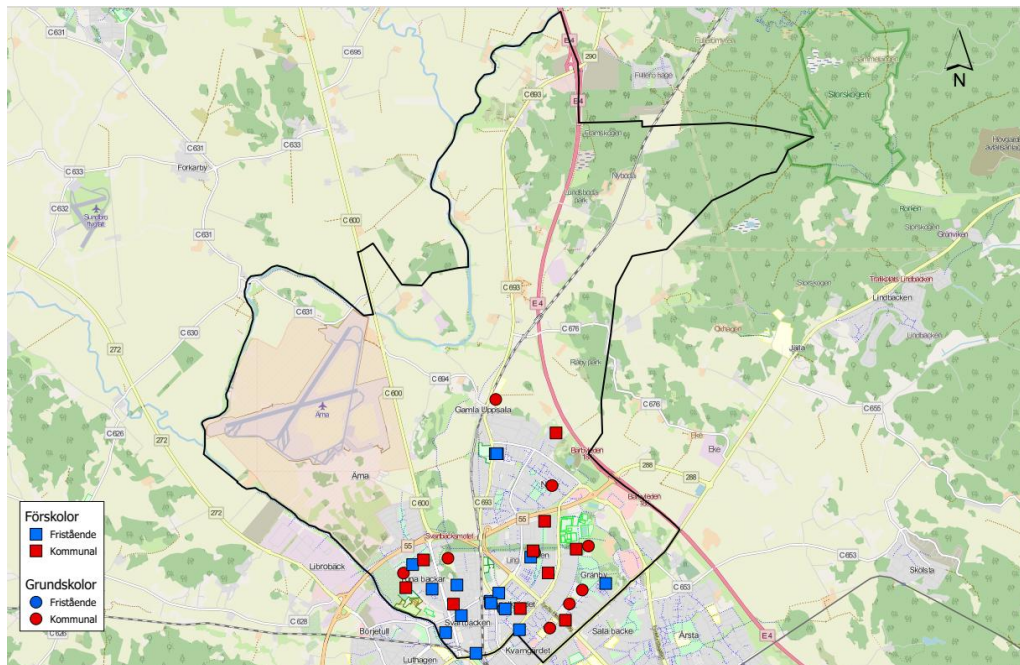

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Bellmans förskola
Gränby familjedaghem
Jarlaparkens förskola
Lagerlöfs förskola
Parkens förskola
Ringarens förskola
Tunaparkens förskola
von Bahrs förskola
Österledens förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

CAS Djäknén
Ekplantans förskola
Fyrisåns förskola
Förskolan Laxen
Förskolan Swedenborg
Gamla Uppsala förskola
Gamla Uppsala
Montessoriförskola
Lilltunas förskola

Norlandia förskolor -
Kvarnen
Norlandia förskolor -
Svartbäcken
Norlandia förskolor -
Uppdraget
Norlandia förskolor -
Utmanaren
Närdaghemmets förskola
Solskenets förskola
Uppsala Montessori
Yrsa förskola

Grundskola – kommunal

Domarringens skola
Fredrika Bremerskolan
Gamla Uppsala skola (evakuerade till
moduler på Gränby sportfält)
Gränbyskolan
Kvarngärdesskolan
Liljeforskskolan
Tunabergsskolan
von Bahrs skola



Grundskola - fristående

Uppsala Montessoriskola

Utveckling behov och kapacitet

Viss förtätning möjliggörs inom lokalförsörjningsområdet, bland annat i kvarteren Vapenhuset, Takryttaren och vid Heidenstamstorg. Arbete med planering för området kring Fyrishov pågår.

Förskola

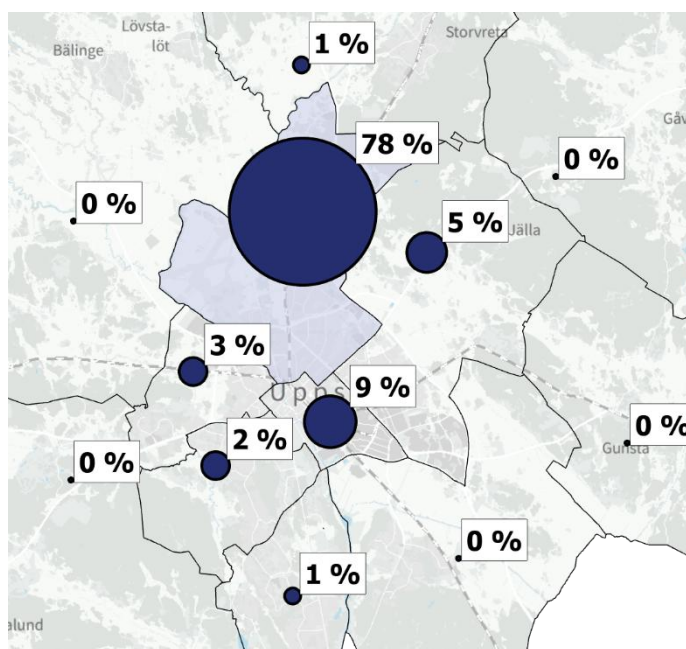
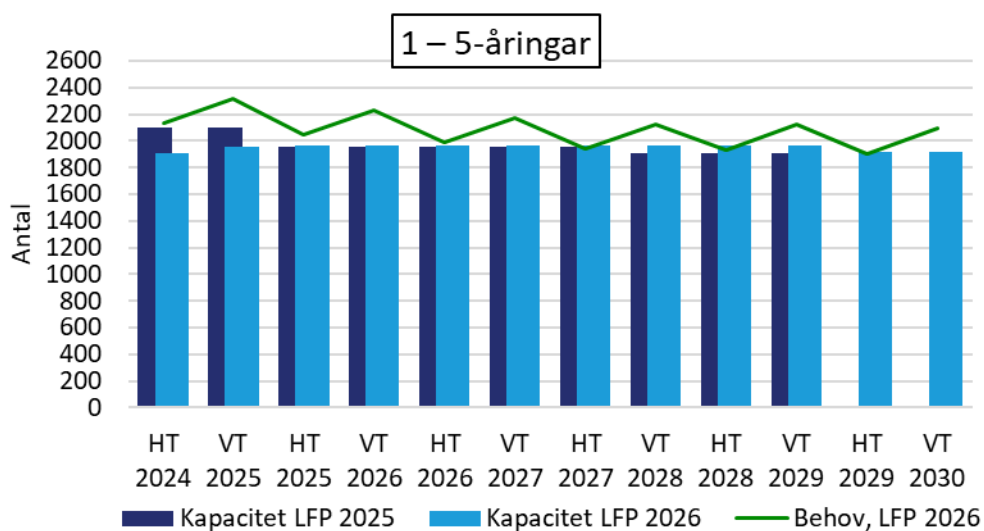


Figur 42 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 1 953 platser används 1 612 av barn boende i området i maj.

Grundskola

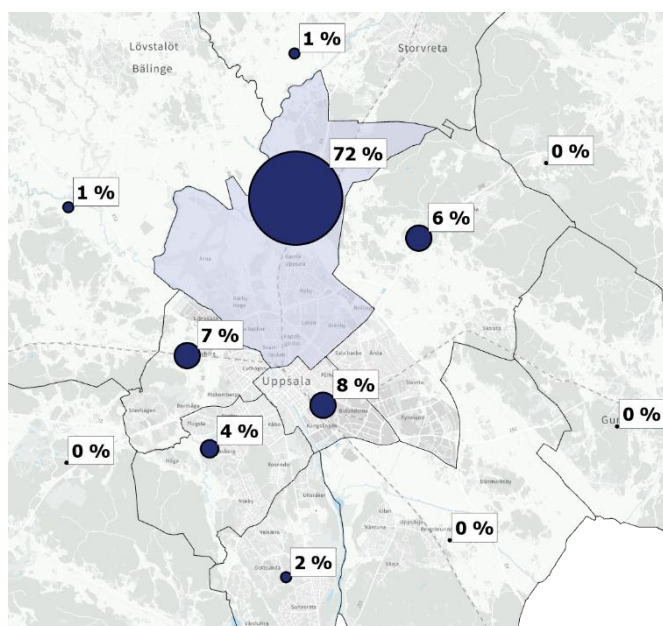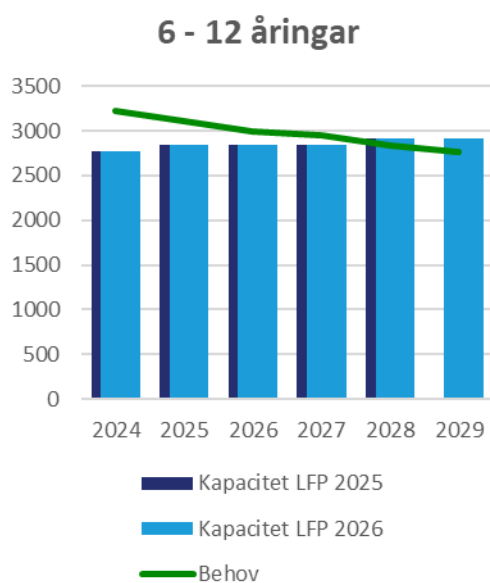

Figur 43 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 2 840 platser användes 2 203 av barn boende i området i april.

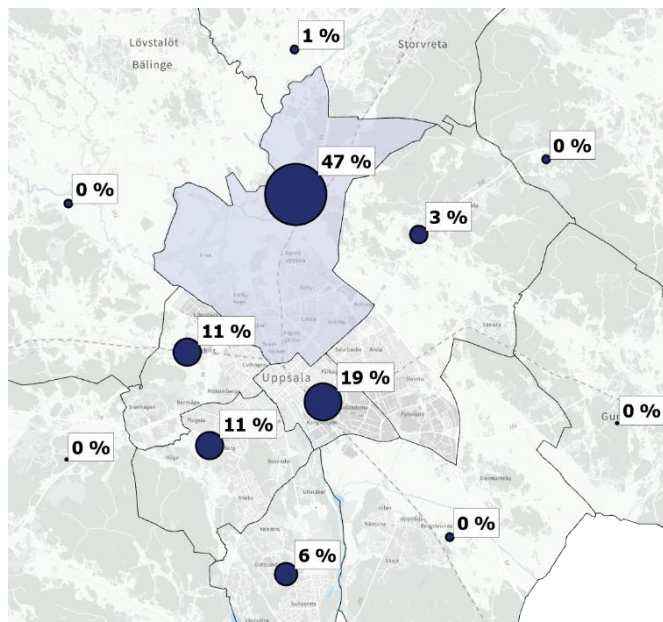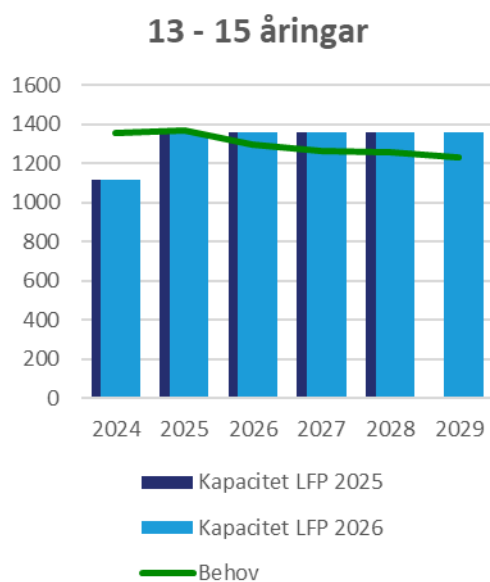

Figur 44 Diagrammet visar antalet 13–15 åringar som bor i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 116 platser användes 628 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

—

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2033	2034- 2035
Gränbyskolan	Renovering. Evakuering krävs.							
					± 0			
Totalt	0	0	0	-344	0	0	0	0

Tabell 62. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala.

Tidigare beslutade åtgärder

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2033	2034- 2035
Gamla Uppsala skola	Permanent ersättning för moduluppställning. 420 platser. Evakueras till modulerna på Gränby sportfält HT 2025.							
			76					
Totalt	0	0	76	0	0	0	0	0

Tabell 63. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala.

Utredningar

Förskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Ny förskola i Gränbystaden. 72 platser. Ev inhyrning.	Nej	—
Ny förskola i Tuna backar.	Nej	—

Tabell 64. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala.


Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Renovering alternativt ersättning av Fredrika Bremerskolan.	Nej	IFN och KTN
Renovering av Tunabergsskolan.	Nej	IFN

Tabell 65. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala.

Sävja – Bergsbrunna – Danmark

Befintliga lokaler

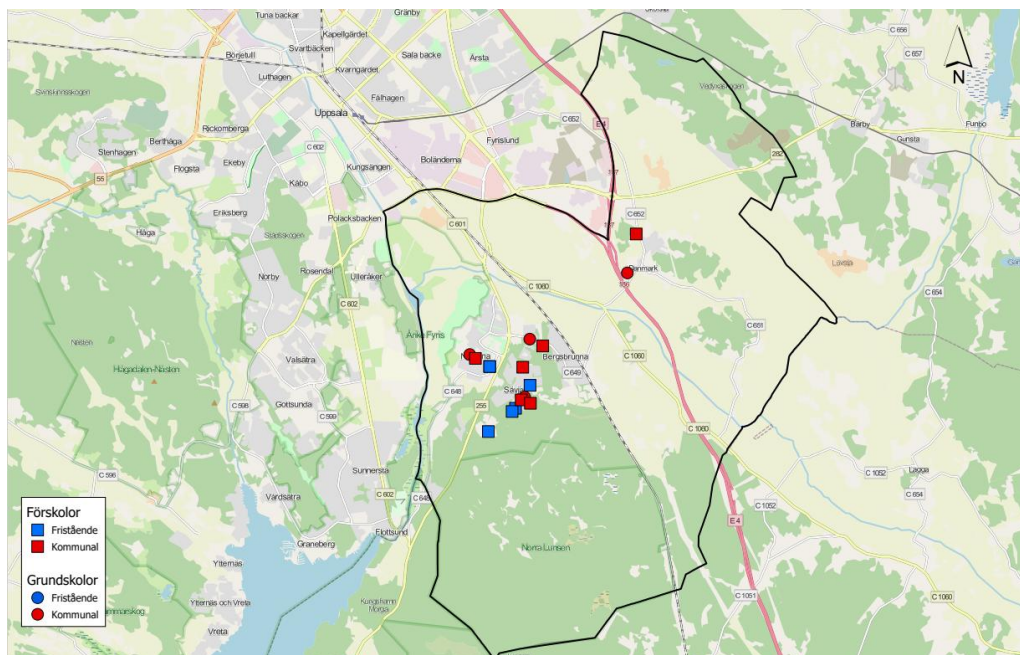

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Danmarks förskola
Lammets förskola
Myrgångens förskola
Ringmurens förskola
Sävja förskola
Uppsävja förskola

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Ekoxen dagbarnvårdare Sävja
Förskolan Skogsglántan
Förskolan Tärningen
Gladers förskola
Gnistans dagbarnvårdare
Grodans förskola
Kojans förskola



Grundskola – kommunal

Danmarks skola
Nåntunaskolan
Stordammens skola
Uppsävja skolan

Utveckling behov och kapacitet

Utbyggnadsplanerna i stadsnoden Sävja-Bergsbrunna är det största utvecklingsområdet i Uppsala kommun. Fördjupad översiktsplan för Sydöstra stadsdelarna (Sävja –Bergsbrunna) är framtaget för att möjliggöra utbyggnad för 21 500 bostäder. Samhällsservice i form av förskolor, skolor, idrottsytor och annan social infrastruktur planeras för att möta det nya behovet.

Förskola

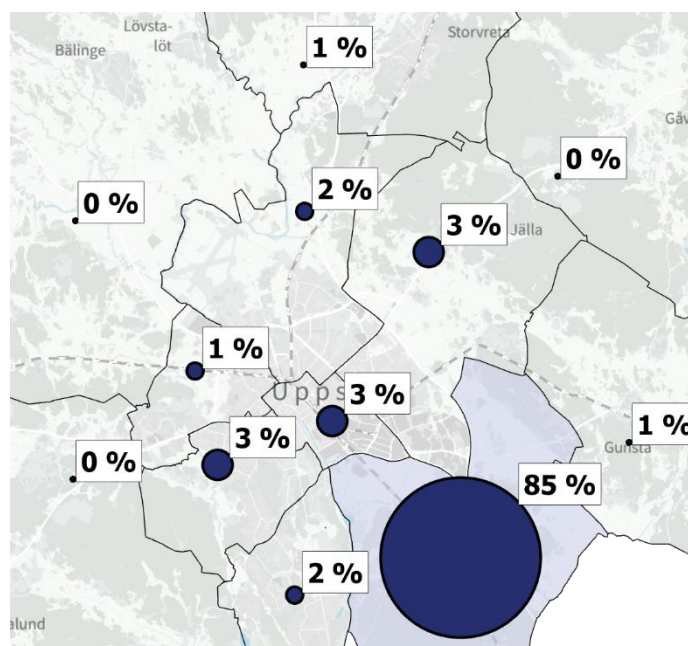
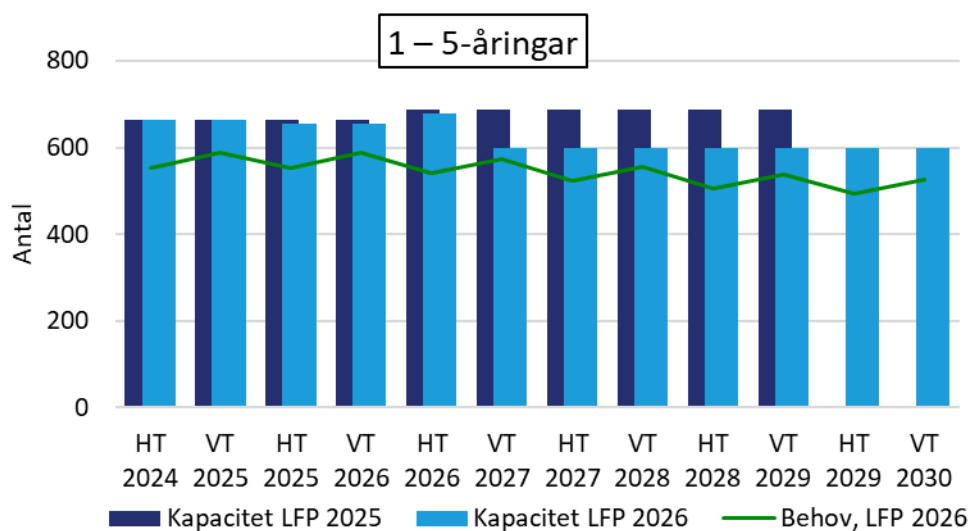


Figur 45 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Sävja – Bergsbrunna – Danmark och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 663 platser används 503 av barn boende i området i maj.

Grundskola

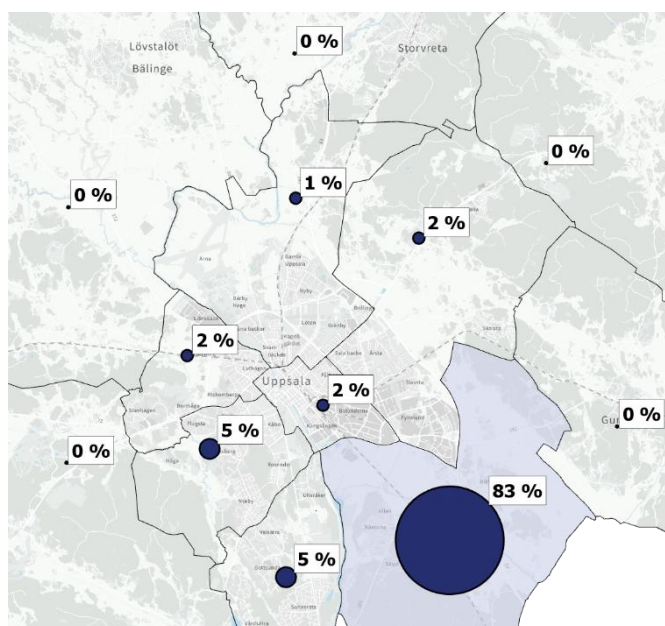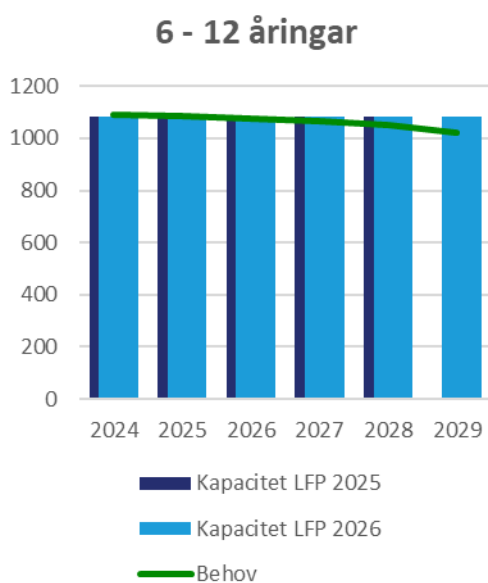

Figur 46 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Sävja – Bergsbrunna – Danmark och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.

Av områdets kapacitet* på 1 085 platser användes 878 av barn boende i området i april.

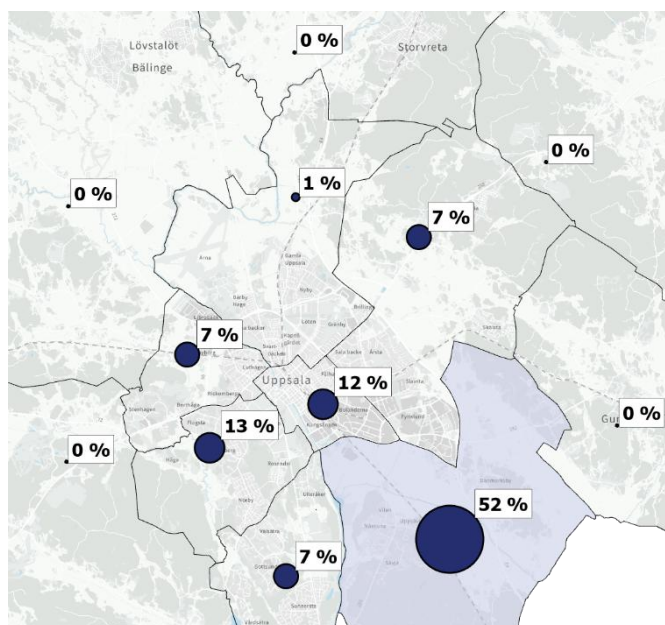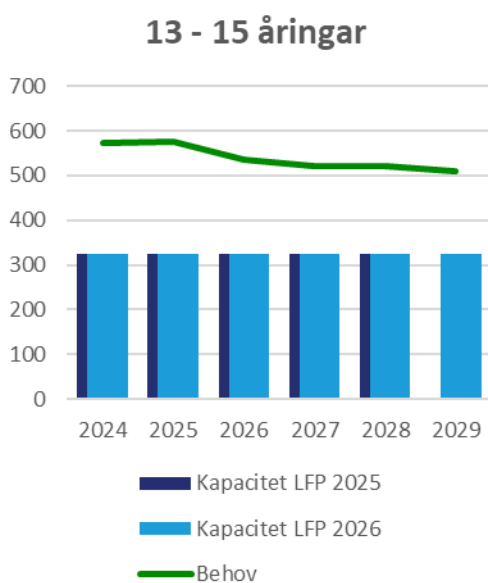

Figur 47 Diagrammet visar antalet 13–15 åringar som bor i Sävja – Bergsbrunna – Danmark och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 324 platser användes 295 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2033	2034- 2035
Ringmurens förskola	Förskolan läggs ned. Verksamheten flyttar till nya Uppsävja förskola.							
		-118						
Totalt	0	-118	0	0	0	0	0	0

Tabell 66. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Sävja – Bergsbrunna – Danmark.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2033	2034- 2035
Stordammens skola	Renovering. Evakuering krävs							
				±0				
Totalt	0	0	0	±0	0	0	0	0

Tabell 67. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Sävja – Bergsbrunna – Danmark.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Myrgångens förskola (Nåntuna)	Renoveras. Evakuerade till moduluppställning. (Färdigställd december 2025).												
Uppsävja förskola (Bergsbrunna)	Permanent ersättning och utökning av modulförskolan. Ny kapacitet 144 platser.												
		60											
Totalt	0	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 68. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Sävja – Bergsbrunna – Danmark.

Utredningar

Förskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Nya förskolor i Sydöstra staden som följer bostadsutbyggnaden.	Ja	—
Renovering/ombyggnation av Ringmurens förskola.	Nej	—

Tabell 69. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Sävja – Bergsbrunna – Danmark.

Grundskola


Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Nya grundskoleplatser i Sydöstra staden som följer bostadsutbyggnaden.	Ja	IFN och KTN
Nåntunaskolan utreds för utbyggnation till tvåparallellig F - 6, 420 platser.	Nej	KTN

Tabell 70. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Sävja – Bergsbrunna – Danmark.

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta

Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna

Befintliga lokaler

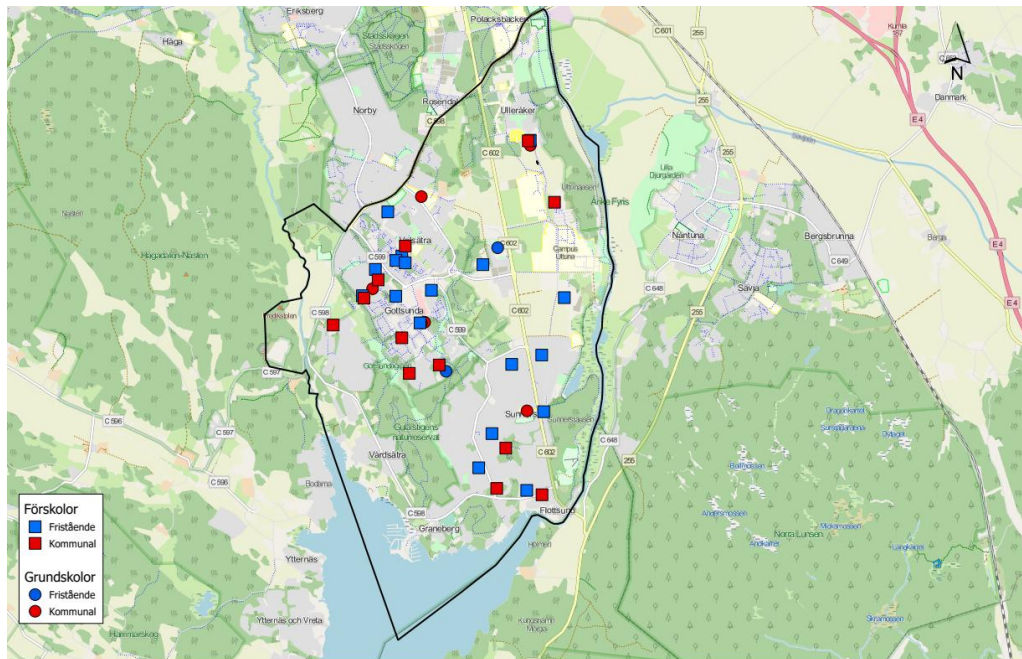

Befintliga objekt

Förskola och pedagogisk omsorg – kommunal

Berwalds förskola
 Dirigentens förskola
 Ekuddens förskola
 Flöjtens förskola
 Orrparkens förskola
 Sopranens förskola
 Spinnrockens förskola
 Stenhammars förskola
 Sunnersta familjedaghem
 Trastagens förskola
 Ulleråkers förskola (*evakuerade till Stadsskolgens förskola*)
 Vintergatans förskola
 Växthusets förskola

Grundskola – kommunal

Ekuddens skola
 Gottsundaskolan
 Sunnerstaskolan
 Treklängens skola
 Valsätraskolan
 Växthuset

Förskola och pedagogisk omsorg – fristående

Björkens förskola
 Child Academy Ultuna
 Duvans förskola
 Ekbackens förskola
 Förskolan Edda Gottsunda
 Förskolan Edda Bandstolen
 Förskolan Edda Valthornet
 Förskolan Edda Valsätra
 Förskolan Mollys Farm
 Gräshoppans förskola
 Gåsens förskola
 Kyrkklockans förskola
 Lindparkens förskola
 Norlandia förskolor - Bäcklösa
 Pilfinkens Montessoriförskola
 Sunnersta Naturförskola
 Tellusbarn Tulpanen
 Videungens Montessoriförskola
 Äventyrets förskola

Grundskola – fristående



British International School of Uppsala
 Internationella Engelska skolan
 Musiklädan

Utveckling behov och kapacitet

Program för utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000 – 7 000 nya bostäder ska möjliggöras.

Både Ulleråker och Ultuna planeras rymma cirka 6 000 bostäder vardera men nybyggnationen har bromsat in. Utbyggnaden i området bedöms leda till ett behov av social infrastruktur.

Förskola

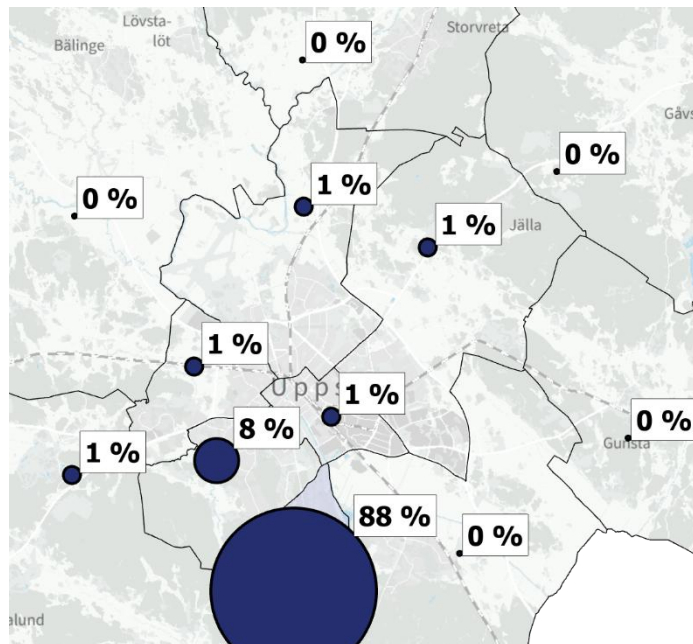
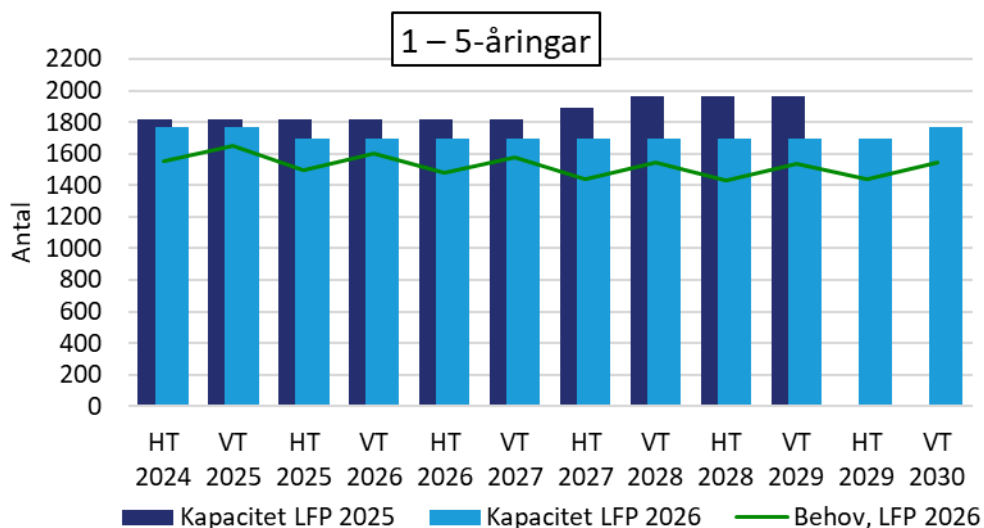


Figur 48 Diagrammet visar antalet 1-5 åringar som bor i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta och som behöver en förskoleplats samt antalet förskoleplatser (kapaciteten) i området inom kommunala och fristående förskolor.

Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa barn går.



Av områdets kapacitet på 1 768 platser används 1 387 av barn boende i området i maj.

Grundskola

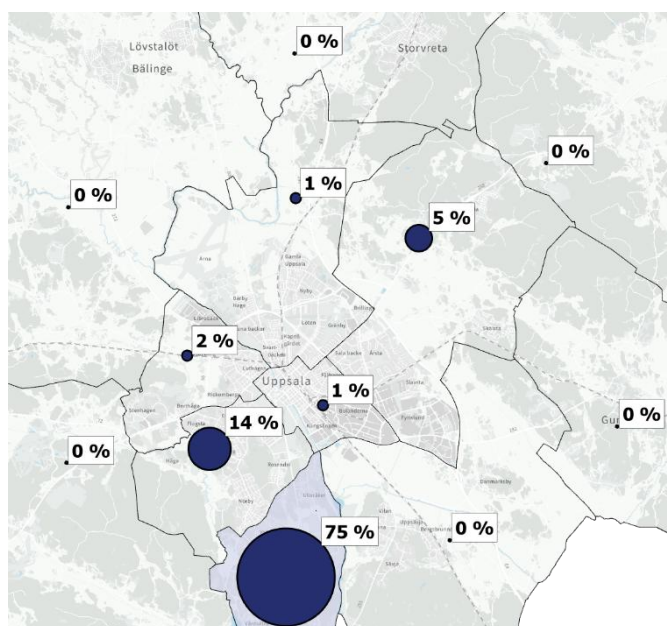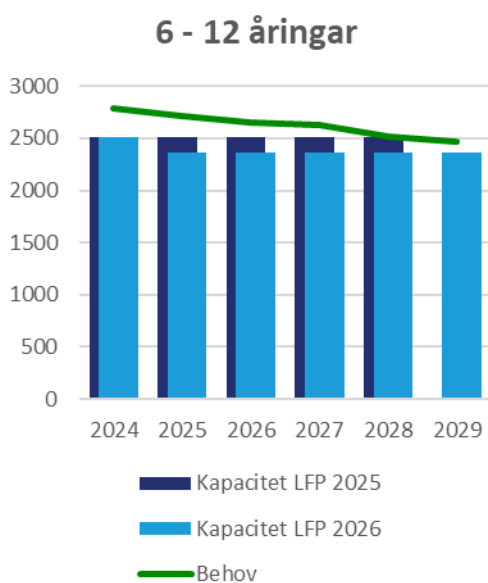

Figur 49 Diagrammet visar antalet 6–12 åringar som bor i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 2 358 platser användes 2 023 av barn boende i området i april.

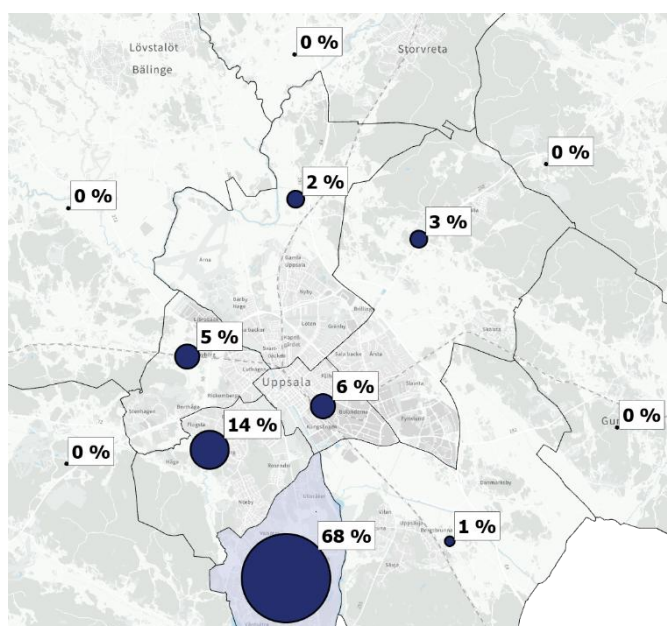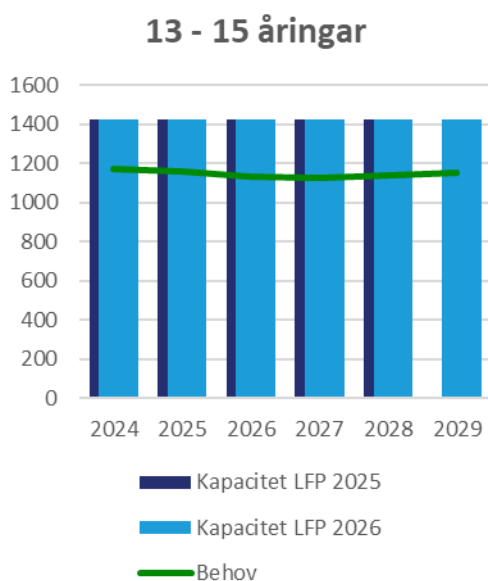

Figur 50 Diagrammet visar antalet 13–15 åringar som bor i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta och som behöver en grundskoleplats samt antalet platser (kapaciteten*) i området inom kommunala och fristående skolor. Kartan visar i vilka lokalförsörjningsområden dessa elever går.

Av områdets kapacitet* på 1 426 platser användes 793 av barn boende i området i april.

* Med kapacitet avses på denna sida planeringskapacitet, alltså 90 % av total kapacitet (se sidan 14).

Nya åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Ulleråkers förskola	Förskolan läggs ned. Verksamheten har flyttat till Stadsskogens förskola.												
	-72												
Totalt	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 71. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta.

Grundskola

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2033	2034-2035
Stacken, resursenhet	Renovering. Evakuering alternativt flytt preliminärt 2026.							
		±0						
Sunnerstaskolan	Renovering. Evakuering krävs.							
				±0				
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 72. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta.

Tidigare beslutade åtgärder

Förskola

	VT 2026	HT 2026	VT 2027	HT 2027	VT 2028	HT 2028	VT 2029	HT 2029	VT 2030	HT 2030	2031	2032-2033	2034-2035
Kristallens öppna förskola (Gottsunda)	Nya lokaler i Gottsunda centrum. (Färdigställd december 2025).												
Stenhammars förskola (Gottsunda)	Renoveras. Evakuering krävs.												
		0	±0										
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 73. Tidigare beslutade åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta.

Tidigare beslutade åtgärder som föreslås utredas ytterligare eller utgå

Åtgärd	Förklaring	Koppling till annan LFP
Flöjtens förskola (Gottsunda), renovering	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej
Ulleråker grundskola, Ombyggnation till grundskola	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej
Ulleråker, hus 65, Ny förskola i hus 65. Kapacitet 144 platser.	Utreds ytterligare på grund av minskat behov.	Nej

Tabell 74. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan som föreslås utgå.

Utredningar*Förskola*

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Flöjtens förskola (Gottsunda), renoveras. Evakuering krävs.	Nej	—
Ny förskola i Ulleråker, hus 65. Kapacitet 144 platser.	Ja	—
Nya förskolor i Gottsunda-Valsätraområdet som följer bostadsutbyggnaden.	Ja	—
Nya förskolor i Ulleråker.	Ja	—
Nya förskolor i Ultuna.	Ja	—

Tabell 75. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för förskola i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta.

Grundskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Ombyggnation av Kronåsens skola (Lundellska skolans förra lokaler).	Ja	IFN
Ny grundskola i Södra Ulleråker.	Ja	IFN och KTN
Ny grundskola i Ultuna.	Ja	IFN och KTN
Nyproduktion av Treklängens skola.	Nej	IFN
Renovering av Valsätraskolan.	Nej	


Tabell 76. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan för grundskola i Valsätra – Gottsunda – Sunnersta.

Beslutade utredningar som inte leder till lokalåtgärd

- Utredning gällande utökning av Växthuset III och Lilla Valsätra/Bäcklösaskolan utgår på grund av minskat behov.

Bilaga 2 - Gymnasieskola och anpassad skola, hela staden

Gymnasieskola

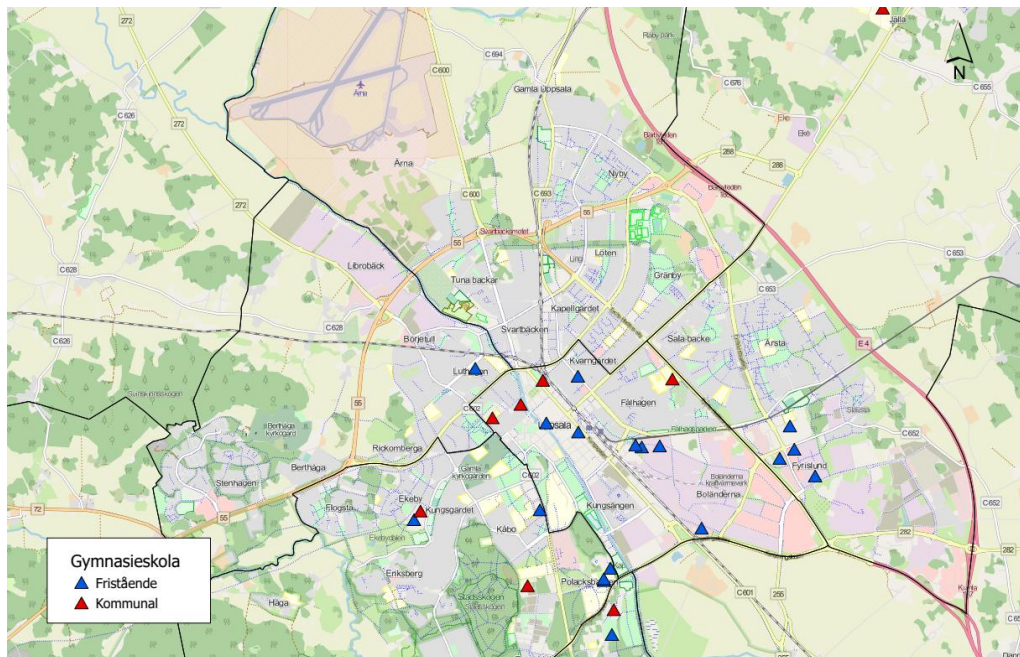

Gymnasieskola – kommunal

Celsiuskolan
Ellen Fries gymnasium
Katedralskolan
Lundellska skolan
Rosendalsgymnasiet
Uppsala estetiska gymnasium
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Gymnasieskola - fristående

Amerikanska gymnasiet
Ansgargymnasiet
Bergstrands gymnasieskola
Cultus gymnasieskola
Drottning Blankas
Gymnasieskola
Grillska gymnasiet
Internationella gymnasiet
JENSEN gymnasium
Kunskapsgymnasiet
NTI-Gymnasiet
Praktiska gymnasiet
Realgymnasiet

Thorén Business School
Yrkesgymnasiet
Magelungens gymnasieskola
Procivitas privata
gymnasieskola
Uppsala International School

Nya åtgärder

Gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd
UYG Jälla	Ny lokal för stall	-	HT 2026

Tabell 77. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för gymnasieskola.

Tidigare beslutade åtgärder

Gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar avseende ändring
Ekebygymnasiet	Avveckling av Ekebygymnasiet genom flytt av verksamheten till Götgatan (fd Fyrissskolan).	-	HT 2027	
Götgatan (fd Fyrissskolan)	Ombyggnation av fd Fyrissskolan för anpassning till Restaurang- och livsmedelsprogrammet.	-	HT 2027	
Katedralskolan	Utbyggnad av matsal	-	HT 2025 VT 2026	Försening i projekt.
UYG Jälla	Renovering och anpassning av expeditionshuset. Preliminär tidsplan	-	VT 2027	

Tabell 78. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för gymnasieskola.

Nya utredningar

Gymnasieskola

Beskrivning	Omfattas av pågående detaljplane-arbete	Koppling till annan LFP
Kommunövergripande Utred nytt elevhem för gymnasieskolan	Nej	Nej

Tabell 79. Nya utredningar i årets lokalförsörjningsplan.


Tidigare beslutade utredningar

Gymnasieskola

Beskrivning	Koppling till annan LFP
Kommunövergripande: Ny gymnasieenhet	IFN
Kommunövergripande: Utveckling av Jälla skolområde på lång sikt.	-

Tabell 80. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.

Anpassad skola

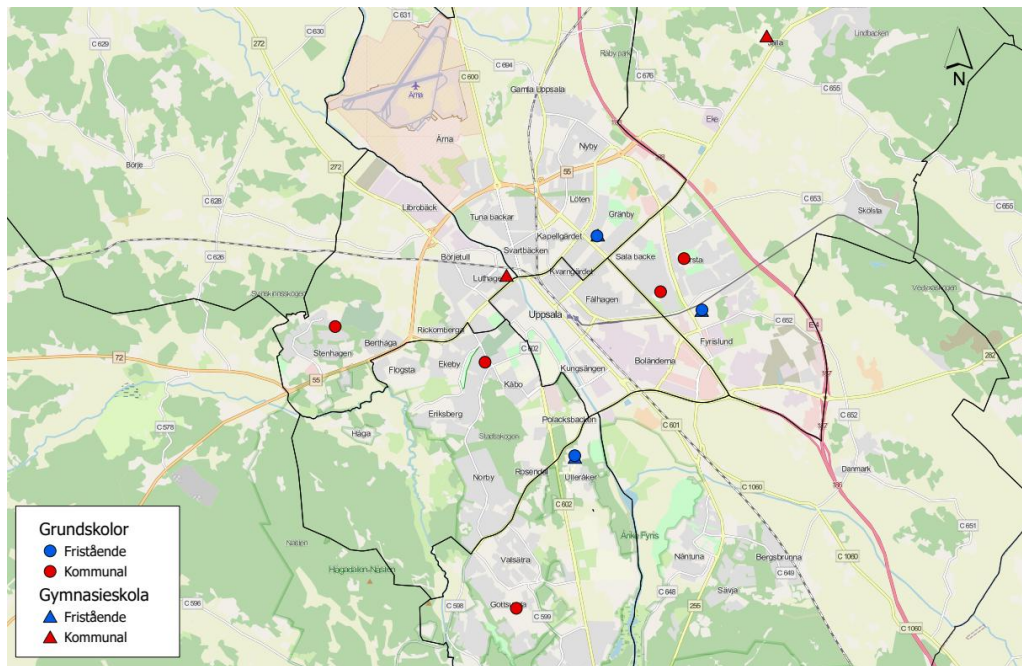

Befintliga objekt

Anpassad grundskola – kommunal

Berga anpassad grundskola
 Branting anpassad grundskola
 (filial till Eriksberg anpassad grundskola)
 Eriksberg anpassad grundskola
 Johannesbäck anpassad grundskola
 Årsta anpassad grundskola
 Östra Stenhagen anpassad grundskola

Anpassad gymnasieskola – kommunal

Uppsala AG Fyris
 Uppsala AG Jälla

Anpassad grundskola - fristående

Ansgarskolorna; Emanuelskolan
 Kajan Friskola
 Labanskolan

Anpassad gymnasieskola – fristående

Emanuelgymnasiet
 Kajan anpassad gymnasieskola
 Labanskolan anpassad gymnasieskola

Nya åtgärder

Anpassad gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd
Jälla AG	Ny lokal för snickeriverksamhet	-	HT 2026

Tabell 81. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan för anpassad grundskola.

Tidigare beslutade åtgärder

Anpassad grundskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar avseende ändring
Årstaskolan anpassad grundskola	Moduluppställning avvecklas.	-	HT 2027	
Gottsunda anpassad grundskola (före detta Eriksberg anpassad grundskola)	Nya lokaler för Eriksberg Gottsunda anpassad grundskola.	IFN och KTN	HT 2030	

Tabell 82. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad grundskola.

Anpassad gymnasieskola

Enhetsnamn	Beskrivning	Koppling till annan LFP	Färdigställd	Kommentar avseende ändring
Uppsala AG, Fyris	Tillgänglighetsanpassningar på Götgatan för Uppsala AG.	-	HT 2027	
Jälla AG	Permanent ersättning av moduluppställning	-	HT 2029	

Tabell 83. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan för anpassad gymnasieskola.

Nya utredningar

Anpassad grundskola

—

Tidigare beslutade utredningar*Anpassad grundskola*

Beskrivning	Koppling till annan LFP
<i>Kommunövergripande:</i> Ytterligare utökning av anpassad grundskola	-
<i>Sävja-Bergsbrunna-Danmark:</i> Ny anpassad grundskola vid Uppsävjaskolan	

Tabell 84. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan.

Bilaga 3 – Färdigställda åtgärder 2025

Enhet	Beskrivning
Celsiusskolan	Anpassade lokaler för golfutbildningen, som idag finns i Gamla Uppsala skola, inom ramen för RIG.
Ellen Fries gymnasium	Renovering av Magdeburg färdigställdes VT 2025.
Eriksberg anpassad grundskola	En elevgrupp är evakuerad till Brantingsskolan.
Evakueringslokalen i den tidigare Hemmings förskola (Luthagen)	Lokalen lämnades när Rackarbergets förskola (Studentstaden) färdigställdes HT2025.
Kvarngårdesskolan	Ny grundskola öppnades augusti 2025. Ersättning samt utökning till 990 platser.
Lagerlöfs förskola (Löten)	Förskolan färdigrenoverad VT2025.
Moduler för evakuering på Topeliusgatan (Nyby)	Modulerna har lämnats. Lagerlöfs förskola (Löten) är färdigställd.
Rackarbergets förskola (Studentstaden)	Ny förskola öppnade i augusti 2025, inhyrning. Kapacitet 72 platser.
Skytteln förskola (Kungsängen)	Ny förskola öppnade i augusti 2025 i kvarteret Skytteln. 72 platser.
Stadsskogens förskola (Rosendal)	Ny förskola öppnade i januari 2025. 144 platser.
Voksenåsens förskola (Flogsta)	Renoveringen färdigställd hösten 2025.
Väpnarens förskola (Svartbäcken)	Modulerna lämnades sommaren 2025. Förskolan är nedlagd.
Ulleråkers förskola	Verksamheten flyttad till Stadsskogens förskola.

Tabell 85. Färdigställda åtgärder 2025

Bilaga 4 – Ekonomi per åtgärd

Bilagan är inte offentlig.
